



2^{DO}

INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL.....	6
ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL A JUNIO.....	6
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	6
ESTATUS DE RAMO 33 2025	7
AVANCES, ACCIONES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELEVANTES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	8
EJE CIUDAD INTELIGENTE TU IRAPUATO (FELIZ, SEGURO Y EN PAZ)	8
PE03. PATRIMONIO HISTÓRICO.....	8
PE03-AE09- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DEL CENTRO HISTÓRICO.....	8
PE09 – LA GRAN MANZANA.....	12
PE09-AE01 – CONSOLIDAR EL PROYECTO DE LA GRAN MANZANA	12
PE10. COMPLEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA.....	14
PE10-AE01- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.....	14
PE39-AE01- CREACIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16
EJE R. TU ENTORNO RENOVADO (FUNCIONAL, ATRACTIVO Y SOSTENIBLE)	18
PE58. IMAGEN URBANA	18
PE58-AE04-. ARTE URBANO	18
PE59. INFRAESTRUCTURA	21
PE59-AE02-. CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL.....	21
PE59-AE03-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES Y AVENIDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.....	30
PE59-AE04-CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL MUNICIPAL.....	32
PE38-AE07 – CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO DE IRAPUATO	34
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025	35
TRANSVERSALIDAD.....	41
EJE CIUDAD INTELIGENTE TU IRAPUATO (FELIZ, SEGURO Y EN PAZ)	41
PE06. CONSOLIDACIÓN DEL CAM (CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA)	41
PE06-AE01: VISIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO “EL CIUDADANO EN EL CENTRO”.....	41
PE06-AE01: VISIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO “EL CIUDADANO EN EL CENTRO”.....	41
PE17. FORTALECER LAS ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	43
PE17- AE01- PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	43
ACCIONES NO CUADRADAS EN EL P.G.M.....	45
GLOSARIO	46



Introducción

La **Dirección General de Obras Públicas**, en apego a lo establecido en el artículo 110 del **Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato**, tiene como función principal participar en la planeación, programación, presupuestación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma vigilando su cumplimiento de conformidad con las disposiciones contenidas en la normatividad y legislación aplicable en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su respectivo reglamento. De conformidad con el artículo 111 determina su estructura organizativa, conformada por las **Direcciones de Edificación, Administración de Obra, Infraestructura Vial y Costos**.

1

ARTÍCULO 112

Dirección de edificación

- Se encarga de la integración de los estudios y proyectos relacionados con la obra pública municipal, en el rubro de edificación, así como la coordinación de los mismos, ya sea directamente o por conducto de terceros
- Administrar, resguardar la documentación que integra el banco de proyectos ejecutivos en el rubro de Edificación
- Supervisar por sí o por medio de terceros, que la obra pública municipal en el rubro de Edificación contratada, se ejecute en los términos de la normatividad aplicable en la materia, del expediente técnico y del contrato respectivo entre otros

Dirección de Administración

- Coordinar con las dependencias promotoras que las acciones a contratar, sean acordes con los fines y alcances del Programa Municipal de Obra y del Programa de Inversión, funciones y trabajos propios del cargo
- Elaborar e integrar los expedientes técnicos para su validación inicial y final, ante las dependencias correspondientes, dar seguimiento a los convenios y lineamientos establecidos con las diferentes instancias gubernamentales, para la obra pública y servicios relacionados con la misma
- Llevar a cabo el registro, control, seguimiento, organización, captura, funcionamiento y resguardo del archivo de trámite y de concentración de la Dirección General de Obras Públicas

ARTÍCULO 113

2



3

**ARTÍCULO
114**

Dirección de Infraestructura Vial

- Realizar las acciones necesarias para la integración de los estudios y proyectos relacionados con la obra pública municipal, en el rubro de Infraestructura Vial,
- Coordinar los estudios y proyectos ya sea directamente o por conducto de terceros, dar seguimiento al proceso de liberación del derecho de vía, por sí o por terceros, de las obras proyectadas de infraestructura vial
- Supervisar por sí o por medio de terceros, que la obra pública municipal en el rubro de Infraestructura Vial contratada, se ejecute en los términos de la legislación aplicable en la materia, del expediente técnico y del contrato respectivo.

Dirección de Costos

- Elaborar y mantener actualizado un mercadeo regional de costos de los insumos necesarios para la construcción de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma.
- Coordinar, supervisar y autorizar la elaboración de los presupuestos base que forman parte integral de los expedientes técnicos en materia de obra pública y/o servicios relacionados con la misma
- Elaborar los presupuestos solicitados por las Dependencias así como los solicitados por la Dirección de Edificación e Infraestructura Vial y vigilar que sean económicamente viables.

**ARTÍCULO
115**

4




En este segundo informe trimestral correspondiente al periodo abril-junio 2025, se presentan las actividades y avances de esta Dirección General de Obras Públicas que con el liderazgo de la Presidenta Municipal y el respaldo del Ayuntamiento, reafirmando el compromiso de elevar la calidad de vida de las familias de Irapuato mediante un Programa de Obra Pública que prioriza el bienestar social, el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura. Este enfoque busca marcar un cambio significativo en la vida de quienes viven y trabajan en esas zonas, llevando las obras y servicios que ellos requieren.

Hemos concluido la ejecución de 7 obras de infraestructura pública, con una inversión total de 35 millones 419 mil 658 pesos. Actualmente, se encuentran en marcha 20 obras, que representan una inversión de 579 millones 465 mil 909 pesos. Estas iniciativas están orientadas a abordar las necesidades críticas de infraestructura y equipamiento que son fundamentales para el desarrollo estratégico y básico de nuestro municipio, lo que suma una inversión global de 614 millones 885 mil 567 pesos.

No menos importante es mencionar que continuamos realizando la contratación de servicios relacionados con la obra pública, para la ejecución de trabajos referentes a estudios y proyectos ejecutivos del rubro de infraestructura vial y edificación, mismos que son la base para la gestión y/o concurrencia de recursos con los diferentes niveles de gobierno para concretar obras de alto valor social y patrimonial, como la rehabilitación de espacios públicos en el centro histórico, caminos rurales, infraestructura social, y nuevas propuestas de intervención en paisajismo e imagen urbana. Tan sólo en este trimestre, se han destinado más de 20 millones de pesos en proyectos que darán continuidad al desarrollo futuro del municipio.

Las acciones emprendidas durante este periodo responden a los diferentes ejes estratégicos del Programa de Gobierno 2024-2027, que priorizan un entorno funcional, atractivo, seguro, incluyente e inteligente. Cada una de estas obras y proyectos representa un paso firme hacia la transformación de Irapuato y el fortalecimiento de su infraestructura urbana y social. Reiteramos nuestro reconocimiento al Ayuntamiento, a la gestión incansable de nuestra Alcaldesa y al decidido respaldo del Gobierno del Estado, que han hecho posible continuar con este Programa de Obra Pública, reafirmando el compromiso de construir un Irapuato más justo, moderno y con mejores oportunidades para todas y todos.

ATENTAMENTE



Ing. Manuel Venegas Pérez
Director General de Obras Públicas

Estado del avance presupuestal

Estado del avance presupuestal a junio

Unidad Responsable	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por ejercer	% de ejecución
Dirección General de Obras Públicas	\$48,634,113.36	\$45,641,523.49	\$24,348,882.32	\$10,898,735.21	\$10,393,905.97	24
Dirección de Edificación	\$51,177,009.03	\$436,838,053.06	\$180,564,331.49	\$249,453,286.12	\$6,820,435.44	57
Dirección de Administración de Obra	\$7,991,742.48	\$76,261,454.59	\$14,335,366.02	\$57,330,856.99	\$4,595,231.60	75
Dirección de Infraestructura Vial	\$106,202,783.07	\$330,475,114.75	\$22,188,340.96	\$177,829,871.26	\$130,456,902.53	54
Dirección de Costos	\$3,090,892.52	\$3,090,892.52	\$39,663.21	\$1,281,618.72	\$1,769,610.60	41
Total	\$217,096,540.49	\$892,307,038.44	\$241,476,584.00	\$496,794,368.30	\$154,036,086.14	56

Nota: Montos y porcentajes proporcionados por la Tesorería Municipal.

Modificaciones Presupuestales

Presupuesto Aprobado 2025	1ª. Modificación Presupuestal
\$217,096,540.49	\$892,307,038.44

En este trimestre no se realizó ninguna modificación presupuestal al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de esta Dependencia, por lo que las acciones ejecutadas se llevaron a cabo con base en el presupuesto aprobado anteriormente.



Estatus de ramo 33 2025

ESTATUS DE RAMO 33 2025							
FONDO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	NOMBRE, DESCRIPCIÓN O TIPO DE LA OBRA DE LA ACCIÓN	APROBADO	1ERA MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	EJERCIDO	% DE EJECUCIÓN
COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS							
FAIS	DGOP	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	\$18,500,000.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A
FORTAMUN	DGOP	OBRAS DE EDIFICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,000,000.00	\$2,959,695.31	\$1,864,715.08	\$782,696.29	26.44
FORTAMUN	DGOP	TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO	\$0.00	\$2,542,949.03	\$2,540,351.38	\$2,540,337.27	99.89
FORTAMUN	DGOP	CONTRATACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	\$0.00	\$10,420,201.97	\$9,925,670.93	\$7,940,536.74	76.20
FORTAMUN	DGOP	PAGO DE DERECHO DE VIA	\$0.00	\$14,077,153.69	\$12,268,061.15	\$6,134,030.58	43.57
FORTAMUN	DGOP	OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PROPIEDAD MUNICIPAL	\$13,089,432.44	\$13,089,432.44	\$12,236,608.22	\$8,773,411.16	67.02
COMISION DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES							
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS							
FAIS	DGOP	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA MANCHA URBANA Y RURAL	\$79,888,790.61	\$86,046,133.17	\$0.00	\$0.00	0.00
FORTAMUN	DGOP	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA MANCHA URBANA Y RURAL	\$0.00	\$11,531,343.36	\$10,559,796.37	\$8,884,792.47	77.04
FAIS	DGOP	URBANIZACIÓN DE CAMINOS RURALES	\$16,885,120.83	\$16,885,120.83	\$0.00	\$0.00	0.00
			\$158,363,343.88	\$157,552,029.80	\$49,395,203.13	\$35,055,804.51	

NOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, FUERON PUBLICADOS A FINALES DEL MES DE FEBRERO, LO QUE DERIVÓ EN LA APERTURA DE CARGA DE PROYECTOS EN LA PLATAFORMA DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE Y EL INICIO DE VALIDACIÓN DE LOS MISMOS A FINALES DE ESTE PERIODO.



Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal

EJE Ciudad Inteligente TU IRAPUATO (Feliz, Seguro y en Paz)

PE03. Patrimonio Histórico

PE03-AE09- Programa de Conservación rutinaria del Centro Histórico

En el marco de este eje, se encuentran en ejecución 6 acciones orientadas a la preservación, rehabilitación e intervención del corazón histórico de la ciudad, con una inversión total de 9 millones 167 mil 107 pesos. Estas acciones incluyen obras físicas actualmente en proceso y el desarrollo de proyectos ejecutivos orientados a futuras rehabilitaciones e intervenciones, cada una de estas acciones fortalece el sentido de pertenencia de los ciudadanos y contribuye a la conservación y puesta en valor del legado histórico y arquitectónico del municipio.

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Conservación rutinaria y mejoramiento de infraestructura y equipamiento del Centro Histórico en Irapuato, Gto.	\$3,497,858.14	20
2	Rehabilitación de pintura mural en pasillos del edificio de Presidencia Municipal en el municipio de Irapuato, Gto.	\$2,675,052.30	30
3	Rehabilitación de fachadas en Calle Pípila de Galeana a Ramón Corona y Calle Galeana de Calle Manuel M. Flores a Calle Pípila , en Irapuato, Gto.	\$1,545,741.12	87



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
4	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de fachadas en la calle Ramón Corona tramo: de Terán a Revolución, en Irapuato, Gto.	\$239,907.93	100
5	Proyecto ejecutivo para la intervención a áreas anexas y atrio del templo de Santiaguito (escuela diocesana) , en Irapuato, Gto.	\$788,565.65	98
6	Proyecto ejecutivo para la Rehabilitación e Intervención de terraza de Oficina de Presidencia y Secretaria Particular, de Presidencia Municipal , en Irapuato, Gto.	\$419,982.61	75



PE03-AE09- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DEL CENTRO HISTÓRICO



CONSERVACIÓN RUTINARIA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO



CONSERVACIÓN RUTINARIA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO



REHABILITACIÓN DE PINTURA MURAL EN PASILLOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE PÍPILA DE GALEANA A RAMÓN CORONA Y CALLE GALEANA DE CALLE MANUEL M. FLORES A CALLE PÍPILA

[Handwritten signature]



PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCIÓN A ÁREAS ANEXAS Y ATRIO DEL TEMPLO DE SANTIAGUITO (ESCUELA DIOCESANA)



PE09 – La Gran Manzana

PE09-AE01 – Consolidar el Proyecto de la Gran Manzana

Se han destinado importantes recursos a la intervención del Estadio Sergio León Chávez, con el propósito de consolidarlo como un espacio moderno, funcional y seguro para el desarrollo del deporte y el encuentro ciudadano. Como parte de este esfuerzo, se concluyó el Proyecto Integral para la Instalación Eléctrica, Alumbrado de Cancha y Obra Complementaria, con una inversión de 9 millones 898 mil 208 pesos, actualmente se encuentran en proceso dos acciones de gran relevancia: el Proyecto Integral para la Construcción de la Cubierta Norte, Fachada y Obra Complementaria, con una inversión de 93 millones 482 mil 728 pesos, así como el Gerenciamiento del Proyecto Integral para la Rehabilitación del Estadio.

Así mismo se encuentra en proceso el Proyecto Ejecutivo para la Integración Urbana de la Zona de Acceso a Parque Irekua, sobre calle Reverte mexicano, Estancia y calle Rodolfo Gaona, con conexión al andador comercial del IMSS, el cual representa una inversión de 439 mil 100 pesos.

PE09-AE01- Consolidar el Proyecto de la Gran Manzana			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Proyecto Integral para la Instalación Eléctrica, Alumbrado de Cancha y Obra Complementaria, en El Estadio Sergio León Chávez ; en Irapuato, Gto.	\$9,898,208.20	100
2	Proyecto Integral para la construcción de Cubierta norte, Fachada y Obra Complementaria, en El Estadio Sergio León Chávez , en Irapuato, Gto.	\$93,482,728.57	97
3	Gerenciamiento del Proyecto Integral para la Rehabilitación Integral del Estadio Sergio León Chávez (Fase de Revisión, Supervisión y Validación de Proyectos Ejecutivos), en Irapuato, Gto. Considerando: Paquete 1 (Área de Cancha y Baño Vestidores) Paquete 2 (Rehabilitación de Palcos) Paquete 3. (Instalación Eléctrica y Alumbrado en Cancha) Paquete 4 (Estructura de Concreto, Techumbre Perimetral y Recubrimiento de Fachada Principal).	\$3,322,993.33	99



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
4	Proyecto ejecutivo para la integración urbana de la zona del acceso a Parque IREKUA sobre la calle Reverte mexicano, Estancia y calle Rodolfo Gaona conectando con andador comercial del IMSS, en Irapuato, Gto.	\$439,100.54	40


PE09-AE01- Consolidar el Proyecto de la Gran Manzana



PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO DE CANCHA Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL ESTADIO SERGIO LEÓN CHÁVEZ



PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO DE CANCHA Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL ESTADIO SERGIO LEÓN CHÁVEZ

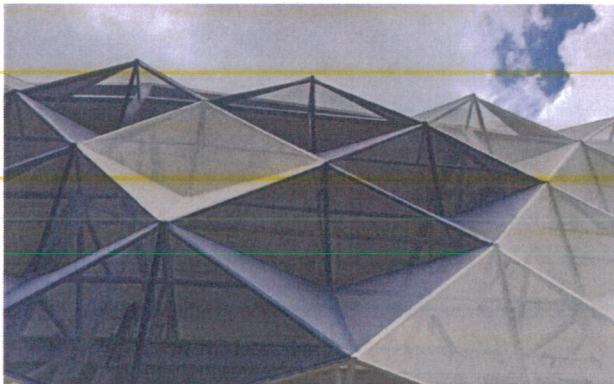

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA NORTE, FACHADA Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL ESTADIO SERGIO LEÓN CHÁVEZ



PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA NORTE, FACHADA Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL ESTADIO SERGIO LEÓN CHÁVEZ

[Handwritten signature]

PE10. Complejo de Seguridad Ciudadana

PE10-AE01- Fortalecer la Infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Se avanza en la consolidación de uno de los proyectos más relevantes para garantizar condiciones de seguridad modernas y eficaces en el municipio: la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana. Con una inversión conjunta de 248 millones 665 mil 155 pesos, se ejecuta la primera etapa de esta obra estratégica, acompañada del desarrollo del proyecto ejecutivo para su futura conclusión.

Este complejo representa una intervención de alto impacto para fortalecer la capacidad operativa, concentrar los servicios de seguridad en un solo punto, dignificar las condiciones laborales del personal y mejorar la atención a la ciudadanía. Su construcción marca un paso decisivo hacia un modelo integral de seguridad, basado en la eficiencia, la coordinación interinstitucional y la proximidad con la comunidad.

PE10-AE01- Fortalecer la Infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Primera etapa para la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana , en Irapuato, Gto.	\$241,985,707.39	54
2	Supervisión externa para la construcción del complejo de Seguridad Ciudadana (primera etapa) , en Irapuato, Gto.	\$3,679,517.69	54
3	Proyecto ejecutivo para la terminación del Complejo de Seguridad Ciudadana , en Irapuato, Gto.	\$2,999,929.99	20



PE10-AE01- Fortalecer la Infraestructura de la Secretaría



PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA



PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA





PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA

EJE A. TU Familia con Valores (Próspera, Unida y Responsable)

PE39. Centro de inclusión para las personas con discapacidad

PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad

Con el compromiso de seguir construyendo una ciudad más incluyente, se impulsa el proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Inclusión Social "Sin Límites" y la Unidad de Rehabilitación, a desarrollarse en la Nave 1 del DIF Municipal. Esta acción representa una inversión de 668 mil 31 pesos y tiene como objetivo sentar las bases técnicas para consolidar un espacio digno, accesible y funcional que brinde atención integral a personas con discapacidad. A través de este proyecto, se busca ampliar los servicios de rehabilitación y fomentar la inclusión social desde una perspectiva de derechos, equidad y bienestar comunitario.

PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Proyecto ejecutivo para la construcción del centro de inclusión social "sin límites" y unidad de rehabilitación, en la nave 1 del DIF municipal, en Irapuato, Gto	\$668,031.65	25

PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad



**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL "SIN LÍMITES" Y
UNIDAD DE REHABILITACIÓN, EN LA NAVE 1 DEL DIF MUNICIPAL**



**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL "SIN LÍMITES" Y
UNIDAD DE REHABILITACIÓN, EN LA NAVE 1 DEL DIF MUNICIPAL**



EJE R. TU Entorno Renovado (Funcional, Atractivo y Sostenible)

PE58. Imagen Urbana

PE58-AE04-. Arte Urbano

Se han impulsado cinco acciones orientadas a transformar y embellecer el entorno urbano en espacios públicos estratégicos de la ciudad. Estas acciones representan una inversión de 7 millones 123 mil 569 pesos, enfocadas en dignificar la imagen urbana, fortalecer el sentido de identidad colectiva y promover entornos más armónicos y funcionales para la convivencia ciudadana. Cuatro de estas acciones se encuentran en proceso y el proyecto ejecutivo de intervención integral y paisajismo en Av. Las Arboledas, Blvd. Díaz Ordaz, Av. Santo Domingo, y la colonia 1º de Mayo, está concluido sentando las bases para futuras acciones de mejora en zonas de alto tránsito y valor comunitario.

PE58-AE04-. Arte Urbano			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Intervención integral de Paisajismo Urbano en Intersección de Av. Mariano J. García y calles Jabalí y Cebú, en Irapuato, Gto.	\$2,894,009.01	6
2	Iluminación escénica de puente peatonal "CBTIS" en Irapuato, Gto.	\$1,868,452.08	78
3	Mantenimiento de áreas verdes, camellones y espacios públicos en vialidades principales, en Irapuato, Guanajuato.	\$1,042,945.42	98
4	Intervención de arbolado e Imagen urbana en el Andador Juan Álvarez esq. Cortázar, en Irapuato, Gto.	\$730,076.25	20



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
5	Proyectos de intervención integral de paisajismo urbano (en Av. las arboledas de calle Chiapas a Av. Independencia , en intersección de Av. Escuela Médico Militar y Blvd. Díaz Ordaz , en intersección de Av. Santo Domingo y Av. división del Norte y en col. 1ro de mayo, bajo el puente), en Irapuato, Gto.	\$588,086.62	100

PE58-AE04- Arte Urbano



INTERVENCIÓN INTEGRAL DE PAISAJISMO URBANO EN INTERSECCIÓN DE AV. MARIANO J. GARCÍA Y CALLES JABALÍ Y CEBÚ





ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE PUENTE PEATONAL "CBTIS"



MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CAMELONES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN VIALIDADES PRINCIPALES



INTERVENCIÓN DE ARBOLADO E IMAGEN URBANA EN EL ANDADOR JUAN ÁLVAREZ ESQ. CORTÁZAR



PROYECTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE PAISAJISMO EN COL. 1RO DE MAYO, BAJO EL PUENTE



PE59. Infraestructura

PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal

Se han realizado 22 acciones orientadas a mejorar la conectividad y funcionalidad de la infraestructura vial del municipio, con una inversión total de 25 millones 841 mil 391 pesos. De estas, 6 acciones corresponden a obras de pavimentación y mejoramiento físico de vialidades, que representan una inversión de 18 millones 311 mil 548 pesos. Entre ellas, destacan la construcción de pavimento con asfalto en la calle de incorporación de la carretera Federal 45D a la Av. Siglo XXI, por su impacto en la movilidad regional, y la pavimentación con concreto en la calle Villa de las Estrellas, en la colonia Villarreal, que mejora la accesibilidad en zonas habitacionales.

Las 16 acciones restantes son proyectos ejecutivos y estudios técnicos, orientados al diseño, planeación y futura ejecución de obras viales estratégicas, con un monto de 7 millones 529 mil 843 pesos, que permitirán ampliar y fortalecer la red vial de forma ordenada y eficiente.

PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la calle de Incorporación de la carretera Federal 45D a la Av. Siglo XXI.	\$8,594,087.49	100
2	Construcción de pavimento con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Irapuato, en la Colonia Villareal, calle Villa de las Estrellas (Tramo: Ignacio García Téllez Al Canal.)	\$3,750,169.25	100
3	Trabajos de restitución de fachadas y obras complementarias, por afectaciones derivadas de la obra del Paso Superior de línea "A" de FERROMEX en cruce con calzada Guadalupe , en Irapuato, Gto., (paquete 6).	\$1,880,590.90	100



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
4	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad El Venado de Yostiro, calle Guerrero - Principal - Lázaro Cárdenas (tramo: todo el frente de la barda del kínder)	\$1,803,545.36	40
5	Trabajos de restitución de fachadas y obras complementarias (paquete 2) por afectaciones derivadas de la obra de urbanización de la calle Guanajuato, tramo: de calle Agricultores a Av. Independencia en la col. el Zapote del Milagro , en Irapuato, Gto.	\$1,265,001.20	15
6	Trabajos de restitución de fachadas y obras complementarias (paquete 1) por afectaciones derivadas de la obra de urbanización de la calle Guanajuato, tramo: de calle Agricultores a Av. Independencia en la col. el Zapote del Milagro , en Irapuato, Gto.	\$1,018,154.45	25
7	Proyecto geométrico del Blvd. Gabriel García Márquez en el tramo de la av. independencia a la pról. de calle agricultores , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$765,522.51	100
8	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, comunidad san José de Bernalejo (el Guayabo), calle nacional (Ejército Nacional) (tramo: prolongación Abasolo-Av La Charca.)	\$611,006.08	100



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
9	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Santa Bárbara, calle Emiliano Zapata (tramo: carretera Buenos Aires-Guadalupe Victoria.)	\$579,029.22	100
10	Proyecto de actualización, complementación y replanteo del Blvd. Gabriel García Márquez, en el tramo del blvd. Paseo de la Altiplanicie a la prolongación av. Independencia , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$498,144.57	100
11	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, comunidad Cuchicuato, calle Independencia (tramo: 5 de mayo-Lázaro Cárdenas.)	\$421,906.99	100
12	Estudio de análisis costo - beneficio para el Blvd. Gabriel García Márquez en el tramo del Blvd. Villas a la Av. Independencia y estudio CAE con indicadores de rentabilidad para la calle Guanajuato en el tramo de Gabriel García Márquez a Independencia.	\$415,011.24	100



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
13	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, comunidad Tejamanil, calle Deportiva (Mezquite) (tramo: palma-camino de la carretera.)	\$394,489.47	100
14	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, comunidad Lo de Juárez, calle Leyes de Reforma (tramo: Guadalupe Victoria-Lázaro Cárdenas.)	\$388,937.62	100
15	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, colonia 12 de Diciembre, calle cafetales (tramo: Jamaica a San Juan de Retana.)	\$344,615.14	100
16	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, comunidad Valencianita, calle Francisco Villa (tramo: de Aldama a Miguel Hidalgo.)	\$317,342.41	100



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
17	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, colonia el Vergel, calle Magnolia (tramo: de Mariano Abasolo a calle uva.)	\$293,846.34	100
18	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, colonia el Refugio, calle Sicilia (tramo: Trinidad y Tobago a av. dos.); proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad cuarto día, calle río Tíbet (tramo: de río Jordán a río Nilo.)	\$237,922.72	100
19	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, comunidad camino real de Lo de Juárez, calle Francisco Márquez (tramo: Boulevard Arandas-Juan de la Barrera.); proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, colonia Plan Viviré, calle 3 de abril (tramo: de Lázaro Cárdenas a Av. Independencia.)	\$213,227.17	100
20	Estudio diagnóstico de pavimentos en vialidades secundarias y locales del municipio de Irapuato.	\$1,197,984.93	99
21	Proyecto geométrico y análisis de alternativas del segundo acceso a la zona norponiente de la ciudad de Irapuato, Gto.	\$650,361.35	85



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
22	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, comunidad purísima del progreso, calle José López Portillo (tramo: Ignacio Zaragoza- Guadalupe Victoria.)	\$200,495.50	95

PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal




CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE DE INCORPORACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 45D A LA AV. SIGLO XXI




CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA VILLAREAL, CALLE VILLA DE LAS ESTRELLAS




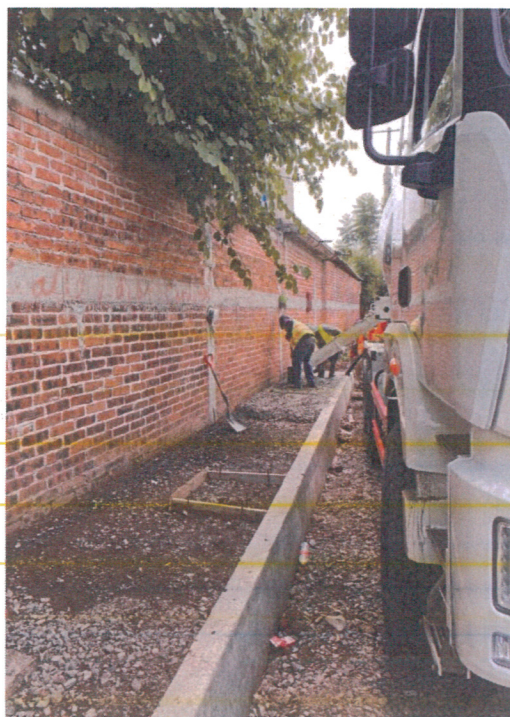


CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO LOCALIDAD
EL VENADO DE YOSTIRO, CALLE GUERRERO -
PRINCIPAL - LAZARO CÁRDENAS

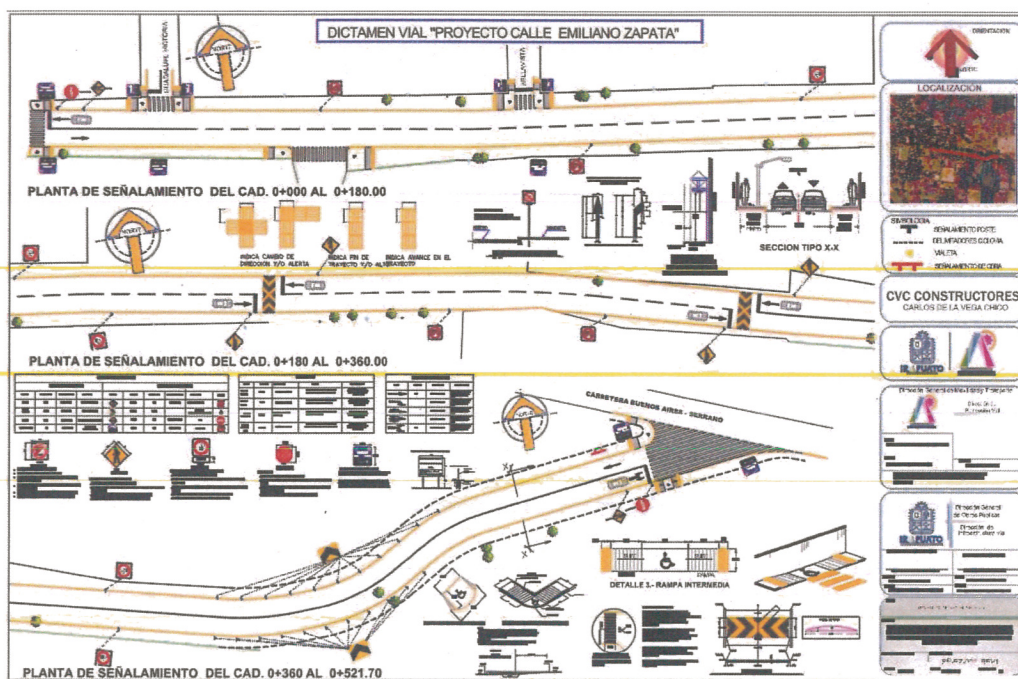



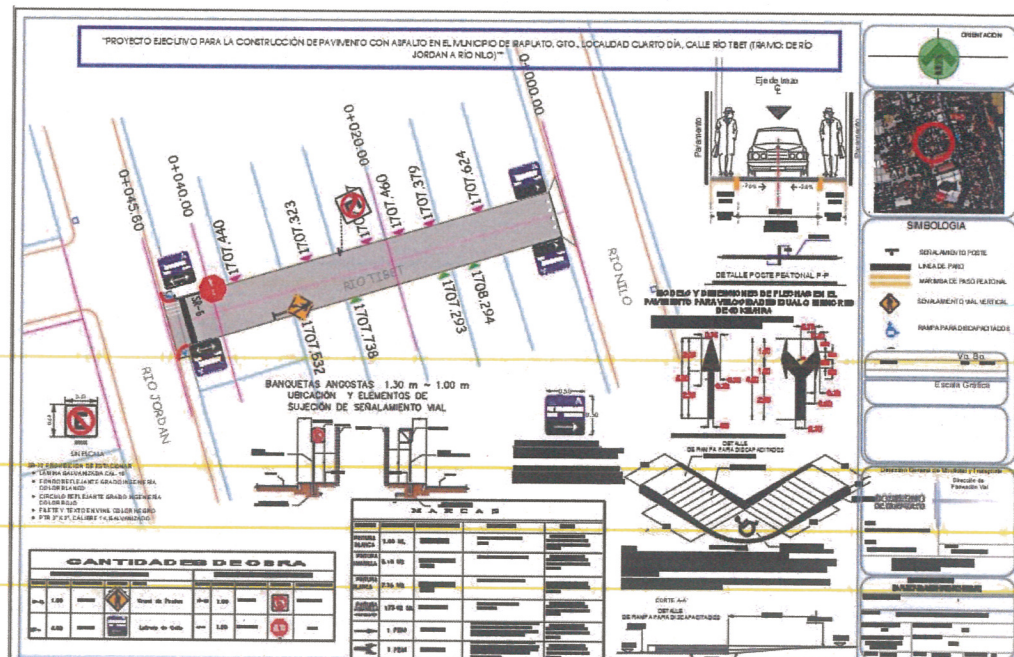

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO LOCALIDAD CUARTO DÍA, CALLE
RÍO TÍBET (TRAMO: DE RÍO JORDÁN A RÍO NILO)

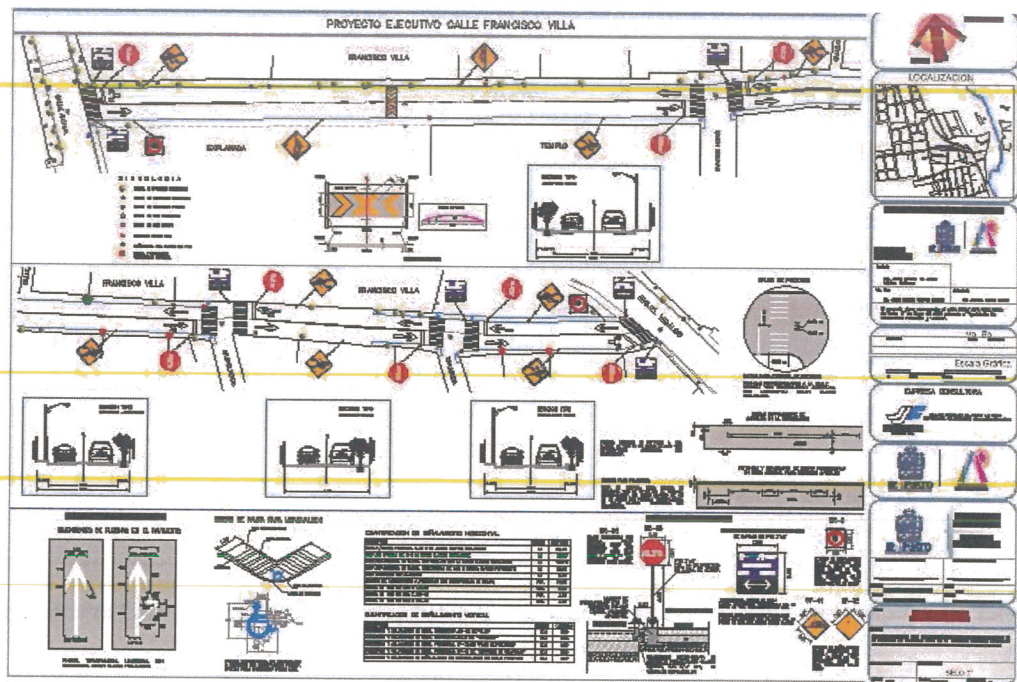

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO COMUNIDAD VALENCIANITA,
CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: DE ALDAMA A MIGUEL HIDALGO.)

PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio.

Se concluyeron dos acciones de mantenimiento vial que contribuyen a mejorar significativamente la seguridad, funcionalidad y durabilidad de importantes vialidades. Con una inversión total de 8 millones 756 mil 251 pesos se intervinieron tramos clave que fortalecen la movilidad urbana y elevan la calidad de vida al brindar condiciones de tránsito más seguras y eficientes.

PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Mantenimiento vial de la calle Guerrero, Tramo: 5ta. Avenida a Priv. Guerrero, (Puente siglo XXI) , en Irapuato, Gto.	\$4,799,632.15	100
2	Mantenimiento vial de la Av. paseo Irapuato, cuerpos oriente y poniente, tramo: de calle Florencia a Héroes de Nacozari , en el Fraccionamiento Residencial Campestre, en el municipio de Irapuato Gto.	\$3,956,618.86	100



PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio



**MANTENIMIENTO VIAL DE LA CALLE GUERRERO, TRAMO: 5TA. AVENIDA A
PRIV. GUERRERO, (PUENTE SIGLO XXI)**



**MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. PASEO IRAPUATO, CUERPOS ORIENTE Y
PONIENTE, TRAMO: DE CALLE FLORENCIA A HÉROES DE NACÓZARI**



PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.

Se encuentran en proceso cuatro acciones orientadas a fortalecer la conectividad y mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales de Irapuato, destacando la construcción del camino rural que conecta desde el entronque a la comunidad Lo de Sierra hasta Santa Rosa Temascatío, con una inversión de 55 millones 544 mil 763 pesos, convirtiéndose en una de las obras rurales de mayor alcance y tres acciones más consisten en proyectos ejecutivos y servicios técnicos que permitirán futuras intervenciones en caminos estratégicos.

En total, este eje representa una inversión de 58 millones 591 mil 4 pesos impulsando un desarrollo territorial más equitativo e incluyente.

PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de camino rural en el tramo del entronque a la Comunidad Lo de Sierra km. 3+400.00 al acceso a la comunidad Santa Rosa Temascatío km. 11+463.00 del municipio de Irapuato, Gto.	\$55,544,763.43	95
2	Servicios de liberación de derecho de vía para la pavimentación de los caminos rurales: “ex hacienda de Márquez – castro del rio”, “el Romeral - Guadalupe de Rivera” y “Loma Bonita – Tocoín” de este municipio de Irapuato, Gto.	\$1,759,981.55	85
3	Proyecto ejecutivo para la pavimentación del camino rural: el Coecillo-la Soledad, en la comunidad de la Soledad del municipio de Irapuato, Gto.	\$854,192.95	88
4	Proyecto ejecutivo para la pavimentación del camino rural del panteón de los Olivos a Loma de los conejos en el municipio de Irapuato, Gto.	\$432,067.03	50



PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.



CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DEL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD LO DE SIERRA KM. 3+400.00 AL ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA ROSA TEMASCATÍO KM. 11+463.00



PE38-AE07 – Construcción del Centro Acuático de Irapuato

Con el propósito de impulsar el deporte y brindar a la ciudadanía instalaciones de primer nivel, avanza la construcción de la primera etapa del Centro Acuático en la Unidad Deportiva Norte. Esta obra, que representa una inversión de 62 millones 683 mil 370 pesos, busca transformar la experiencia deportiva mediante espacios modernos, accesibles y funcionales para niñas, niños, jóvenes y adultos. Este proyecto emblemático no solo promueve la salud y el bienestar, sino que también refuerza el compromiso del municipio con el desarrollo integral de la comunidad.

PE38-AE07- Construcción del Centro Acuático de Irapuato			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción del Centro Acuático en la unidad deportiva Norte (1era Etapa), en el municipio de Irapuato, Gto.	\$62,683,370.44	87

PE38-AE07- Construcción del Centro Acuático de Irapuato



CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE (1ERA ETAPA)



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2025

La Dirección General de Obras Públicas, en cumplimiento con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2025, reporta los avances alcanzados en el segundo trimestre del año. Este instrumento de gestión permite medir de manera clara y objetiva el desempeño de las acciones logrando un avance significativo en las metas planteadas, asegurando la adecuada contratación, ejecución y conclusión de obras, proyectos ejecutivos y servicios complementarios, todo ello en beneficio de los habitantes, este seguimiento refleja nuestro compromiso con la mejora continua en la gestión de los recursos públicos.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 2do Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
Fin	Contribuir al desarrollo de la infraestructura y equipamiento del Municipio de Irapuato, a través de la ejecución de obras de construcción, rehabilitación y modernización.	Porcentaje de obras y servicios, contratadas, en proceso y concluidas.	100%	29	42	Informes de Gobierno	Se cuenta con la colaboración institucional para integrar los expedientes técnicos de las obras, servicios y con los recursos necesarios.	Dirección General de Obras Públicas
Propósito	Los habitantes del municipio de Irapuato cuentan con infraestructura y equipamiento vial y edificación suficiente o en buen estado.	Porcentaje de obras y servicios, contratadas, en proceso y concluidas.	100%	29	42	Informes de Gobierno	Se cuenta con la colaboración institucional para integrar los expedientes técnicos de las obras, servicios y con los recursos necesarios.	Dirección General de Obras Públicas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 2do Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
C1	Espacios públicos, construidos, rehabilitados y modernizados.	Porcentaje de obras coordinadas para su contratación, ejecución y conclusión.	100%	42	55	Informe trimestral	El municipio solicita acciones de construcción, rehabilitación y modernización en su infraestructura vial y espacios públicos.	Dirección General de Obras Públicas
C1A1	Coordinación de la ejecución de la obra pública y servicios relacionados.	Porcentaje de obras y servicios, coordinadas para su contratación, ejecución y conclusión.	100%	29	42	Informe trimestral	La obra pública en el municipio de Irapuato se lleva a cabo de manera efectiva y eficiente.	Dirección General de Obras Públicas
C2	Proyectos ejecutivos en el rubro de la edificación elaborados	Porcentaje de proyectos de edificación autorizados.	100%	4	6	Informe trimestral	Las dependencias establecen con precisión los alcances y componentes de los proyectos.	Dirección de Edificación
C2A1	Elaboración de proyectos ejecutivos.	Porcentaje de proyectos elaborados.	100%	2	4	Informe trimestral	Las dependencias especifican las necesidades del proyecto.	Dirección de Edificación



Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 2do Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
C2A2	Coordinación de proyectos contratados.	Porcentaje de proyectos contratados.	100%	2	4	Informe trimestral	Se cuenta con los proyectos contratados.	Dirección de Edificación
C3	Obras de edificación en espacios públicos, ejecutadas.	Porcentaje de obras de edificación ejecutadas.	100%	13	19	Informe trimestral	Los contratistas cumplen con el calendario de ejecución de la obra.	Dirección de Edificación
C3A1	Coordinación de la ejecución de obras contratadas.	Porcentaje de obras contratadas.	100%	7	13	Informe trimestral	Se contratan las obras de rehabilitación y modernización de edificios y espacios públicos aprobados en el Programa de Obra Pública.	Dirección de Edificación
C3A2	Coordinación de la conclusión de las obras contratadas.	Porcentaje de obras concluidas.	100%	2	22	Informe trimestral	Se concluyen las obras de rehabilitación y modernización de edificios y espacios públicos aprobados en el Programa de Obra Pública.	Dirección de Edificación



Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 2do Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
C4	Obra pública y los servicios relacionados con la misma ejecutados.	Porcentaje de acciones contratadas.	100%	42	55	Informe trimestral	Se cuenta con los expedientes técnicos completos y validados y con asignación presupuestal.	Dirección de Administración de Obra
C4A1	Validación de los expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos validados.	100%	53	70	Informe trimestral	Se cuenta con la información completa y suficiente provista por las dependencias involucradas.	Dirección de Administración de Obra
C4A2	Contratación de obras y servicios relacionados que cuenten con aprobación y asignación de recursos.	Porcentaje de obras y servicios contratados con recurso asignado.	100%	29	42	Informe trimestral	Se cuenta con los expedientes técnicos completos y validados y con asignación presupuestal.	Dirección de Administración de Obra
C5	Proyectos ejecutivos en el rubro de la infraestructura vial elaborados.	Porcentaje de proyectos de infraestructura vial autorizados.	100%	18	21	Informe trimestral	Los proyectos existentes son viables y traen beneficio a la infraestructura del Municipio.	Dirección de Infraestructura Vial
C5A1	Elaboración de proyectos ejecutivos.	Porcentaje de proyectos elaborados.	100%	15	18	Informe trimestral	Las dependencias especifican las necesidades del proyecto.	Dirección de Infraestructura Vial



Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 2do Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
C5A2	Coordinación de proyectos contratados.¶	Porcentaje de proyectos contratados.	100%	15	18	Informe trimestral	Se cuenta con los proyectos contratados.	Dirección de Infraestructura Vial
C6	Construcción, rehabilitación y modernización de obras de Infraestructura vial ejecutadas.	Porcentaje de obras de infraestructura vial ejecutadas.	100%	7	9	Informe trimestral	Los contratistas cumplen con el calendario de ejecución de la obra.	Dirección de Infraestructura Vial
C6A1	Coordinación de la ejecución de obras contratadas de construcción y/o rehabilitación de infraestructura vial.¶	Porcentaje de obras contratadas.	100%	5	7	Informe trimestral	Se ejecutan las obras de rehabilitación y modernización aprobadas en el Programa de Obra Pública.	Dirección de Infraestructura Vial
C6A2	Coordinación de la conclusión de las obras de construcción y/o rehabilitación de infraestructura vial.¶	Porcentaje de obras concluidas.	100%	2	25	Informe trimestral	Se concluyen las obras de rehabilitación y modernización aprobadas en el Programa de Obra Pública.	Dirección de Infraestructura Vial
C7	Presupuesto base Autorizado.¶	Porcentaje de presupuestos autorizados.	100%	245	325	Informe trimestral	Se cuenta con los catálogos de conceptos y demás insumos para su presupuestación.	Dirección de Costos



Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 2do Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
C7A1	Integración de los precios unitarios de los conceptos del catálogo de obra y/o servicio.	Porcentaje de conceptos de catálogos integrados.	100%	2995	3855	Informe Trimestral	Se cuenta con los precios de mercado.	Dirección de Costos
C7A2	Autorización del presupuesto base.	Porcentaje de presupuestos autorizados.	100%	165	245	Informe Trimestral	Se cuenta con el catálogo de conceptos del proyecto ejecutivo.	Dirección de Costos
C8	Conceptos fuera de catalogo autorizados.	Porcentaje de solicitudes de conceptos fuera de catálogo revisados y autorizados.	100%	126	217	Informe trimestral	Los conceptos fuera de catálogo cuentan con la revisión y autorización para el convenio.	Dirección de Costos
CSA1	Revisión de solicitudes de autorización de precios unitarios de los conceptos fuera de catálogo.	Porcentaje de solicitudes de conceptos fuera de catálogos autorizados.	100%	35	126	Informe Trimestral	Se cuenta con las cotizaciones y la determinación del precio unitario.	Dirección de Costos
CSA2	Autorización de conceptos fuera de catálogo.	Porcentaje de precios unitarios de conceptos fuera de catálogo revisados.	100%	601	1468	Informe Trimestral	Se lleva a cabo la conciliación y/o fijación de precios.	Dirección de Costos

Nota: Datos validados por la Dirección General de Programación y Desarrollo gubernamental.



Transversalidad

Bajo una gestión municipal eficiente, incluyente y enfocada en resultados, la transversalidad se consolida como un eje fundamental para implementar políticas públicas con verdadero impacto. Esta perspectiva permite integrar y coordinar el trabajo de diversas áreas, optimizando recursos y promoviendo una colaboración efectiva. En esta sección se presentan acciones logradas a partir del esfuerzo conjunto entre dependencias que, al asumir roles de liderazgo, ejecución o apoyo, han alineado sus funciones con las metas del Programa de Gobierno Municipal. Esta articulación institucional refuerza una atención más integral, generando beneficios más sólidos y duraderos para la ciudadanía.

EJE Ciudad Inteligente TU IRAPUATO (Feliz, Seguro y en Paz)

PE06. Consolidación del CAM (Centros de Atención Ciudadana)

PE06-AE01: Visión de atención y servicio "El Ciudadano en el Centro"

Continuamos con la construcción del Centro de Atención Municipal (CAM), una obra emblemática que registra un 99% de avance físico y representa una inversión superior a los 103 millones de pesos. Este espacio integrador permitirá centralizar trámites, servicios y atención ciudadana bajo una visión moderna y eficiente; poniendo verdaderamente al ciudadano en el centro de la gestión pública. Con ello, Irapuato avanza hacia un modelo de gobierno más cercano, ágil y transparente.

PE06-AE01: Visión de atención y servicio "El Ciudadano en el Centro"			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción del Centro de Atención Municipal (CAM) , En Irapuato, Gto.	\$101,619,348.75	99
2	Supervisión Externa para la Construcción del Centro de Atención Municipal en Irapuato, Gto.	\$1,544,295.94	99

Rol: Colaborador

Responsable: Dirección General de Tecnologías de la Información e Innovación y Dirección General de programación y Desarrollo Gubernamental



PE06-AE01: Visión de atención y servicio “El Ciudadano en el Centro”



CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)



CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)



PE17. Fortalecer las acciones en materia de protección civil

PE17- AE01- Prevención y respuesta ante las emergencias y desastres

Con una inversión total de 3 millones 493 mil 674 pesos, se llevan a cabo acciones enfocadas en la atención y mejora de condiciones mediante obras de protección civil. Estas intervenciones están orientadas a reducir riesgos, prevenir afectaciones durante fenómenos naturales y salvaguardar la integridad de las familias.

PE17- AE01- Prevención y respuesta ante las emergencias			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Rehabilitación de alcantarilla en camino a Centro Paralímpico Nacional, Municipio de Irapuato, Gto.	\$2,540,351.38	100
2	Trabajos de limpieza y desazolve del río Guanajuato con máquina en su tramo de calle Teresa Vara a 100 mts aguas abajo del puente de residencial Floresta.	\$813,204.08	28
3	Construcción de alcantarilla pluvial en la Calle Manzano de la Comunidad el Copal, en el municipio de Irapuato, Gto.	\$140,118.55	6

Rol: Colaborador

Responsable: Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal



PE17- AE01 Prevención y respuesta ante las emergencias y desastres



REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN CAMINO A CENTRO PARALÍMPICO NACIONAL



CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE MANZANO DE LA COMUNIDAD EL COPAL



TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO GUANAJUATO CON MÁQUINA EN SU TRAMO DE CALLE TERESA VARA A 100 MTS AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE RESIDENCIAL FLORESTA

Acciones no cuadradas en el P.G.M

Como parte del compromiso por mejorar la funcionalidad de la infraestructura pública, se avanza en la construcción de un andador peatonal que conectará a la Dirección de Parques y Jardines e Imagen Urbana dentro del complejo administrativo Siglo XXI. Esta acción con una inversión de 362 mil 95 pesos tiene como objetivo facilitar la conexión entre áreas operativas, fortaleciendo así el entorno laboral de los servidores públicos y la atención a la ciudadanía.

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de andador para comunicar a la dirección de parques y jardines e imagen urbana del complejo Siglo XXI , en Irapuato, Gto.	\$362,095.88	80



CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA COMUNICAR A LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES E IMAGEN URBANA DEL COMPLEJO SIGLO XXI

[Handwritten signature]

Glosario

CAM	Centro de Atención Municipal
COPLADEMI	Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Irapuato
DGDSYH	Dirección General de Desarrollo Social y Humano
MIR	Matriz de Indicadores para Resultados
PGM	Programa de Gobierno Municipal
PIMR	Programa Institucional de Mejora Regulatoria
POP	Programa de Obras Públicas

