

# 30 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2  
0  
2  
5





## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL .....	6
ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE .....	6
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES .....	6
ESTATUS DE RAMO 33 2025 .....	7
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS .....	7
AVANCES, ACCIONES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELEVANTES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL .....	9
EJE CIUDAD INTELIGENTE TU IRAPUATO (FELIZ, SEGURO Y EN PAZ) .....	9
PE03. PATRIMONIO HISTÓRICO .....	9
PE03-AE09- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DEL CENTRO HISTÓRICO .....	9
PE09 - LA GRAN MANZANA .....	12
PE09-AE01 - CONSOLIDAR EL PROYECTO DE LA GRAN MANZANA .....	12
PE10. COMPLEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA .....	14
PE10-AE01- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA .....	14
PE39-AE01- CREACIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD .....	16
EJE R. TU ENTORNO RENOVADO (FUNCIONAL, ATRACTIVO Y SOSTENIBLE) .....	17
PE56. SERVICIOS PÚBLICOS .....	17
EJE R. TU ENTORNO RENOVADO (FUNCIONAL, ATRACTIVO Y SOSTENIBLE) .....	22
PE58. IMAGEN URBANA .....	22
PE58-AE02-. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS .....	22
PE58-AE04-. ARTE URBANO .....	23
PE59. INFRAESTRUCTURA .....	27
PE59-AE02-. CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL .....	27
PE59-AE03-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES Y AVENIDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO .....	35
PE59-AE04-CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL MUNICIPAL. ....	38
PE38-AE07 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO DE IRAPUATO .....	41
PE61. SISTEMA DE PARQUES .....	43
PE61-AE02-. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, CONSERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PARQUES VECINALES .....	43
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025 .....	46
TRANSVERSALIDAD .....	52
EJE CIUDAD INTELIGENTE TU IRAPUATO (FELIZ, SEGURO Y EN PAZ) .....	52
PE06. CONSOLIDACIÓN DEL CAM (CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA) .....	52
PE06-AE01: VISIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO "EL CIUDADANO EN EL CENTRO" .....	52
PE17. FORTALECER LAS ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL .....	54
PE17- AE01- PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES .....	54
EJE A. TU FAMILIA CON VALORES (PRÓSPERA, UNIDA Y RESPONSABLE) .....	56
PE47. CONVIVE CENTROS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR .....	56
EJE R. TU ENTORNO RENOVADO (FUNCIONAL, ATRACTIVO Y SOSTENIBLE) .....	58
PE65.-ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS RURALES .....	58
ACCIONES NO ENCUADRADAS EN EL P.G.M. ....	59
GLOSARIO .....	60

## Introducción

La **Dirección General de Obras Públicas**, en apego a lo establecido en el artículo 110 del **Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato**, tiene como función principal participar en la planeación, programación, presupuestación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma vigilando su cumplimiento de conformidad con las disposiciones contenidas en la normatividad y legislación aplicable en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su respectivo reglamento. De conformidad con el artículo 111 determina su estructura organizativa, conformada por las **Direcciones de Edificación, Administración de Obra, Infraestructura Vial y Costos**.

1

### ARTÍCULO 112

#### Dirección de edificación

- Se encarga de la integración de los estudios y proyectos relacionados con la obra pública municipal, en el rubro de edificación, así como la coordinación de los mismos, ya sea directamente o por conducto de terceros
- Administrar, resguardar la documentación que integra el banco de proyectos ejecutivos en el rubro de Edificación
- Supervisar por sí o por medio de terceros, que la obra pública municipal en el rubro de Edificación contratada, se ejecute en los términos de la normatividad aplicable en la materia, del expediente técnico y del contrato respectivo entre otros

#### Dirección de Administración

- Coordinar con las dependencias promotoras que las acciones a contratar, sean acordes con los fines y alcances del Programa Municipal de Obra y del Programa de Inversión, funciones y trabajos propios del cargo
- Elaborar e integrar los expedientes técnicos para su validación inicial y final, ante las dependencias correspondientes, dar seguimiento a los convenios y lineamientos establecidos con las diferentes instancias gubernamentales, para la obra pública y servicios relacionados con la misma
- Llevar a cabo el registro, control, seguimiento, organización, captura, funcionamiento y resguardo del archivo de trámite y de concentración de la Dirección General de Obras Públicas

### ARTÍCULO 113

2





3

**ARTÍCULO  
114**

**Dirección de Infraestructura Vial**

- Realizar las acciones necesarias para la integración de los estudios y proyectos relacionados con la obra pública municipal, en el rubro de Infraestructura Vial,
- Coordinar los estudios y proyectos ya sea directamente o por conducto de terceros, dar seguimiento al proceso de liberación del derecho de vía, por si o por terceros, de las obras proyectadas de infraestructura vial
- Supervisar por si o por medio de terceros, que la obra pública municipal en el rubro de Infraestructura Vial contratada, se ejecute en los términos de la legislación aplicable en la materia, del expediente técnico y del contrato respectivo.

**Dirección de Costos**

- Elaborar y mantener actualizado un mercadeo regional de costos de los insumos necesarios para la construcción de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma.
- Coordinar, supervisar y autorizar la elaboración de los presupuestos base que forman parte integral de los expedientes técnicos en materia de obra pública y/o servicios relacionados con la misma
- Elaborar los presupuestos solicitados por las Dependencias, así como los solicitados por la Dirección de Edificación e Infraestructura Vial y vigilar que sean económicamente viables.

**ARTÍCULO  
115**

4





Este tercer informe trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre 2025, Irapuato avanza con paso firme y rumbo claro, para consolidar la transformación de la ciudad en un lugar en el que sus habitantes se sientan felices, seguros y en paz. La Administración Municipal, encabezada por la presidenta **Lorena Alfaro García**, apuesta por estrategias integrales e innovadoras, acercando un gobierno que escucha, atiende y trabaja activamente para el bien de la comunidad.

Bajo esta visión, se concretaron obras de gran trascendencia como la construcción del Centro de Atención Municipal (CAM), con una inversión de **113 millones 60 mil 228 pesos**, y la primera etapa del Centro Acuático en la Unidad Deportiva Norte, con una inversión de **62 millones 683 mil 370 pesos**. Ambas edificaciones fortalecen la infraestructura institucional y deportiva del municipio, impulsando servicios públicos de calidad, espacios dignos y modernos que promueven el bienestar de la ciudadanía.

Con el compromiso de fortalecer el tejido social y ofrecer espacios de convivencia seguros y funcionales, se puso en marcha la construcción de la Plaza Pública en la comunidad de Valencianita, con una inversión de **13 millones 555 mil 729 pesos**, proyecto que busca dotar en zona rural de un punto de encuentro y recreación, fomentando la integración comunitaria y el orgullo de pertenencia. De manera complementaria se continúan los trabajos de rehabilitación y ampliación de parques públicos en distintos puntos de la ciudad, consolidando una infraestructura urbana más accesible y sustentable.

Asimismo, la Administración Municipal impulsa acciones que responden a las necesidades prioritarias de movilidad y servicios básicos. Durante este periodo se inició la ejecución de 7 calles con un monto superior a los **67 millones de pesos** y 17 obras de electrificación urbana y rural, con una inversión de más de **9 millones de pesos**, que con el apoyo de Gobierno del Estado están enfocadas en mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias irapuatenses. Estas obras representan el resultado de una gestión responsable y comprometida, que avanza con visión de futuro y con un profundo sentido social hacia el desarrollo equilibrado del municipio.

ATENTAMENTE



Ing. Manuel Venegas Pérez  
Director General de Obras Públicas



## Estado del avance presupuestal

### Estado del avance presupuestal a septiembre

Unidad Responsable	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por ejercer	% de ejecución
Dirección General de Obras Públicas	\$48,634,113.36	\$40,639,689.52	\$5,773,126.95	\$23,757,266.51	\$11,109,296.06	58
Dirección de Edificación	\$51,177,009.03	\$475,650,552.86	\$124,488,225.48	\$340,516,778.15	\$10,645,549.23	72
Dirección de Administración de Obra	\$7,991,742.48	\$76,142,927.54	\$13,949,776.63	\$59,426,345.55	\$2,766,805.36	78
Dirección de Infraestructura Vial	\$106,202,783.07	\$307,068,866.21	\$104,414,817.45	\$190,445,222.25	\$12,208,826.51	62
Dirección de Costos	\$3,090,892.52	\$3,029,022.58	\$119,947.42	\$2,001,420.16	\$907,655.00	66
<b>Total</b>	<b>\$217,096,540.49</b>	<b>\$902,531,058.71</b>	<b>\$248,745,893.93</b>	<b>\$616,147,032.62</b>	<b>\$37,638,132.16</b>	<b>68</b>

Nota: Montos y porcentajes proporcionados por la Tesorería Municipal.

### Modificaciones Presupuestales

Presupuesto Aprobado 2025	1ª. Modificación Presupuestal	2ª. Modificación Presupuestal
\$217,096,540.49	\$892,307,038.44	\$902,531,058.71





## Estatus de ramo 33 2025

FONDO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	NOMBRE, DESCRIPCIÓN O TIPO DE LA OBRA DE LA ACCIÓN	APROBADO	1ERA MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	EJERCIDO	% DE EJECUCIÓN
COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS							
FAIS	DGOP	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	\$18,500,000.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A
FORTAMUN	DGOP	OBRAS DE EDIFICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,000,000.00	\$2,959,695.31	\$2,943,318.59	\$2,188,296.13	73.94
FORTAMUN	DGOP	TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO	\$0.00	\$2,542,949.03	\$2,540,351.38	\$2,540,337.27	99.89
FORTAMUN	DGOP	CONTRATACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	\$0.00	\$10,420,201.97	\$10,355,621.03	\$9,320,058.93	89.44
FORTAMUN	DGOP	PAGO DE DERECHO DE VIA	\$0.00	\$14,077,153.69	\$13,051,940.12	\$6,525,970.06	46.36
FORTAMUN	DGOP	OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PROPIEDAD MUNICIPAL	\$13,089,432.44	\$13,089,432.44	\$12,286,606.95	\$9,214,955.21	70.40
COMISION DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES							
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS							
FAIS	DGOP	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA MANCHA URBANA Y RURAL	\$79,888,790.61	\$86,046,133.17	\$84,140,088.29	\$28,972,070.31	33.67
FORTAMUN	DGOP	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA MANCHA URBANA Y RURAL	\$0.00	\$11,531,343.36	\$11,238,347.01	\$10,114,512.31	87.71
FAIS	DGOP	URBANIZACIÓN DE CAMINOS RURALES/ PLAZA PUBLICAS	\$16,885,120.83	\$16,885,120.83	\$13,555,729.52	\$4,066,718.86	24.08
			<b>\$158,363,343.88</b>	<b>\$157,552,029.80</b>	<b>\$150,112,002.89</b>	<b>\$72,942,919.08</b>	

## Modificaciones presupuestales realizadas

En este trimestre se solicitó y aprobó dentro de la Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de esta Dependencia, una ampliación líquida al presupuesto ya aprobado por 18 millones 692 mil 224 pesos, etiquetado en los siguientes códigos programáticos y para las siguientes acciones descritas.





CÓDIGO PROGRAMÁTICO						
FONDO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2DA. MODIFICACIÓN
1525811100	31111M150010901	221	E00050101	6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$ 6,536,939.54
2525821200	31111M150010901	221	E00050101	6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$ 2,500,000.00
2525822200	31111M150010901	221	E00050101	6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$ 2,716,000.00
2625914100	31111M150010902	221	E00050202	6120	Edificación No Habitacional (Obra en Bienes Dominio Público)	\$ 1,800,000.00
1525811100	31111M150010902	221	E00050202	6220	Edificación No Habitacional (Obra en Bienes Propios)	\$ 5,139,284.82

ACCIÓN	MONTO	ALINEACIÓN P.G.M. 2024-2027
CONVENIO EN COSTO DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN IRAPUATO, GTO.	\$335,420.04	EJE CIUDAD INTELIGENTE TU IRAPUATO (FELIZ, SEGURO Y EN PAZ) PE06. CONSOLIDACIÓN DEL CAM (CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA) PE06-AE01- VISIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO "EL CIUDADANO EN EL CENTRO"
CENTRO NUEVO COMIENZO BENITO JUÁREZ, IRAPUATO.	\$1,800,000.00	EJE CIUDAD INTELIGENTE TU IRAPUATO (FELIZ, SEGURO Y EN PAZ) PE11. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE GUBERNAMENTAL PE11-AE19.- GESTIÓN DE RECURSO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIALIDAD ALTERNA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALZADA DE GUADALUPE (POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR FERROVIARIO DE CALZADA DE GUADALUPE) EN IRAPUATO, GTO.	\$5,419,188.50	EJE R. TU ENTORNO RENOVADO (FUNCIONAL, ATRACTIVO Y SOSTENIBLE) P59. INFRAESTRUCTURA PE59-AE02.- CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL
PAGO DE AFECTACIÓN AL EJIDO DE AV. INDEPENDENCIA.	\$4,000,000.00	
COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE PAVIMENTOS EN VIALIDADES SECUNDARIAS Y LOCALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO.	\$1,296,390.50	
PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CALLES DENTRO DE LA MANCHA URBANA Y/O RURAL.	\$2,500,000.00	
COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DEL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD LO DE SIERRA KM. 3+400.00 AL ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA ROSA TEMASCATÍO KM. 11+463.00 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	\$3,341,225.32	EJE R. TU ENTORNO RENOVADO (FUNCIONAL, ATRACTIVO Y SOSTENIBLE) P59. INFRAESTRUCTURA PE59-AE04-CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL MUNICIPAL.





## Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal

### EJE Ciudad Inteligente TU IRAPUATO (Feliz, Seguro y en Paz)

#### PE03. Patrimonio Histórico


#### PE03-AE09- Programa de Conservación rutinaria del Centro Histórico

Durante este trimestre, la administración municipal consolidó 5 acciones que fortalecen la preservación del patrimonio con un monto total de **8 millones 927 mil 199 pesos**, entre las obras terminadas destaca la rehabilitación de pintura mural en pasillos del edificio de Presidencia Municipal con un monto de **2 millones 675 mil 52 pesos** y la rehabilitación de fachadas en la Calle Pípila y Calle Galeana, con una inversión de **1 millón 545 mil 741 pesos**, y 2 proyectos ejecutivos relevantes que garantizan la correcta planeación de futuras intervenciones de conservación, estas acciones reafirman el compromiso de la administración con la protección del patrimonio, el fortalecimiento de la actividad turística y la consolidación de espacios públicos de calidad.

PE03-AE09- Programa de Conservación rutinaria del Centro Histórico			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Rehabilitación de pintura mural en <b>pasillos del edificio de Presidencia Municipal</b> en el municipio de Irapuato, Gto.	\$2,675,052.30	100
2	Rehabilitación de <b>fachadas en Calle Pípila de Galeana a Ramón Corona y Calle Galeana de Calle Manuel M. Flores a Calle Pípila</b> , en Irapuato, Gto.	\$1,545,741.12	100
3	Conservación rutinaria y mejoramiento de infraestructura y equipamiento del <b>Centro Histórico</b> en Irapuato, Gto.	\$3,497,858.14	75
4	Proyecto ejecutivo para la intervención a <b>áreas anexas y atrio del templo de Santiaguito (escuela diocesana)</b> , en Irapuato, Gto.	\$788,565.65	99
5	Proyecto ejecutivo para la <b>Rehabilitación e Intervención de terraza de Oficina de Presidencia y Secretaría Particular, de Presidencia Municipal</b> , en Irapuato, Gto.	\$419,982.61	97



PE03-AE09- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DEL CENTRO HISTÓRICO

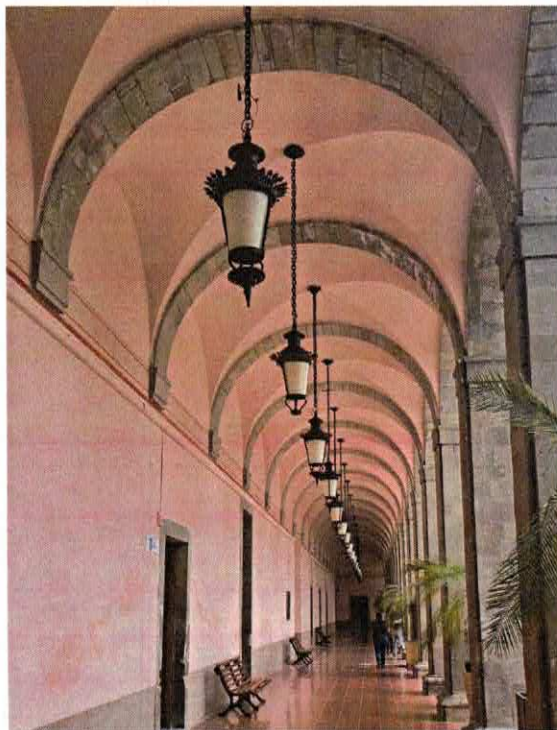

REHABILITACIÓN DE PINTURA MURAL EN PASILLOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.



REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE PÍPILA DE GALEANA A RAMÓN CORONA Y CALLE GALEANA DE CALLE MANUEL M. FLORES A CALLE PÍPILA.







**CONSERVACIÓN RUTINARIA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO.**



**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCIÓN A ÁREAS ANEXAS Y ATRIO DEL TEMPLO DE SANTIAGUITO (ESCUELA DIOCESANA).**






PE09 – La Gran Manzana

PE09-AE01 – Consolidar el Proyecto de la Gran Manzana

Con una inversión de **93 millones 482 mil 728 pesos**, se concluye la obra del proyecto integral para la construcción de la cubierta norte, fachada y obra complementaria en el Estadio Sergio León Chávez, intervención que fortalece la infraestructura deportiva y dota a Irapuato de un espacio moderno y funcional para eventos de gran escala.

En materia de planeación, se trabaja en el proyecto ejecutivo para la integración urbana del acceso al Parque Irekua, con una inversión de **439 mil 100 pesos**, que busca generar una mejor conectividad con el andador comercial del IMSS y favorecer la movilidad peatonal, estas acciones consolidan la visión de un municipio con infraestructura deportiva y urbana de primer nivel, orientada a detonar la cohesión social, el turismo y la calidad de vida de las familias irapuatenses.

PE09-AE01- Consolidar el Proyecto de la Gran Manzana			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Proyecto Integral para la construcción de <b>Cubierta norte, Fachada y Obra Complementaria, en El Estadio Sergio León Chávez</b> , en Irapuato, Gto.	\$93,482,728.57	100
2	Gerenciamiento del Proyecto Integral para la <b>Rehabilitación Integral del Estadio Sergio León Chávez</b> (Fase de Revisión, Supervisión y Validación de Proyectos Ejecutivos), en Irapuato, Gto. Considerando: Paquete 1 (Área de Cancha y Baño Vestidores) Paquete 2 (Rehabilitación de Palcos) Paquete 3. (Instalación Eléctrica y Alumbrado en Cancha) Paquete 4 (Estructura de Concreto, Techumbre Perimetral y Recubrimiento de Fachada Principal).	\$3,322,993.33	100
3	Proyecto ejecutivo para la integración urbana de la zona del <b>acceso a Parque IREKUA sobre la calle Reverte Mexicano, Estancia y calle Rodolfo Gaona conectando con andador comercial del IMSS</b> , en Irapuato, Gto.	\$439,100.54	95





**PE09-AE01- Consolidar el Proyecto de la Gran Manzana**



**PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA NORTE, FACHADA Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL ESTADIO SERGIO LEÓN CHÁVEZ**



**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTEGRACIÓN URBANA DE LA ZONA DEL ACCESO A PARQUE IREKUA SOBRE LA CALLE REVERTE MEXICANO, ESTANCIA Y CALLE RODOLFO GAONA CONECTANDO CON ANDADOR COMERCIAL DEL IMSS**



PE10. Complejo de Seguridad Ciudadana

PE10-AE01- Fortalecer la Infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Se continua con una de las obras más emblemáticas y de mayor impacto social de la actual administración: la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana, con una inversión de **245 millones 665 mil 225 pesos** en su primera etapa. Esta obra representa un parteaguas en la estrategia de seguridad pública, al concentrar en un solo espacio las áreas operativas y administrativas, fortaleciendo la capacidad de respuesta, la coordinación institucional y la atención oportuna a la ciudadanía. Paralelamente, se avanza en la planeación mediante el proyecto ejecutivo para la terminación del Complejo, con una inversión de **2 millones 999 mil 929 pesos**, que asegura la continuidad de esta infraestructura prioritaria. Con estas acciones reafirmamos el compromiso con la tranquilidad, la protección y la confianza de la ciudadanía.

PE10-AE01- Fortalecer la Infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Primera etapa para la construcción del <b>Complejo de Seguridad Ciudadana</b> , en Irapuato, Gto.	\$241,985,707.39	92
2	Supervisión externa para la construcción del <b>complejo de Seguridad Ciudadana (primera etapa)</b> , en Irapuato, Gto.	\$3,679,517.69	92
3	Proyecto ejecutivo para la terminación del <b>Complejo de Seguridad Ciudadana</b> , en Irapuato, Gto.	\$2,999,929.99	59





**PE10-AE01- Fortalecer la Infraestructura de la Secretaria**



**PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA**



**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA**



## EJE A. TU Familia con Valores (Próspera, Unida y Responsable)


PE39. Centro de inclusión para las personas con discapacidad

PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad

Se continúan impulsando acciones de planeación orientadas a fortalecer la atención y el bienestar de los sectores más vulnerables, destacando la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Inclusión Social "Sin Límites" y Unidad de Rehabilitación, a desarrollarse en la nave 1 del DIF municipal, con una inversión de **668 mil 31 pesos**, este proyecto representa el primer paso para consolidar un espacio integral que brinde servicios especializados, promueva la inclusión y garantice el acceso a infraestructura digna para personas con discapacidad y sus familias.

PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Proyecto ejecutivo para la construcción del <b>centro de inclusión social "sin límites" y unidad de rehabilitación, en la nave 1 del DIF municipal, en Irapuato, Gto</b>	\$668,031.65	62

### PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad

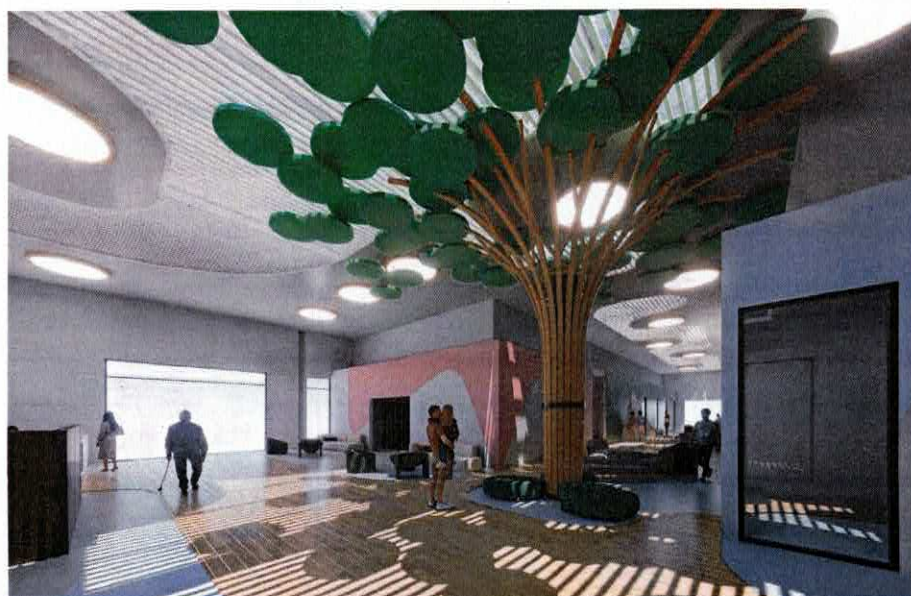

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL "SIN LÍMITES" Y UNIDAD DE REHABILITACIÓN, EN LA NAVE 1 DEL DIF MUNICIPAL



## EJE R. TU Entorno Renovado (Funcional, Atractivo y Sostenible)

### PE56. Servicios Públicos

#### PE56-AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público.

Hemos impulsado de manera significativa el programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público, con la ejecución de 17 obras que se encuentran en proceso distribuidas en distintas localidades urbanas y rurales que carecían del servicio o presentaban deficiencias en su cobertura. Estas acciones representan una inversión total de **9 millones 468 mil 124 pesos**, destinada a fortalecer la infraestructura eléctrica en zonas que demandaban mejores condiciones de seguridad, conectividad y bienestar social, garantizando que más familias accedan a un suministro confiable de energía eléctrica, lo que impacta directamente en la calidad de vida, fomenta el desarrollo comunitario y refuerza la percepción de seguridad en sus entornos.


PE56. Servicios Públicos			
PE56-AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de alumbrado público en el municipio de Irapuato, Gto. en el <b>camino San Javier a Cuchicuato, en su tramo; km 5+616 a calle Independencia (Cuchicuato)</b>	\$599,827.78	50
2	Construcción de alumbrado público en el municipio de Irapuato, Gto. en el inicio del <b>camino a la localidad de Ojo de agua de Bermúdez.</b>	\$380,743.15	65





No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
3	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la localidad Irapuato, en las <b>calles Privadas Sin Nombre, camino a Vista Alegre.</b>	\$1,299,460.50	20
4	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la localidad <b>San Cristóbal en la calle Prolongación Altamirano.</b>	\$785,657.88	30
5	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad la Calera, en calles Privada sin nombre y Av. las Torres.</b>	\$682,247.83	1
6	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Santa Elena de la cruz, en la calle 12 de diciembre.</b>	\$621,160.09	50
7	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la <b>colonia Villa Real, en la calle Villa de Coria, (tramo: de calle Villa del Rosal a calle del Bosque).</b>	\$582,484.73	27
8	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Aldama, calle Tacubaya.</b>	\$559,741.63	1
9	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la <b>colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Felipe Ángeles, (tramo: de Manuel Ávila Camacho a calle Mariano Patlán).</b>	\$557,470.20	2

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
10	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad San Cristóbal, en la calle las Palmas.</b>	\$552,375.03	35
11	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad el Barrial, calle Santiago.</b>	\$542,106.23	1
12	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad San Cristóbal, en la calle Privada Paraíso.</b>	\$478,653.92	30
13	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la <b>colonia Villa Real, en la calle del Río, (tramo: de Ignacio García Téllez a calle Villa de las estrellas).</b>	\$433,151.68	25
14	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad la Calera, calle Conín.</b>	\$399,002.33	1
15	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad San Cristóbal, en la calle Girasoles.</b>	\$352,551.53	30
16	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la <b>localidad de Tierras Negras, calle Benito Juárez.</b>	\$328,944.89	1
17	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Cuchicuato, en la calle Ignacio Allende.</b>	\$312,544.75	10





**PE56-AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público**



**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO  
SAN JAVIER A CUCHICUATO.**



**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  
EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALTAMIRANO.**



**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN  
EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA  
COLONIA VILLA REAL, EN LA CALLE VILLA  
DE CORIA.**



**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA  
COLONIA VILLA REAL, EN LA CALLE DEL RIO.**






**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, EN LA CALLE GIRASOLES.**



**AMPLIACIÓN DE RED DE EN LA LOCALIDAD CUCHICUATO, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE.**

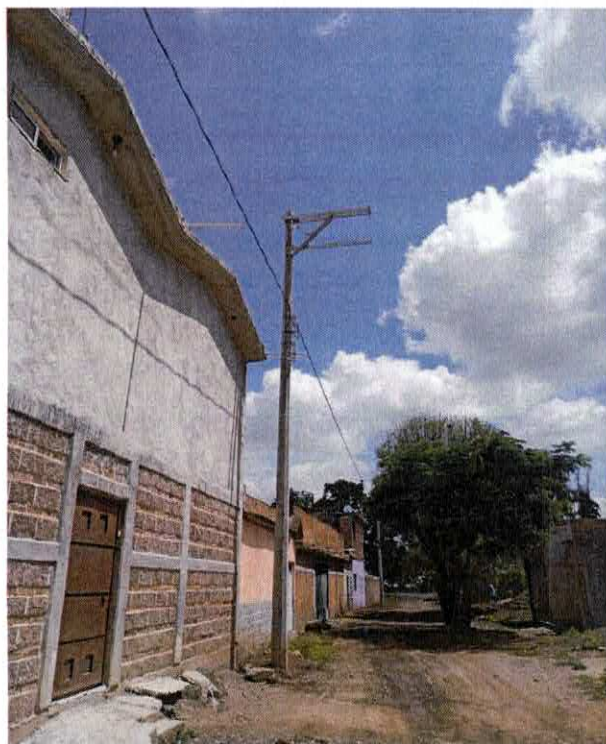

**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ, EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE.**



**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, EN LA CALLE LAS PALMAS.**

*[Handwritten signature]*



## EJE R. TU Entorno Renovado (Funcional, Atractivo y Sostenible)

### PE58. Imagen Urbana

#### PE58-AE02-. Recuperación de espacios públicos

Durante el presente trimestre se ejecuta una obra con una inversión de **1 millón 078 mil 603 pesos**, destinada a la colocación de la escultura "Frespirales" en la plaza Clouthier, obra que favorece el rescate y dignificación de este espacio emblemático, incrementando su valor cultural y reforzando el sentido de pertenencia de los irapuatenses, la apuesta por el arte público es también una estrategia para fortalecer la cohesión social y enriquecer la experiencia urbana de quienes transitan y disfrutan de estos lugares.

PE58-AE02-. Recuperación de espacios públicos			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Colocación de <b>escultura "frespirales" en plaza Clouthier</b> , en Irapuato, Gto.	\$1,078,603.51	3

#### PE58-AE02-. Recuperación de espacios públicos



COLOCACIÓN DE ESCULTURA "FRESPIRALES" EN PLAZA CLOUTHIER.





## PE58-AE04-. Arte Urbano

Dentro de este programa durante este trimestre se reporta la terminación de 3 obras y 2 más que se encuentran en ejecución, con una inversión de **7 millones 928 mil 137 pesos**, orientadas a la dignificación de espacios públicos, la mejora del paisaje urbano y la consolidación de entornos seguros y atractivos para la ciudadanía. La atención a corredores urbanos como el andador Juan Álvarez esquina con Cortázar y la intersección de Av. Mariano J. García con calles Jabalí y Cebú representan una inversión en infraestructura paisajística que contribuye al bienestar social, fomentando la apropiación ciudadana y el uso seguro de los espacios de convivencia, con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de fortalecer la imagen urbana de la ciudad, generando condiciones que favorecen el desarrollo económico, cultural y social a través de la recuperación y mantenimiento de entornos urbanos modernos, accesibles y con identidad propia.

PE58-AE04-. Arte Urbano			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Iluminación escénica de <b>punto peatonal "CBTIS"</b> en Irapuato, Gto.	\$1,868,452.08	100
2	Mantenimiento de <b>áreas verdes, camellones y espacios públicos en vialidades principales</b> , en Irapuato, Guanajuato.	\$1,042,945.42	100
3	Intervención de arbolado e Imagen urbana en el <b>Andador Juan Álvarez esq. Cortázar</b> , en Irapuato, Gto.	\$730,076.25	100
4	Intervención integral de Paisajismo Urbano en <b>Intersección de Av. Mariano J. García y calles Jabalí y Cebú</b> , en Irapuato, Gto.	\$2,894,009.01	81
5	Mantenimiento de <b>áreas verdes, camellones y espacios públicos en vialidades principales</b> , en Irapuato, Guanajuato. <b>2da. etapa.</b>	\$1,392,654.87	25





PE58-AE04-. Arte Urbano



ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE PUENTE PEATONAL "CBTIS"



MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CAMELLONES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN VIALIDADES PRINCIPALES.





**INTERVENCIÓN DE ARBOLADO E IMAGEN URBANA EN EL ANDADOR JUAN ÁLVAREZ ESQ. CORTÁZAR.**



**INTERVENCIÓN INTEGRAL DE PAISAJISMO URBANO EN INTERSECCIÓN DE AV. MARIANO J. GARCÍA Y CALLES JABALÍ Y CEBÚ.**

*[Handwritten signature]*



**MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CAMELONES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN VIALIDADES PRINCIPALES, 2DA. ETAPA.**





PE59. Infraestructura

PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal

Este trimestre se reportan 18 acciones, que en su conjunto representan una inversión de **75 millones 922 mil 83 pesos**, destinadas a mejorar la infraestructura vial y fortalecer la planeación urbana. Entre ellas se encuentran 12 obras, que en su mayoría corresponden a pavimentaciones en comunidades rurales y colonias urbanas como El Venado de Yóstiro, San Roque, Plan Vivirá, Cuchicuato, Tejamanil y Lo de Juárez, además de intervenciones en calles como Fray Juan de Zumárraga; acciones que permiten mejorar la conectividad, incrementar la seguridad vial y dignificar el entorno de miles de familias. De manera paralela, se desarrollaron 6 proyectos, entre los que destacan el proyecto geométrico del segundo acceso a la zona norponiente de la ciudad y la ampliación del puente sobre el Río Silao en el Bulevar Paseo de la Altiplanicie, instrumentos fundamentales para la planeación ordenada y la toma de decisiones en materia de obra pública.

PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., <b>localidad El Venado de Yostiro, calle Guerrero - Principal - Lázaro Cárdenas</b> (tramo: todo el frente de la barda del kínder)	\$1,803,545.36	100
2	Trabajos de restitución de fachadas y obras complementarias ( <b>paquete 2</b> ) por afectaciones derivadas de la <b>obra de urbanización de la calle Guanajuato, tramo: de calle Agricultores a Av. Independencia en la col. el Zapote del Milagro</b> , en Irapuato, Gto.	\$1,265,001.20	100



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
3	Trabajos de restitución de fachadas y obras complementarias ( <b>paquete 3</b> ) por afectaciones derivadas de la <b>obra de urbanización de la calle Guanajuato, tramo: de calle Agricultores a Av. Independencia en la col. el Zapote del Milagro</b> , en Irapuato, Gto.	\$1,038,995.77	100
4	Trabajos de restitución de fachadas y obras complementarias ( <b>paquete 1</b> ) por afectaciones derivadas de la <b>obra de urbanización de la calle Guanajuato, tramo: de calle Agricultores a Av. Independencia en la col. el Zapote del Milagro</b> , en Irapuato, Gto.	\$1,018,154.45	100
5	Trabajos complementarios a la <b>calle Eduardo M Vargas y Victorino de las Fuentes en la colonia la Moderna</b> , Irapuato, Gto.	\$261,669.53	100
6	Construcción de pavimentación con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., <b>localidad San Roque, calle Emiliano Zapata (tramo: de Manuel Doblado al arroyo)</b> .	\$8,619,574.53	2
7	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Irapuato, en la colonia Plan Viviré, en la calle 3 de Abril (tramo: de Lázaro Cárdenas a Av. Independencia)</b> .	\$2,531,444.22	4





No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
8	Construcción de pavimentación con asfalto, en el municipio de Irapuato, Gto, en la localidad Irapuato, en la <b>calle Fray Juan de Zumárraga (tramo: de calle San Miguel a la Av. Gabriel García Márquez).</b>	\$22,704,444.43	1
9	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Cuchicuato, en la calle Independencia, (tramo: de calle Av. 5 de Mayo a Lázaro Cárdenas).</b>	\$10,104,311.80	23
10	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Tejamanil, en la calle deportiva (Mezquite) tramo: Palma a camino de la carretera.</b>	\$8,179,886.62	7
11	Construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, <b>colonia el Vergel, calle Magnolia (tramo: de Mariano Abasolo a calle Uva.)</b>	\$7,713,710.17	1
12	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Lo de Juárez, en la calle Leyes de Reforma, (tramo: de calle Lázaro Cárdenas a calle Guadalupe Victoria).</b>	\$7,442,806.92	3
13	Estudio diagnóstico de <b>pavimentos en vialidades secundarias y locales del municipio de Irapuato.</b>	\$1,197,984.93	100



No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
14	Proyecto geométrico y análisis de alternativas del <b>segundo acceso a la zona norponiente</b> de la ciudad de Irapuato, Gto.	\$650,361.35	100
15	Elaboración de <b>66 avalúos comerciales en diferentes puntos de la ciudad</b> de Irapuato, Gto.	\$522,878.97	100
16	Proyecto de ampliación del <b>punto sobre el Río Silao en Blvd de la Altiplanicie o Blvd a Villas</b> , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$429,950.10	100
17	Análisis estructural complementario del proyecto del <b>punto sobre el río Guanajuato de acceso a la comunidad de El Carrizalito</b> , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$236,867.30	100
18	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, <b>comunidad purísima del progreso, calle José López Portillo</b> (tramo: Ignacio Zaragoza- Guadalupe Victoria.)	\$200,495.50	100





**PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal**



**CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO LOCALIDAD EL VENADO DE YÓSTIRO, CALLE GUERRERO - PRINCIPAL - LÁZARO CÁRDENAS.**



**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO LOCALIDAD SAN ROQUE, CALLE EMILIANO ZAPATA.**





**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, EN LA CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA (TRAMO: DE CALLE SAN MIGUEL A LA AV. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ).**



**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD CUCHICUATO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA.**







CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD TEJAMANIL, EN LA CALLE DEPORTIVA (MEZQUITE) TRAMO:  
PALMA A CAMINO DE LA CARRETERA.



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD LO DE JUÁREZ, EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, (TRAMO:  
DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE GUADALUPE VICTORIA).





### PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio


En este proyecto estratégico se reporta la ejecución de 3 obras que representan una inversión de **46 millones 76 mil 614 pesos**, orientadas a la modernización de vialidades primarias y secundarias que concentran un alto flujo vehicular y peatonal, entre estas intervenciones se encuentran: la Avenida Independencia, en su cuerpo sur obra estratégica para mejorar la movilidad en una de las arterias de mayor relevancia, se avanza en la rehabilitación de la calle Santo Domingo, vialidad que conecta a sectores habitacionales consolidados y contribuye a la seguridad de los traslados locales, finalmente la rehabilitación del Boulevard Solidaridad, en el cuerpo sur, frente a Rancho Grande, tramo que constituye un corredor de comunicación regional, acción que ofrece mejores condiciones para el tránsito pesado.

Con estas acciones, reforzamos nuestro compromiso de dotar a la ciudadanía de una red vial más segura, funcional y con mayor durabilidad, elevando la calidad de los traslados y reduciendo tiempos de recorrido.

PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Rehabilitación vial de la <b>Av. Independencia (cuerpo sur), tramo: Av. las Águilas a vías del FF.CC.</b> en Irapuato, Gto.	\$29,401,203.97	26
2	Rehabilitación vial de la <b>calle Santo Domingo, tramo: Av. Héroe de Nacozari a calle División del Norte col. las Heras</b> , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$12,309,824.59	73
3	Rehabilitación vial del <b>Blvd. Solidaridad, tramo: C-4 a la Gasa del Distribuidor vial (cuerpo sur) frente a Rancho Grande</b> en la ciudad de Irapuato, Gto.	\$4,365,585.96	95




PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio

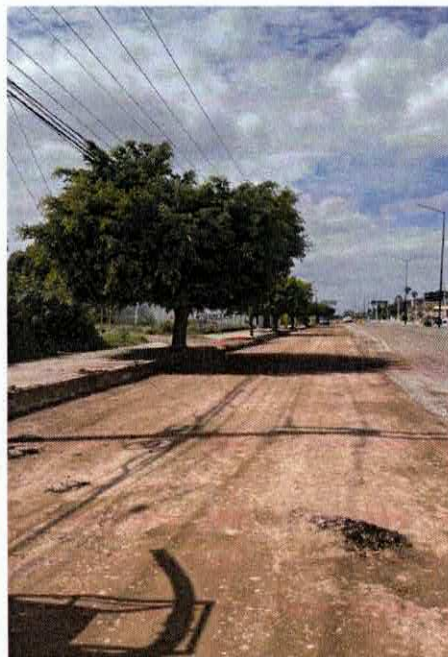

REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. INDEPENDENCIA (CUERPO SUR), TRAMO: AV. LAS ÁGUILAS A VÍAS DEL FF.CC.



REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO: AV. HÉROE DE NACÓZARI A CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COL. LAS HERAS.







**REHABILITACIÓN VIAL DEL BLVD. SOLIDARIDAD, TRAMO: C-4 A LA GASA DEL DISTRIBUIDOR VIAL (CUERPO SUR) FRENTE A RANCHO GRANDE.**



## PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.

Con una inversión de **58 millones 591 mil 4 pesos**, se ejecutaron acciones en materia de infraestructura rural que representan un desarrollo territorial más equitativo e incluyente. Se concluyó la construcción del camino rural que conecta desde el entronque a la comunidad Lo de Sierra hasta el acceso a Santa Rosa Temascatío, obra que resulta estratégica al fortalecer la movilidad de habitantes de la zona rural, facilitando el traslado de personas, bienes y servicios, además de impulsar la productividad agrícola y el acceso a centros educativos y de salud, así mismo se desarrollaron proyectos ejecutivos, los cuales servirán de base para garantizar obras con criterios de calidad y seguridad.

Con este conjunto de acciones, reforzamos nuestro compromiso de reducir rezagos en infraestructura rural, generando mejores condiciones de acceso, movilidad y desarrollo económico para las comunidades más alejadas.


PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de camino rural en el tramo del <b>entronque a la Comunidad Lo de Sierra km. 3+400.00 al acceso a la comunidad Santa Rosa Temascatío km. 11+463.00</b> del municipio de Irapuato, Gto.	\$55,544,763.43	100
2	Servicios de liberación de derecho de vía para la pavimentación de los <b>caminos rurales: "ex hacienda de Márquez - castro del rio", "el Romeral - Guadalupe de Rivera" y "Loma Bonita - Tocoín"</b> de este municipio de Irapuato, Gto.	\$1,759,981.55	100
3	Proyecto ejecutivo para la pavimentación del <b>camino rural: el Coecillo-la Soledad, en la comunidad de la Soledad</b> del municipio de Irapuato, Gto.	\$854,192.95	100
4	Proyecto ejecutivo para la pavimentación del <b>camino rural del panteón de los Olivos a Loma de los conejos</b> en el municipio de Irapuato, Gto.	\$432,067.03	100




**PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.**



**CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DEL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD LO DE SIERRA KM. 3+400.00 AL ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA ROSA TEMASCATÍO KM. 11+463.00.**

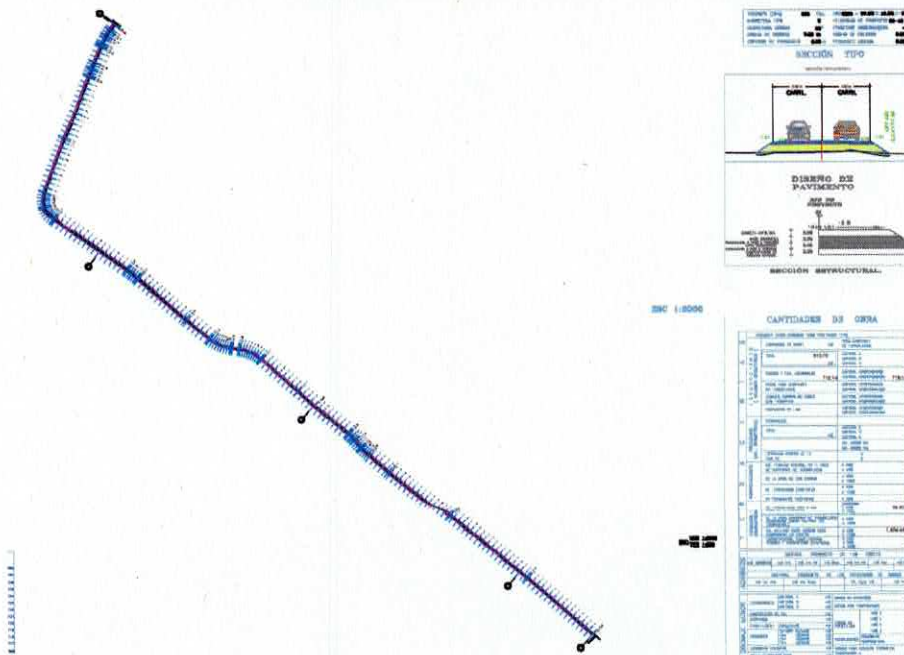

**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL: EL COECILLO-LA SOLEDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD.**

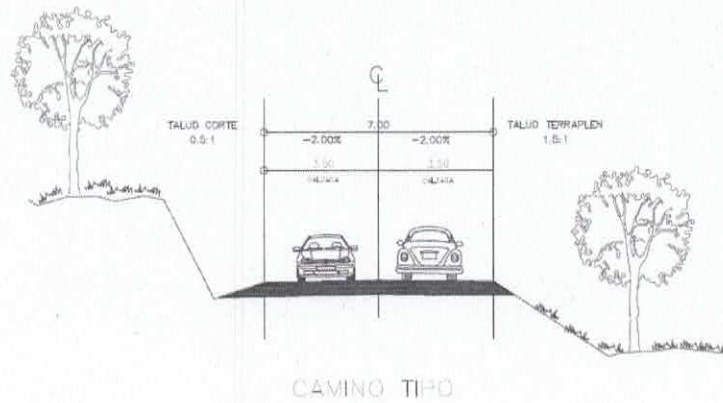

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL PANTEÓN DE LOS OLIVOS A LOMA DE LOS CONEJOS



### PE38-AE07 – Construcción del Centro Acuático de Irapuato


Se concluye la construcción del Centro Acuático en la Unidad Deportiva Norte (1ª Etapa), con una inversión de **62 millones 683 mil 370 pesos** esta obra emblemática marca un avance significativo en la infraestructura deportiva de nuestro municipio siendo este un espacio diseñado para brindar actividades acuáticas tanto recreativas como de formación y competencia, beneficiando a deportistas, escuelas, clubes y ciudadanía en general, además de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la integración comunitaria. De manera complementaria, se concluyó la actualización del análisis costo-eficiencia para la terminación del Centro Acuático y obras complementarias, ejercicio técnico con una inversión de **49 mil 998 pesos**, que permite asegurar la correcta planeación y ejecución de las etapas subsecuentes, garantizando la sostenibilidad y funcionalidad integral del complejo deportivo.

Con estas acciones consolidamos nuestro compromiso con el impulso al deporte, la recreación y la salud, mediante infraestructura moderna, incluyente y al servicio de la comunidad.

PE38-AE07- Construcción del Centro Acuático de Irapuato			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción del <b>Centro Acuático en la unidad deportiva Norte (1era Etapa)</b> , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$62,683,370.44	100
2	Actualización de análisis costo eficiencia para la <b>terminación del Centro Acuático y obras complementarias en la unidad Deportiva Norte</b> , en Irapuato, Gto.	\$49,998.73	100



PE38-AE07- Construcción del Centro Acuático de Irapuato

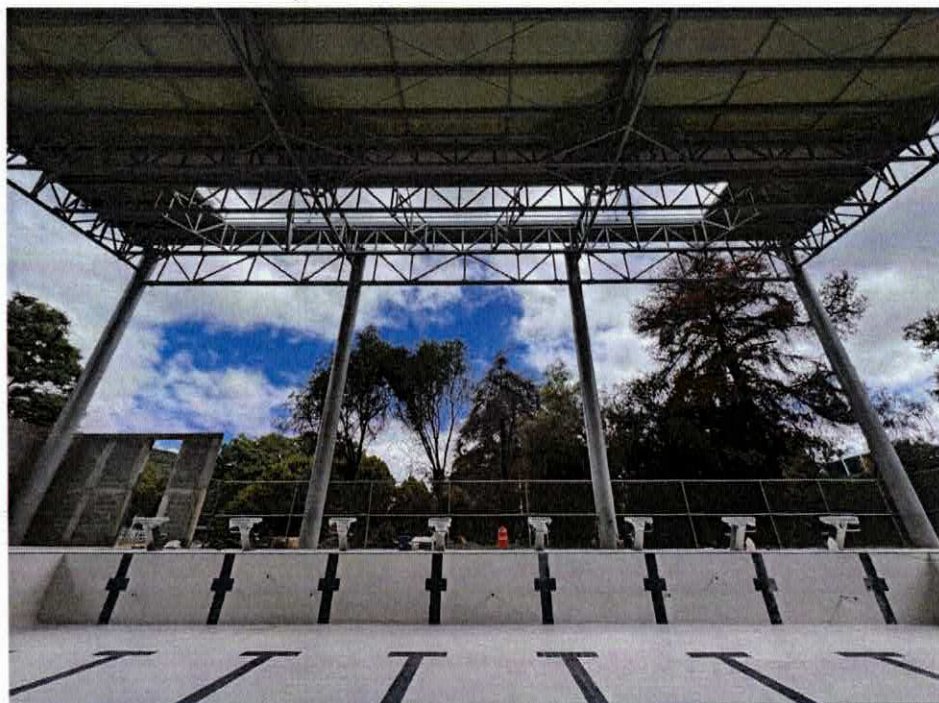

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE (1ERA ETAPA).



CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE (1ERA ETAPA).





PE61. Sistema de Parques

PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales

Durante este trimestre se reporta la ejecución de 4 obras que en conjunto representan una inversión de **30 millones 418 mil 265 pesos**, orientadas a la creación, rehabilitación y ampliación de áreas destinadas al esparcimiento, la convivencia y el fortalecimiento del tejido social. Las intervenciones incluyen la construcción de la plaza pública en la comunidad de Valencianita, la rehabilitación del parque ubicado en la zona posterior del mercado Benito Juárez y la rehabilitación de parques públicos en varias colonias, con esto generamos entornos más seguros, accesibles y con mejores condiciones para el deporte, la recreación y la convivencia familiar.

PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de <b>plaza pública en la comunidad de Valencianita</b> , en Irapuato, Gto.	\$13,555,729.52	11
2	Rehabilitación de parque ubicado en la <b>zona posterior del mercado Benito Juárez</b> , en Irapuato, Gto.	\$6,834,594.20	20
3	Ampliación de parque público en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Irapuato, en la colonia FONHAPO</b> .	\$5,492,900.60	4
4	Rehabilitación de parque público en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, <b>en la colonia Magisterial, ubicado en la calle Rafael Ramírez</b> .	\$4,535,040.74	6






**PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales**



**CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE VALENCIANITA.**

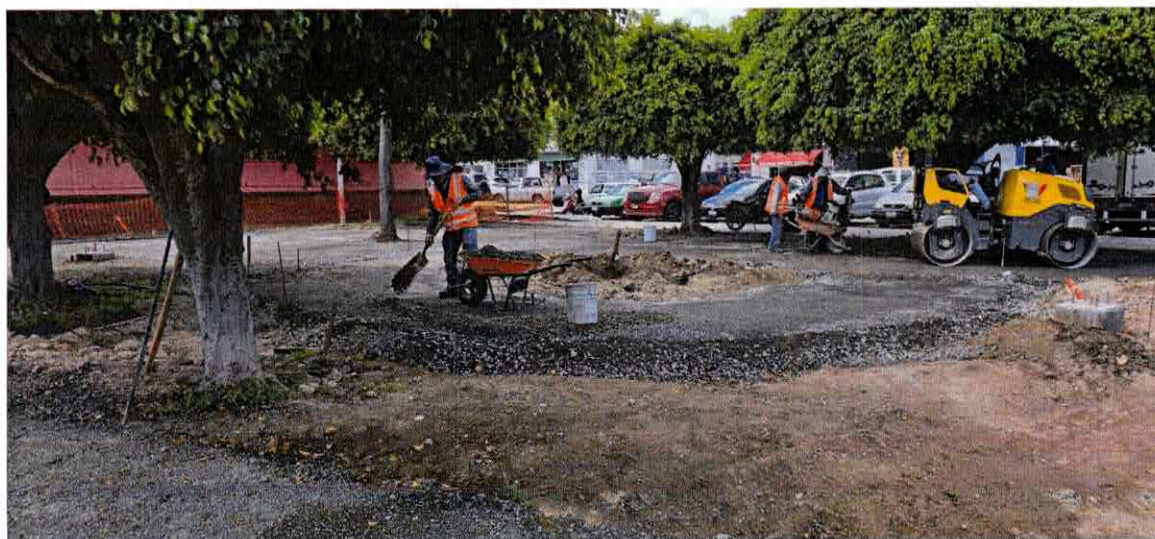

**REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA ZONA POSTERIOR DEL MERCADO BENITO JUÁREZ.**







**AMPLIACIÓN DE PARQUE, EN LA COLONIA FONHAPO.**



**REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA MAGISTERIAL, UBICADO EN LA CALLE RAFAEL RAMÍREZ.**





## Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2025

Esta matriz constituye una herramienta de planeación y gestión que permite orientar las acciones del gobierno municipal hacia el logro de resultados concretos, medibles y alineados con los objetivos del desarrollo. A través de esta matriz se establecen los indicadores, metas y medios de verificación que garantizan una administración eficiente de los recursos públicos, fortaleciendo la transparencia, la evaluación del desempeño y la mejora continua en la ejecución de programas y obras en beneficio de la ciudadanía.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
<b>Fin</b>	Contribuir al desarrollo de la infraestructura y equipamiento del Municipio de Irapuato, a través de la ejecución de obras de construcción, rehabilitación y modernización.	Porcentaje de obras y servicios, contratadas, en proceso y concluidas.	100%	43	85	Informes de Gobierno	Se cuenta con la colaboración institucional para integrar los expedientes técnicos de las obras, servicios y con los recursos necesarios.	Dirección General de Obras Públicas
<b>Propósito</b>	Los habitantes del municipio de Irapuato cuentan con infraestructura y equipamiento vial y edificación suficiente o en buen estado.	Porcentaje de obras y servicios, contratadas, en proceso y concluidas.	100%	43	85	Informes de Gobierno	Se cuenta con la colaboración institucional para integrar los expedientes técnicos de las obras, servicios y con los recursos necesarios.	Dirección General de Obras Públicas





Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
<b>C1</b>	Espacios públicos, contruidos, rehabilitados y modernizados.	Porcentaje de obras coordinadas para su contratación, ejecución y conclusión.	100%	43	98	Informe trimestral	El municipio solicita acciones de construcción, rehabilitación y modernización en su infraestructura vial y espacios públicos.	Dirección General de Obras Públicas
<b>C1A1</b>	Coordinación de la ejecución de la obra pública y servicios relacionados.	Porcentaje de obras y servicios, coordinadas para su contratación, ejecución y conclusión.	100%	43	85	Informe trimestral	La obra pública en el municipio de Irapuato se lleva a cabo de manera efectiva y eficiente.	Dirección General de Obras Públicas
<b>C2</b>	Proyectos ejecutivos en el rubro de la edificación elaborados	Porcentaje de proyectos de edificación autorizados.	100%	1	7	Informe trimestral	Las dependencias establecen con precisión los alcances y componentes de los proyectos.	Dirección de Edificación
<b>C2A1</b>	Elaboración de proyectos ejecutivos.	Porcentaje de proyectos elaborados.	100%	1	5	Informe trimestral	Las dependencias especifican las necesidades del proyecto.	Dirección de Edificación
<b>C2A2</b>	Coordinación de proyectos contratados.	Porcentaje de proyectos contratados.	100%	1	5	Informe trimestral	Se cuenta con los proyectos contratados.	Dirección de Edificación

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
<b>C3</b>	Obras de edificación en espacios públicos, ejecutadas.	Porcentaje de obras de edificación ejecutadas.	100%	9	28	Informe trimestral	Los contratistas cumplen con el calendario de ejecución de la obra.	Dirección de Edificación
<b>C3A1</b>	Coordinación de la ejecución de obras contratadas.	Porcentaje de obras contratadas.	100%	9	22	Informe trimestral	Se contratan las obras de rehabilitación y modernización de edificios y espacios públicos aprobados en el Programa de Obra Pública.	Dirección de Edificación
<b>C3A2</b>	Coordinación de la conclusión de las obras contratadas.	Porcentaje de obras concluidas.	100%	13	35	Informe trimestral	Se concluyen las obras de rehabilitación y modernización de edificios y espacios públicos aprobados en el Programa de Obra Pública.	Dirección de Edificación
<b>C4</b>	Obra pública y los servicios relacionados con la misma ejecutados.	Porcentaje de acciones contratadas.	100%	43	98	Informe trimestral	Se cuenta con los expedientes técnicos completos y validados y con asignación presupuestal.	Dirección de Administración de Obra
<b>C4A1</b>	Validación de los expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos validados.	100%	49	119	Informe trimestral	Se cuenta con la información completa y suficiente provista por las dependencias involucradas.	Dirección de Administración de Obra





Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
C4A2	Contratación de obras y servicios relacionados que cuenten con aprobación y asignación de recursos.	Porcentaje de obras y servicios contratados con recurso asignado.	100%	43	85	Informe trimestral	Se cuenta con los expedientes técnicos completos y validados y con asignación presupuestal.	Dirección de Administración de Obra
C5	Proyectos ejecutivos en el rubro de la infraestructura vial elaborados.	Porcentaje de proyectos de infraestructura vial autorizados.	100%	4	25	Informe trimestral	Los proyectos existentes son viables y traen beneficio a la infraestructura del Municipio.	Dirección de Infraestructura Vial
C5A1	Elaboración de proyectos ejecutivos.	Porcentaje de proyectos elaborados.	100%	4	22	Informe trimestral	Las dependencias especifican las necesidades del proyecto.	Dirección de Infraestructura Vial
C5A2	Coordinación de proyectos contratados.	Porcentaje de proyectos contratados.	100%	4	22	Informe trimestral	Se cuenta con los proyectos contratados.	Dirección de Infraestructura Vial
C6	Construcción, rehabilitación y modernización de obras de Infraestructura vial ejecutadas.	Porcentaje de obras de infraestructura vial ejecutadas.	100%	29	38	Informe trimestral	Los contratistas cumplen con el calendario de ejecución de la obra.	Dirección de Infraestructura Vial

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
C6A1	Coordinación de la ejecución de obras contratadas de construcción y/o rehabilitación de infraestructura vial.	Porcentaje de obras contratadas.	100%	29	36	Informe trimestral	Se ejecutan las obras de rehabilitación y modernización aprobadas en el Programa de Obra Pública.	Dirección de Infraestructura Vial
C6A2	Coordinación de la conclusión de las obras de construcción y/o rehabilitación de infraestructura vial.	Porcentaje de obras concluidas.	100%	5	30	Informe trimestral	Se concluyen las obras de rehabilitación y modernización aprobadas en el Programa de Obra Pública.	Dirección de Infraestructura Vial
C7	Presupuesto base Autorizado.	Porcentaje de presupuestos autorizados.	100%	162	487	Informe trimestral	Se cuenta con los catálogos de conceptos y demás insumos para su presupuestación.	Dirección de Costos
C7A1	Integración de los precios unitarios de los conceptos del catálogo de obra y/o servicio.	Porcentaje de conceptos de catálogos integrados.	100%	4316	8171	Informe Trimestral	Se cuenta con los precios de mercado.	Dirección de Costos
C7A2	Autorización del presupuesto base.	Porcentaje de presupuestos autorizados.	100%	162	407	Informe Trimestral	Se cuenta con el catálogo de conceptos del proyecto ejecutivo.	Dirección de Costos





Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	TOTAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable
C8	Conceptos fuera de catalogo autorizados.	Porcentaje de solicitudes de conceptos fuera de catálogo revisados y autorizados.	100%	37	254	Informe trimestral	Los conceptos fuera de catálogo cuentan con la revisión y autorización para el convenio.	Dirección de Costos
C8A1	Revisión de solicitudes de autorización de precios unitarios de los conceptos fuera de catálogo.	Porcentaje de solicitudes de conceptos fuera de catálogos autorizados.	100%	37	163	Informe Trimestral	Se cuenta con las cotizaciones y la determinación del precio unitario.	Dirección de Costos
C8A2	Autorización de conceptos fuera de catálogo.	Porcentaje de precios unitarios de conceptos fuera de catálogo revisados.	100%	515	1983	Informe Trimestral	Se lleva a cabo la conciliación y/o fijación de precios.	Dirección de Costos

Nota: Datos validados por la Dirección General de Programación y Desarrollo gubernamental.



## Transversalidad

La transversalidad representa un principio esencial de la gestión pública moderna, al fomentar la integración de esfuerzos entre dependencias y direcciones para alcanzar objetivos comunes. Este enfoque permite articular políticas, programas y proyectos desde una visión integral, evitando la duplicidad de acciones y potenciando el impacto social de cada intervención. En este apartado se destacan los resultados derivados de la coordinación interinstitucional, donde la suma de capacidades, recursos y estrategias ha permitido fortalecer la eficiencia gubernamental y responder con mayor efectividad a las necesidades de la población.

### EJE Ciudad Inteligente TU IRAPUATO (Feliz, Seguro y en Paz)

PE06. Consolidación del CAM (Centros de Atención Ciudadana)

PE06-AE01: Visión de atención y servicio "El Ciudadano en el Centro"

Con una inversión de **113 millones 60 mil 228 pesos**, se termina la construcción del Centro de Atención Municipal (CAM), la cual simboliza uno de los proyectos más integrales y trascendentes de la administración, al materializar la visión de un gobierno cercano, eficiente y moderno. Este espacio concentra en un solo punto la atención de los distintos servicios municipales, permitiendo una gestión más ágil, accesible y digna para la ciudadanía. Su edificación responde a una planeación estratégica que articula infraestructura, innovación y servicio público, fortaleciendo la transversalidad institucional al integrar los esfuerzos de diversas áreas en torno a un mismo objetivo: mejorar la experiencia de atención y promover una relación más directa y humana entre el gobierno y los ciudadanos.

PE06-AE01: Visión de atención y servicio "El Ciudadano en el Centro"			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción del <b>Centro de Atención Municipal (CAM)</b> , en Irapuato, Gto.	\$111,515,932.82	100
2	Supervisión Externa para la <b>Construcción del Centro de Atención Municipal</b> en Irapuato, Gto.	\$1,544,295.94	100


**Rol:** Colaborador

**Responsable:** Dirección General de Tecnologías de la Información e Innovación y Dirección General de programación y Desarrollo Gubernamental





PE06-AE01: Visión de atención y servicio "El Ciudadano en el Centro"



CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM).



CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM).



PE17. Fortalecer las acciones en materia de protección civil

PE17- AE01- Prevención y respuesta ante las emergencias y desastres

Con una inversión de **1 millón 54 mil 801 pesos**, se llevaron a cabo acciones orientadas a prevenir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad en zonas vulnerables, entre ellas destaca la limpieza y desazolve del río Guanajuato, en el tramo comprendido entre la calle Teresa Vara y el puente del fraccionamiento Floresta, labor que contribuye a garantizar el flujo adecuado del cauce y reducir posibles afectaciones por acumulación de sedimentos.

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Trabajos de limpieza y desazolve del río Guanajuato con máquina en su <b>tramo de calle Teresa Vara a 100 mts aguas abajo del puente de residencial Floresta.</b>	\$813,204.08	100
2	Construcción de alcantarilla pluvial en la <b>Calle Manzano de la Comunidad el Copal</b> , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$241,597.80	100

Rol: Colaborador

Responsable: Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal





PE17- AE01- Prevención y respuesta ante las emergencias



TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO GUANAJUATO CON MÁQUINA EN SU TRAMO DE CALLE TERESA VARA A 100 MTS AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE RESIDENCIAL FLORESTA.



CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE MANZANO DE LA COMUNIDAD EL COPAL.



## EJE A. TU Familia con Valores (Próspera, Unida y Responsable)

PE47. CONVIVE Centros de Fortalecimiento Familiar

PE47-AE02-Adquirir habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo personal

Con el objetivo de promover la convivencia, la participación ciudadana y el desarrollo social se encuentran en ejecución acciones enfocadas en la rehabilitación y fortalecimiento de espacios comunitarios y culturales con una inversión total de **9 millones 035 mil 760 pesos**, con obras como la rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia 18 de Agosto, espacio destinado a actividades de capacitación, atención social y recreación para las familias; la obra complementaria en el Centro Nuevo Comienzo Benito Juárez, que refuerza la atención integral a grupos vulnerables, intervenciones que fortalecen el tejido social y contribuyen a una ciudad más incluyente, participativa y con oportunidades para todos.

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Rehabilitación del <b>Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia 18 de Agosto</b> , en Irapuato, Gto.	\$6,879,326.50	19
2	Obra complementaria en <b>centro nuevo comienzo Benito Juárez</b> , Irapuato, Gto.	\$1,796,441.83	30
3	Rehabilitación de <b>centro cultural, en la col. 1ro de Mayo</b> , en Irapuato, Gto.	\$359,992.22	90

**Rol:** Colaborador

**Responsable:** Dirección General de Desarrollo Social y Humano/ Secretaría Particular





PE47-AE02-Adquirir habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo personal



REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA 18 DE AGOSTO.



OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO NUEVO COMIENZO BENITO JUÁREZ.



REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, EN LA COL. 1RO DE MAYO.



## EJE R. TU Entorno Renovado (Funcional, Atractivo y Sostenible)

PE65.-Acceso a servicios básicos y Gestión de recursos hídricos Rurales

PE65-AE03- Gestión sostenible de recursos hídricos y mejora de la infraestructura para el uso agrícola y ganadero

Con una inversión de **2 millones 495 mil 779 pesos**, se impulsaron acciones orientadas a la construcción, rehabilitación, desazolve y ampliación de obras de bordería en diversas comunidades rurales del municipio. Estos trabajos tienen como propósito optimizar la captación y aprovechamiento del agua pluvial para actividades productivas y de riego, beneficiando directamente a las familias del campo y contribuyendo al desarrollo equilibrado entre las zonas urbanas y rurales del municipio.

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción, rehabilitación, desazolve y ampliación de <b>obras de Bordería en diversas comunidades</b> del municipio de Irapuato, Gto.	\$2,495,779.50	22

**Rol:** Colaborador

**Responsable:** Desarrollo Rural

PE65-AE03- Gestión sostenible de recursos hídricos y mejora de la infraestructura para el uso agrícola y ganadero



CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, DESAZOLVE Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE BORDERÍA EN DIVERSAS COMUNIDADES.





### Acciones no encuadradas en el P.G.M.

Con una inversión total de **362 mil 95 pesos**, se concluyen dos acciones que fortalecen las áreas operativas y administrativas de la infraestructura pública, permitiendo un entorno más eficiente y adecuado para el desempeño del personal, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de andador para comunicar a la <b>dirección de parques y jardines e imagen urbana del complejo Siglo XXI</b> , en Irapuato, Gto.	\$362,095.88	100



CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA COMUNICAR A LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES E IMAGEN URBANA DEL COMPLEJO SIGLO XXI.



## Glosario

CAM	Centro de Atención Municipal
COPLADEMI	Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Irapuato
DGDSYH	Dirección General de Desarrollo Social y Humano
MIR	Matriz de Indicadores para Resultados
PGM	Programa de Gobierno Municipal
