

# INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2026

A handwritten signature or mark in blue ink, located at the bottom center of the page.

Contenido

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL .....</b>	<b>7</b>
<b>ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL A MARZO .....</b>	<b>7</b>
<b>MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.....</b>	<b>7</b>
<b>CIERRE DE RAMO 33 2025 .....</b>	<b>8</b>
<b>ESTATUS DE RAMO 33 2026 .....</b>	<b>9</b>
<b>AVANCES, ACCIONES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELEVANTES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL .....</b>	<b>10</b>
<b>EJE CIUDAD INTELIGENTE TU IRAPUATO (FELIZ, SEGURO Y EN PAZ) .....</b>	<b>10</b>
<b>PE03. PATRIMONIO HISTÓRICO.....</b>	<b>10</b>
<b>PE03-AE09- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DEL CENTRO HISTÓRICO .....</b>	<b>10</b>
<b>PE10. COMPLEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA.....</b>	<b>12</b>
<b>PE10-AE01- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.....</b>	<b>12</b>
<b>EJE A. TU FAMILIA CON VALORES (PRÓSPERA, UNIDA Y RESPONSABLE).....</b>	<b>16</b>
<b>PE39. CENTRO DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD .....</b>	<b>16</b>
<b>PE39-AE01- CREACIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....</b>	<b>16</b>
<b>EJE R. TU ENTORNO RENOVADO (FUNCIONAL, ATRACTIVO Y SOSTENIBLE).....</b>	<b>17</b>
<b>PE56. SERVICIOS PÚBLICOS .....</b>	<b>17</b>
<b>PE56-AE01-. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.....</b>	<b>17</b>
<b>PE58. IMAGEN URBANA .....</b>	<b>27</b>
<b>PE58-AE02-. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS .....</b>	<b>27</b>
<b>PE58-AE04-. ARTE URBANO.....</b>	<b>29</b>
<b>PE59. INFRAESTRUCTURA .....</b>	<b>32</b>
<b>PE59-AE02-. CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL .....</b>	<b>32</b>
<b>PE59-AE03-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES Y AVENIDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO .....</b>	<b>40</b>
<b>PE59-AE04-CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL MUNICIPAL. ....</b>	<b>44</b>
<b>PE61. SISTEMA DE PARQUES .....</b>	<b>46</b>
<b>PE61-AE02-. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, CONSERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PARQUES VECINALES .....</b>	<b>46</b>
<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2026 .....</b>	<b>51</b>
<b>TRANSVERSALIDAD.....</b>	<b>56</b>
<b>EJE A. TU FAMILIA CON VALORES (PRÓSPERA, UNIDA Y RESPONSABLE).....</b>	<b>56</b>
<b>PE 47. CONVIVE CENTROS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR .....</b>	<b>56</b>
<b>PE 47-AE02-ADQUIRIR HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO PERSONAL.....</b>	<b>56</b>
<b>EJE R. TU ENTORNO RENOVADO (FUNCIONAL, ATRACTIVO Y SOSTENIBLE).....</b>	<b>58</b>
<b>PE54. VIVIENDA .....</b>	<b>58</b>
<b>PE54-AE09- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. ....</b>	<b>58</b>
<b>ACCIONES NO ENCUADRADAS EN EL P.G.M.....</b>	<b>62</b>
<b>GLOSARIO .....</b>	<b>63</b>

## Introducción

La **Dirección General de Obras Públicas**, en apego a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato, tiene como función principal participar en la planeación, programación, presupuestación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma vigilando su cumplimiento de conformidad con las disposiciones contenidas en la normatividad y legislación aplicable en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su respectivo reglamento. De conformidad con el artículo 148 determina su estructura organizativa, conformada por las **Direcciones de Edificación, Administración de Obra, Infraestructura Vial, Derecho de Vía y Asuntos Jurídicos y Costos**.



## Dirección de Administración

- Coordinar con las dependencias promotoras que las acciones a contratar, sean acordes con los fines y alcances del Programa Municipal de Obra y del Programa de Inversión, funciones y trabajos propios del cargo.
- Elaborar e integrar los expedientes técnicos para su validación inicial y final, ante las dependencias correspondientes, dar seguimiento a los convenios y lineamientos establecidos con las diferentes instancias gubernamentales, para la obra pública y servicios relacionados con la misma.
- Llevar a cabo el registro, control, seguimiento, organización, captura, funcionamiento y resguardo del archivo de trámite y de concentración de la Dirección General de Obras Públicas.

## Dirección de edificación

- Se encarga de la integración de los estudios y proyectos relacionados con la obra pública municipal, en el rubro de edificación, así como la coordinación de los mismos, ya sea directamente o por conducto de terceros.
- Administrar, resguardar la documentación que integra el banco de proyectos ejecutivos en el rubro de Edificación.
- Supervisar por sí o por medio de terceros, que la obra pública municipal en el rubro de Edificación contratada se ejecute en los términos de la normatividad aplicable en la materia, del expediente técnico y del contrato respectivo entre otros.

## Dirección de Infraestructura Vial


- Se encarga de la integración de los estudios y proyectos relacionados con la obra pública municipal, en el rubro de Infraestructura vial, así como la coordinación de los mismos, ya sea directamente o por conducto de terceros.
- Administrar, resguardar la documentación que integra el banco de proyectos ejecutivos en el rubro de Infraestructura Vial.
- Supervisar por sí o por medio de terceros, que la obra pública municipal en el rubro de Infraestructura vial contratada se ejecute en los términos de la normatividad aplicable en la materia, del expediente técnico y del contrato respectivo entre otros.

### Dirección de Derecho de Vía y Asuntos Jurídicos

- Llevar a cabo y supervisar por si o por medio de terceros la Liberación del Derecho de Vía, para la ejecución de obra pública que se encuentre dentro Programa Municipal de Obra Pública.
- Fungir como Enlace y coadyuvar ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en los asuntos de naturaleza judicial en los que la Dirección General o sus Direcciones de Area sean parte.
- Dar seguimiento en todas sus etapas a las auditorías que practiquen los distintos órganos fiscalizadores en sus tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

### Dirección de Costos

- Elaborar y mantener actualizado un mercadeo regional de costos de los insumos necesarios para la construcción de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma.
- Coordinar, supervisar y autorizar la elaboración de los presupuestos base que forman parte integral de los expedientes técnicos en materia de obra pública y/o servicios relacionados con la misma.
- Elaborar los presupuestos solicitados por las Dependencias, así como los solicitados por la Dirección de Edificación e Infraestructura Vial y vigilar que sean económicamente viables.



En el presente trimestre, se concretó **la primera etapa para la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana**, mediante una **inversión de 248 millones 665 mil 155 pesos**, este avance representa un logro significativo en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, al dotar de espacios modernos, funcionales y adecuados para el desarrollo de sus actividades. La conclusión de esta etapa permite mejorar la operatividad, optimizar la coordinación entre áreas y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía, sentando bases sólidas para consolidar un sistema de seguridad más confiable y cercano a la población.

En colaboración con Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo (SENCO) y con una inversión de **130 millones 110 mil 794 pesos** se concluye la construcción y modernización de 10 calles en distintas colonias y comunidades, encontrándose 1 obra en proceso de ejecución. Lo anterior con la visión de que nadie se quede atrás y focalizando localidades de alto rezago social, con lo que se incrementara la infraestructura y movilidad en nuestro Municipio, facilitando el tránsito, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo la integración territorial.

Por otra parte, se llevaron a cabo 28 acciones orientadas a ampliar la cobertura de servicios básicos, particularmente en materia de electrificación y alumbrado público, mediante una **inversión de 17 millones 847 mil 205 pesos**, que permitió la ejecución de estas obras en colonias y comunidades con rezago en infraestructura, como parte de estos trabajos, se llevó a cabo la instalación de **188 postes, 20 torres metálicas, 178 luminarias led, 33 transformadores** y la habilitación de **292 tomas domiciliarias**, lo que se traduce en espacios mejor iluminados y viviendas con acceso a energía eléctrica, fortaleciendo así las condiciones de habitabilidad y el desarrollo de las comunidades.

Los resultados alcanzados reflejan de manera contundente el compromiso de la administración con la ejecución efectiva de la obra pública, al lograr la **terminación de 64 obras** con una **inversión de 437 millones 721 mil 190 pesos**, así como la continuidad de **7 obras en proceso** que representan **95 millones 381 mil 949 pesos**, más allá de las cifras, cada obra representa una transformación tangible en el entorno y en las oportunidades de las personas. Cada acción concluida se traduce en beneficios concretos: mejor movilidad, mayor seguridad, acceso a servicios básicos y espacios públicos más dignos y funcionales.

**ATENTAMENTE**



**Ing. Manuel Venegas Pérez**  
**Director General de Obras Públicas**

## Estado del avance presupuestal

### Estado del avance presupuestal a marzo.

Unidad Responsable	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por ejercer	% de ejecución
Dirección General de Obras Públicas	\$10,108,564.61	\$62,965,301.63	\$16,664,351.01	\$9,601,297.29	\$36,699,653.33	15
Dirección de Edificación	\$155,159,161.26	\$178,288,682.42	\$2,934,844.59	\$32,913,150.27	\$142,440,687.56	18
Dirección de Administración de Obra	\$8,165,614.64	\$21,938,502.85	\$320,475.10	\$14,996,874.72	\$6,621,153.03	68
Dirección de Infraestructura Vial	\$10,218,261.51	\$181,635,148.06	\$72,788,657.72	\$95,966,437.33	\$12,880,053.01	53
Dirección de Costos	\$3,664,632.41	\$3,664,632.41	\$106,700.95	\$709,384.72	\$2,848,546.74	19
<b>Total</b>	<b>\$187,316,234.43</b>	<b>\$448,492,267.37</b>	<b>\$92,815,029.37</b>	<b>\$154,187,144.33</b>	<b>\$201,490,093.67</b>	<b>34</b>

### Modificaciones Presupuestales

Presupuesto Aprobado 2026	1ª. Modificación Presupuestal
<b>\$187,316,234.43</b>	<b>\$448,492,267.37</b>



## Cierre de ramo 33 2025

FONDO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	NOMBRE, DESCRIPCIÓN O TIPO DE LA OBRA DE LA ACCIÓN	APROBADO	ZDA. MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	EJERCIDO	% DE EJECUCIÓN
<b>COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>							
FORTAMUN	DGOP	OBRAS DE EDIFICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,000,000.00	\$2,959,695.31	\$0.00	\$2,959,695.31	100
FORTAMUN	DGOP	TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO	\$0.00	\$2,540,337.27	\$0.00	\$2,540,337.27	100
FORTAMUN	DGOP	CONTRATACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	\$0.00	\$11,220,201.97	\$0.00	\$11,220,201.97	100
FORTAMUN	DGOP	PAGO DE DERECHO DE VIA	\$0.00	\$10,753,439.09	\$0.00	\$10,753,439.09	100
FORTAMUN	DGOP	RESTITUCIÓN DE FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DERIVADAS DE LA LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA	\$0.00	\$3,323,714.60	\$0.00	\$3,323,714.60	100
FORTAMUN	DGOP	OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PROPIEDAD MUNICIPAL	\$13,089,432.44	\$12,289,432.44	\$0.00	\$12,282,204.32	99.94
<b>COMISION DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES</b>							
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>							
FAISMUN	DGOP	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA MANCHA URBANA Y RURAL	\$79,888,790.61	\$89,670,227.05	\$0.00	\$89,262,589.88	99.55
FORTAMUN	DGOP	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA MANCHA URBANA Y RURAL	\$0.00	\$14,247,343.36	\$0.00	\$14,247,343.36	100
FAISMUN	DGOP	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE VALENCIANITA, EN IRAPUATO, GTO.	\$0.00	\$14,061,453.24	\$0.00	\$13,630,843.91	96.94
FAISMUN	DGOP	URBANIZACIÓN DE CAMINOS RURALES/ PLAZA PUBLICAS	\$16,885,120.83	\$2,977,247.20	\$0.00	\$2,977,247.20	100
			<b>\$139,863,343.88</b>	<b>\$164,043,091.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,197,616.91</b>	<b>99.48</b>



### Estatus de ramo 33 2026

FONDO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	NOMBRE, DESCRIPCIÓN O TIPO DE LA OBRA DE LA ACCIÓN	APROBADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	% DE EJECUCIÓN
<b>COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>						
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>						
FAISMUN	DGOP	OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PROPIEDAD MUNICIPAL	\$85,330,767.62	\$0.00	\$0.00	0.00%
<b>COMISION DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES</b>						
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>						
FAISMUN	DGOP	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA MANCHA URBANA Y RURAL	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
			<b>\$135,330,767.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>

NOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, FUERON PUBLICADOS A FINALES DEL MES DE FEBRERO Y EL ACCESO AL SISTEMA FUE HABILITADO A FINALES DEL MES DE MARZO.



## Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal

### EJE Ciudad Inteligente TU IRAPUATO (Feliz, Seguro y en Paz)

#### PE03. Patrimonio Histórico

#### PE03-AE09- Programa de Conservación rutinaria del Centro Histórico

Durante el primer trimestre del presente ejercicio, impulsamos acciones estratégicas orientadas a la conservación, rehabilitación y planeación de espacios públicos, en el Centro Histórico, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana, la movilidad peatonal y la convivencia social. En este periodo se registran 2 obras terminadas y 1 proyecto concluido, con una inversión de **6 millones 117 mil 555 pesos**, lo que nos permite contar con espacios más seguros, accesibles y funcionales para la ciudadanía. De manera complementaria, el desarrollo del proyecto ejecutivo para la intervención de áreas anexas y el atrio del templo de Santiaguito fortalece la planeación urbana y sienta las bases para futuras acciones con alto valor social. En conjunto, estas acciones responden a la necesidad de preservar espacios emblemáticos, incentivar la actividad económica y turística, y consolidar entornos dignos que favorezcan el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

PE03-AE09- Programa de Conservación rutinaria del Centro Histórico			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Conservación rutinaria y mejoramiento de infraestructura y equipamiento del <b>Centro Histórico</b> en Irapuato, Gto.	\$3,497,858.14	100
2	Rehabilitación de <b>andadores urbanos Berriozábal, Juan Álvarez y Francisco Javier Mina</b> , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$1,831,131.31	100
3	Proyecto ejecutivo para la intervención a <b>áreas anexas y atrio del templo de Santiaguito (escuela diocesana)</b> , en Irapuato, Gto.	\$788,565.65	100

**PE03-AE09- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DEL CENTRO HISTÓRICO**

Conservación rutinaria y mejoramiento de infraestructura y equipamiento del Centro Histórico.



Proyecto ejecutivo para la intervención a áreas anexas y atrio del templo de Santiaguito (escuela diocesana).



## PE10. Complejo de Seguridad Ciudadana

### PE10-AE01- Fortalecer la Infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

En este periodo se registraron 3 acciones concluidas en materia de seguridad pública, con una inversión total de **248 millones 665 mil 155 pesos**. Consolidándose la primera etapa para la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana, y de manera complementaria, el desarrollo del proyecto ejecutivo para la terminación de este complejo que nos permite asegurar la continuidad ordenada de la infraestructura. Estas acciones responden a la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad desde su base operativa, brindando espacios adecuados, dignos y funcionales para su desempeño, lo que se traduce en una atención más eficiente y profesional, mejorar la coordinación entre áreas estratégicas y fortalecer la prevención del delito, impactando directamente en la tranquilidad, el bienestar social y la percepción de seguridad de los irapuatenses.

PE10-AE01- Fortalecer la Infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Primera etapa para la construcción del <b>Complejo de Seguridad Ciudadana</b> , en Irapuato, Gto.	\$241,985,707.39	100
2	Supervisión externa para la construcción del <b>complejo de Seguridad Ciudadana (primera etapa)</b> , en Irapuato, Gto.	\$3,679,517.69	100
3	Proyecto ejecutivo para la terminación del <b>Complejo de Seguridad Ciudadana</b> , en Irapuato, Gto.	\$2,999,929.99	100


**PE10-AE01- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Primera etapa para la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana.



PE10-AE01- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Primera etapa para la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana.

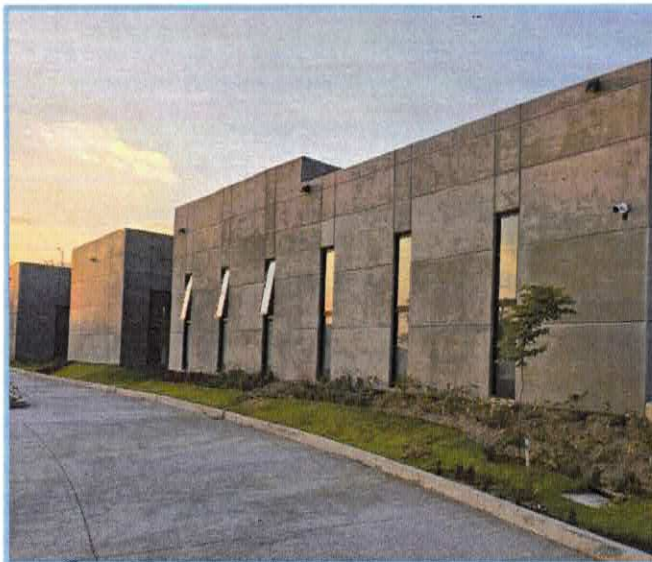

**PE10-AE01- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Proyecto ejecutivo para la terminación del Complejo de Seguridad Ciudadana.



**EJE A. TU Familia con Valores (Próspera, Unida y Responsable)**

**PE39. Centro de inclusión para las personas con discapacidad**

**PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad**

En este trimestre se registra el término del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Inclusión Social "Sin Límites" y la Unidad de Rehabilitación en la nave 1 del DIF Municipal, con una inversión de **668 mil 31 pesos**, el cual establece las bases técnicas, funcionales y operativas para el desarrollo de un espacio digno y accesible, respondiendo a la necesidad de atención a personas de sectores vulnerables, promoviendo la inclusión, la equidad y el acceso a servicios de rehabilitación. Asimismo, permitirá fortalecer la infraestructura social del municipio, contribuyendo al bienestar físico, emocional y social de los beneficiarios, así como de sus familias, y consolidando un entorno más justo e incluyente para la población.

PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Proyecto ejecutivo para la construcción del <b>centro de inclusión social "sin límites" y unidad de rehabilitación, en la nave 1 del DIF municipal, en Irapuato, Gto</b>	\$668,031.65	100

**PE39-AE01- Creación del Centro de Inclusión para las Personas con discapacidad**

Proyecto ejecutivo para la construcción del centro de inclusión social "sin límites" y unidad de rehabilitación, en la nave 1 del DIF municipal.




## EJE R. TU Entorno Renovado (Funcional, Atractivo y Sostenible)

### PE56. Servicios Públicos

#### PE56-AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público.

Fortalecimos la infraestructura básica en comunidades y colonias mediante acciones orientadas a ampliar la cobertura de servicios de electrificación y mejorar el alumbrado público, contribuyendo a reducir brechas de desigualdad y elevar las condiciones de bienestar de la población. En este periodo se registraron 28 obras terminadas, con un monto de **17 millones 847 mil 205 pesos**, se llevó a cabo la instalación de **188 postes, 20 torres metálicas, 178 luminarias led, 33 transformadores** y la habilitación de **292 tomas domiciliarias**, lo que se traduce en espacios mejor iluminados y viviendas con acceso a energía eléctrica, fortaleciendo así las condiciones de habitabilidad y el desarrollo de las comunidades.

PE56. Servicios Públicos			
PE56-AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de alumbrado público en el municipio de Irapuato, Gto. en el <b>camino San Javier a Cuchicuato, en su tramo; km 5+616 a calle Independencia (Cuchicuato)</b>	\$649,084.36	100
2	Construcción de alumbrado público en el municipio de Irapuato, Gto. en el inicio del <b>camino a la localidad de Ojo de agua de Bermúdez.</b>	\$426,467.30	100
3	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la localidad Irapuato, en las <b>calles Privadas Sin Nombre, camino a Vista Alegre.</b>	\$1,385,127.17	100
4	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad el Carrizalito, en la calle Rubí.</b>	\$1,352,070.24	100

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
5	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Irapuato. en las calles Ejército Nacional, Puesta del sol y López Mateos.</b>	\$1,292,815.32	100
6	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la <b>localidad san Vicente en la calle Prolongación Emiliano Zapata 2</b>	\$1,047,657.33	100
7	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la localidad <b>San Cristóbal en la calle Prolongación Altamirano.</b>	\$843,697.71	100
8	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad la Calera, en calles Privada sin nombre y Av. las Torres.</b>	\$731,504.99	100
9	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Santa Elena de la cruz, en la calle 12 de diciembre.</b>	\$667,914.24	100
10	Ampliación de red de Electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad la Luz del Día (ejido de la Sonaja), en las calles Pitolacas, privada Sin Nombre y privada Naranja.</b>	\$640,765.66	100

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
11	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la <b>colonia Villa Real, en la calle Villa de Coria, (tramo: de calle Villa del Rosal a calle del Bosque).</b>	\$623,588.45	100
12	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la <b>localidad San Luis de Janamo (el morado) en la Avenida primavera en el tramo de calle Lázaro Cárdenas al fondo.</b>	\$617,859.11	100
13	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Aldama, calle Tacubaya.</b>	\$608,830.00	100
14	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la <b>colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Felipe Ángeles, (tramo: de Manuel Ávila Camacho a calle Mariano Patlán).</b>	\$604,750.98	100
15	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad el Barrial, calle Santiago.</b>	\$594,946.03	100
16	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad San Cristóbal, en la calle las Palmas.</b>	\$593,731.26	100
17	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Aldama, en la calle privada San Isidro, (tramo: circuito san pascual al fondo de la privada).</b>	\$569,536.53	100

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
18	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Santa Elena de la Cruz, en la calle Santa Cecilia.</b>	\$558,474.87	100
19	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad San Cristóbal, en la calle Privada Paraíso.</b>	\$520,011.71	100
20	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>comunidad Ejido de Malvas (la Argolla), en la calle Emiliano Zapata, tramo Allende a camino Real.</b>	\$488,801.99	100
21	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la <b>colonia Villa Real, en la calle del Río, (tramo: de Ignacio García Téllez a calle Villa de las estrellas).</b>	\$479,433.14	100
22	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad la Calera, calle Conín.</b>	\$448,260.88	100
23	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la <b>localidad el Carmen, en la calle privada San Pedro.</b>	\$447,351.36	100


No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
24	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Nueva Colonia Purísima, en la calle la Paz.</b>	\$438,333.49	100
25	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la <b>localidad de Tierras Negras, calle Benito Juárez.</b>	\$396,115.94	100
26	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad San Cristóbal, en la calle Girasoles.</b>	\$378,244.00	100
27	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Cuchicuato, en la calle Ignacio Allende.</b>	\$346,137.94	100
28	Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto. en la <b>localidad Ex-hacienda de Buena Vista (el Gabazo) en la calle Miguel Hidalgo y Costilla.</b>	\$95,693.82	100

**PE56-AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público**

Construcción de alumbrado público en el camino San Javier a Cuchicuato.





Construcción de alumbrado público en el inicio del camino a la localidad de Ojo de agua de Bermúdez.

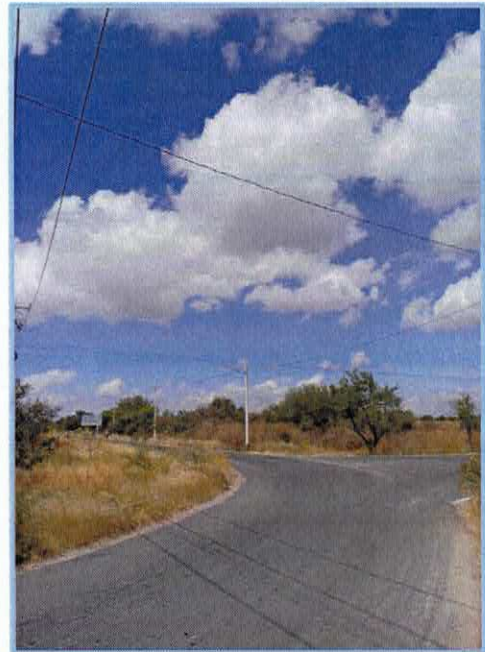

Ampliación de red de electrificación en las calles Privadas Sin Nombre, camino a Vista Alegre.

Ampliación de red de electrificación en la localidad el Carrizalito, en la calle Rubí.

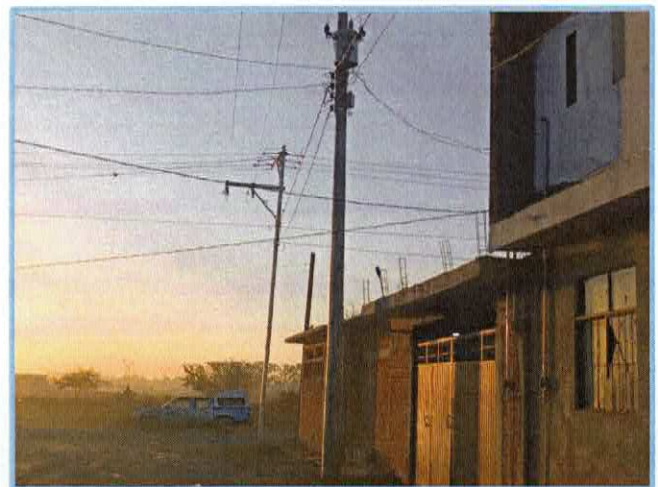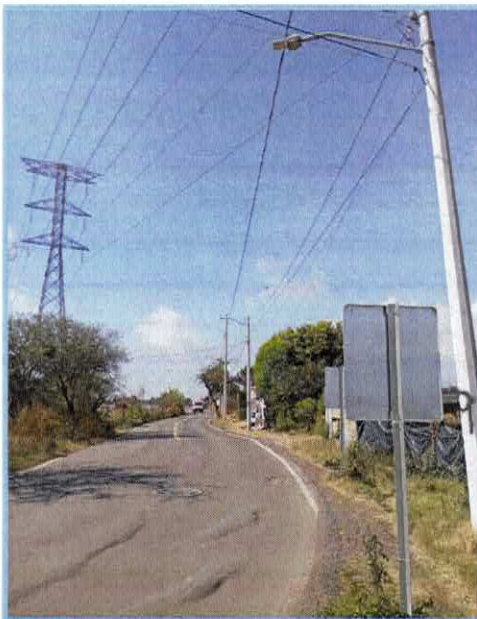


**AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público**

Ampliación de red de electrificación en la localidad san Vicente en la calle Prolongación Emiliano Zapata 2.




Ampliación de red de electrificación en la localidad San Cristóbal en la calle Prolongación Altamirano.

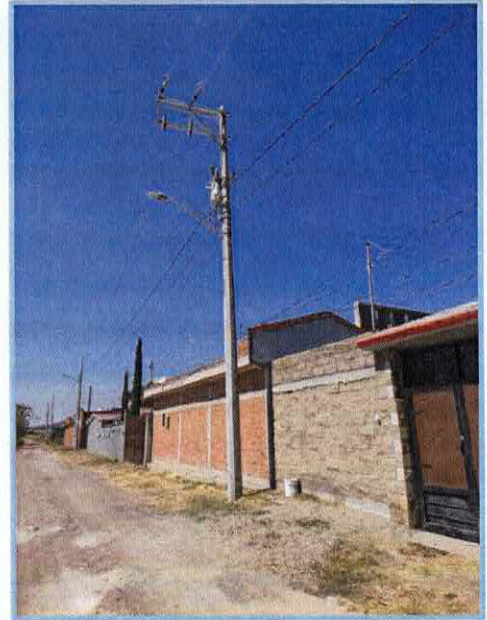

Ampliación de red de electrificación en la localidad la Calera, en calles Privada sin nombre y Av. las Torres.



Ampliación de red de electrificación en la localidad Santa Elena de la cruz, en la calle 12 de diciembre.

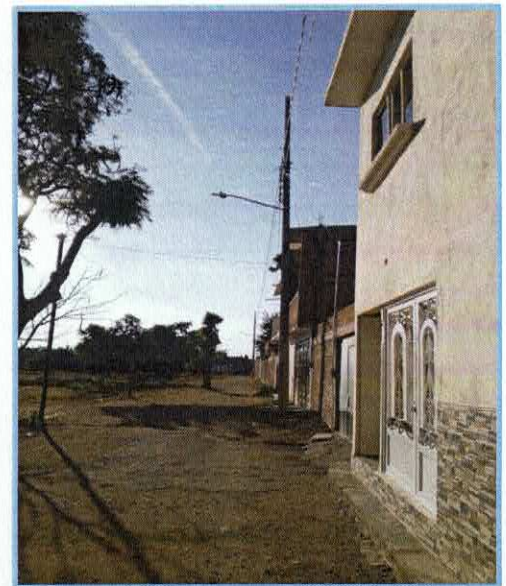


**AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público**

Ampliación de red de Electrificación en la localidad la Luz del Día (ejido de la Sonaja), en las calles Pitolacas, privada Sin Nombre y privada Naranja.



Ampliación de red de electrificación en la localidad San Luis de Janamo (el morado) en la Avenida primavera en el tramo de calle Lázaro Cárdenas al fondo.

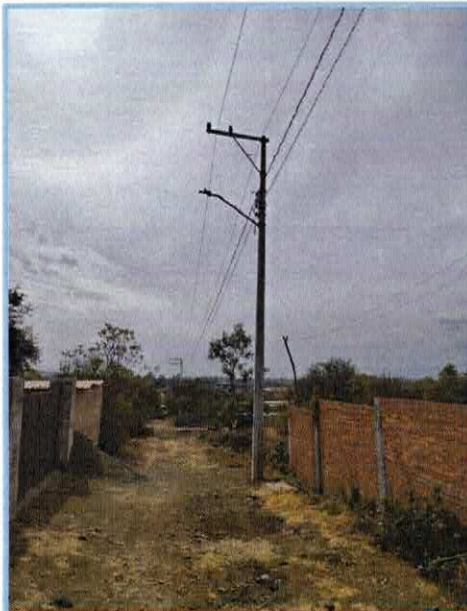


Primer Informe Trimestral  
Enero-Marzo 2026 DGOP

Ampliación de red de electrificación en la colonia Villa Real, en la calle Villa de Coria, (tramo: de calle Villa del Rosal a calle del Bosque).



Ampliación de red de electrificación en la localidad Irapuato, en la colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Felipe Ángeles, (tramo: de Manuel Ávila Camacho a calle Mariano Patlán).

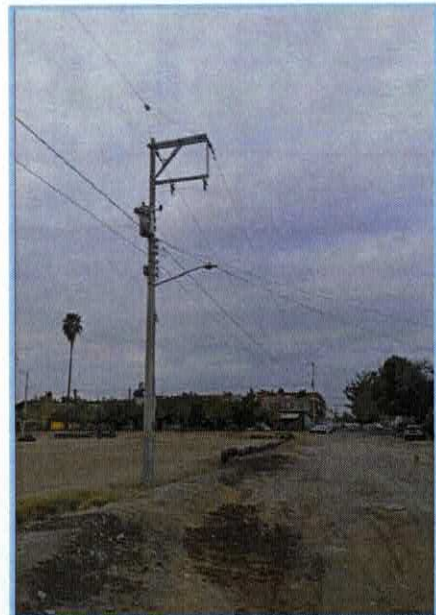

**AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público**


Ampliación de red de electrificación en la localidad San Cristóbal, en la calle las Palmas.




Ampliación de red de electrificación en la localidad Aldama, en la calle privada San Isidro, (tramo: circuito san pascual al fondo de la privada).



Ampliación de red de electrificación en la localidad Aldama, calle Tacubaya.

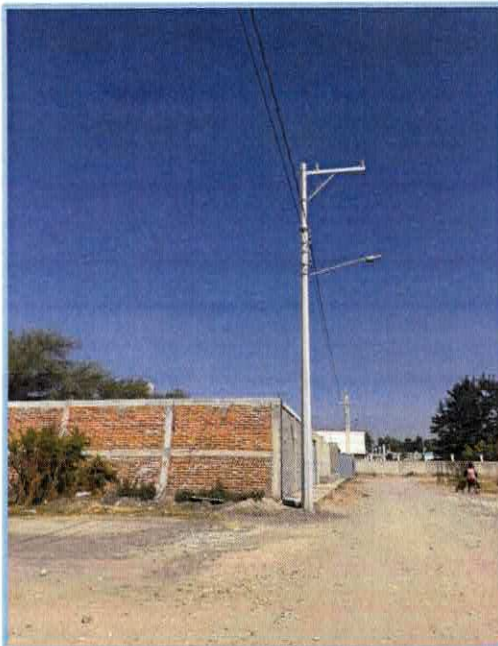


Ampliación de red de electrificación localidad Santa Elena de la Cruz, en la calle Santa Cecilia.

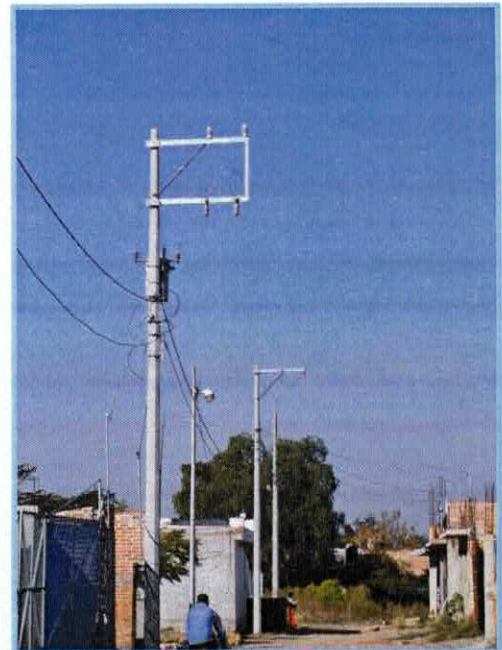


**AE01-. Programa de mejoramiento de electrificación y alumbrado público**


Ampliación de red de electrificación en la localidad el Barrial, calle Santiago.

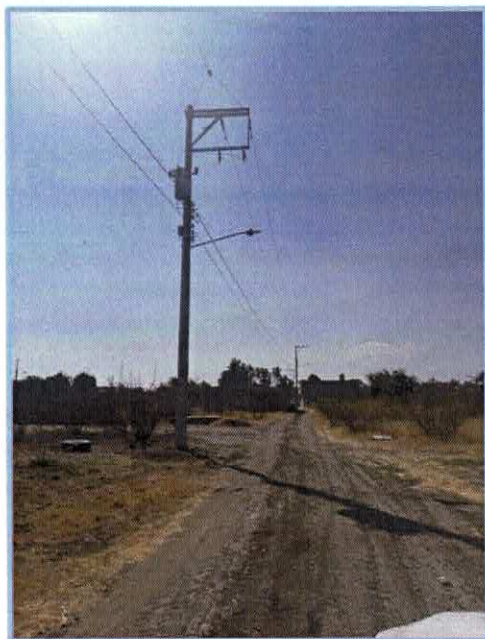

Ampliación de red de electrificación localidad San Cristóbal, en la calle Privada Paraíso.

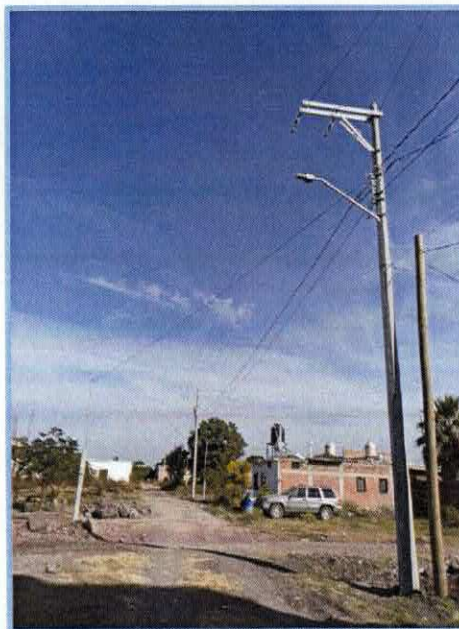

Ampliación de red de electrificación en la colonia Villa Real, en la calle del Río, (tramo: de Ignacio García Téllez a calle Villa de las estrellas).

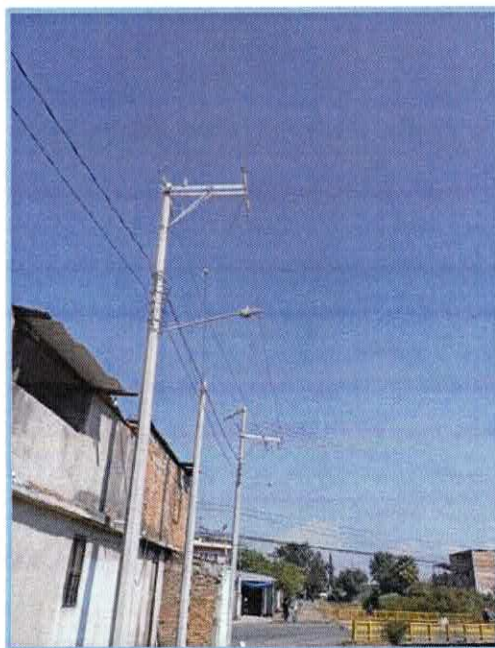

Ampliación de red de electrificación en la localidad el Carmen, en la calle privada San Pedro.



## PE58. Imagen Urbana

### PE58-AE02-. Recuperación de espacios públicos

Como parte de las acciones enfocadas en el rescate de espacios públicos y el fortalecimiento de los elementos que dan identidad a nuestra ciudad, durante este trimestre se registra 1 obra terminada y 1 obra en proceso, con una inversión de **2 millones 125 mil 315 pesos**. Estas acciones contribuyen a la recuperación y dignificación del espacio público, promoviendo el sentido de pertenencia, el orgullo por las tradiciones y la identidad local, asimismo, generan entornos más atractivos y funcionales que favorecen la convivencia social, impulsan la actividad turística y económica, y consolidan espacios representativos que fortalecen la proyección cultural del municipio en beneficio de la ciudadanía.


PE58-AE02-. Recuperación de espacios públicos			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de plazoleta para la colocación del <b>monumento a la charrería</b> y trabajos complementarios, en Irapuato, Gto.	\$1,187,059.63	100
2	Construcción de <b>escultura alusiva a la fresa</b> y obras complementarias en pastilla ubicada en <b>calle Paseo de las Fresas esquina con av. Guerrero</b> , en Irapuato, Gto.	\$938,255.63	75

**PE58-AE02-. Recuperación de espacios públicos**

Construcción de plazoleta para la colocación del monumento a la charrería y trabajos complementarios.



Construcción de escultura alusiva a la fresa y obras complementarias en pastilla ubicada en calle Paseo de las Fresas esquina con av. Guerrero.

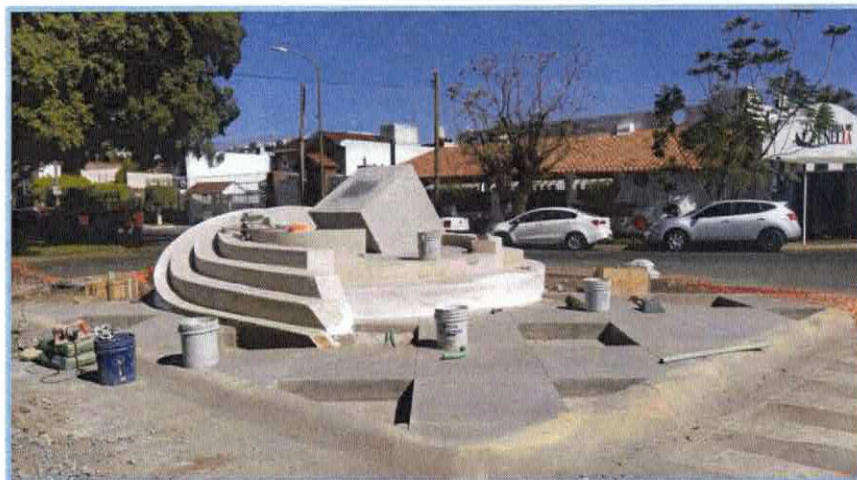

### PE58-AE04-. Arte Urbano

En continuidad con las acciones de mejoramiento urbano y mantenimiento de la infraestructura pública, se llevaron a cabo intervenciones enfocadas en la conservación de espacios verdes y la rehabilitación de elementos urbanos en vialidades estratégicas. En este periodo se registran 2 obras terminadas y 1 obra en proceso, con una inversión total de **18 millones 665 mil 133 pesos**, acciones que responden a la necesidad de conservar en óptimas condiciones la imagen urbana y los espacios públicos, contribuyendo a generar entornos más ordenados, seguros y agradables para la ciudadanía. Asimismo, favorecen la movilidad, fortalecen el uso y apropiación del espacio público y mejoran la percepción urbana, impactando positivamente en la calidad de vida de nuestras familias.



PE58-AE04-. Arte Urbano			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Mantenimiento de <b>áreas verdes, camellones y espacios públicos en vialidades principales</b> , en Irapuato, Guanajuato. <b>2da. etapa.</b>	\$1,392,654.87	100
2	Trabajos de restitución de barda, banqueta y obras complementarias en <b>esq. de Av. Reforma y calle Rodolfo Gaona</b> , en Irapuato, Gto.	\$283,011.30	100
3	Intervención integral de <b>paisajismo urbano en el Blvd. solidaridad de la calle Benito Juárez a puente de autopista</b> , en Irapuato, Gto.	\$16,989,466.92	37

PE58-AE04-. Arte Urbano

Mantenimiento de áreas verdes, camellones y espacios públicos en vialidades principales 2da. etapa.



Trabajos de restitución de barda, banqueta y obras complementarias en esq. de Av. Reforma y calle Rodolfo Gaona.

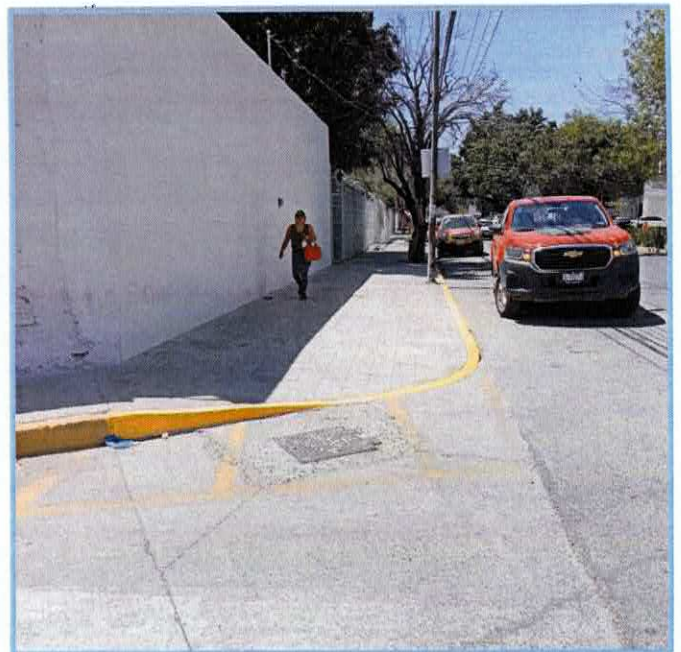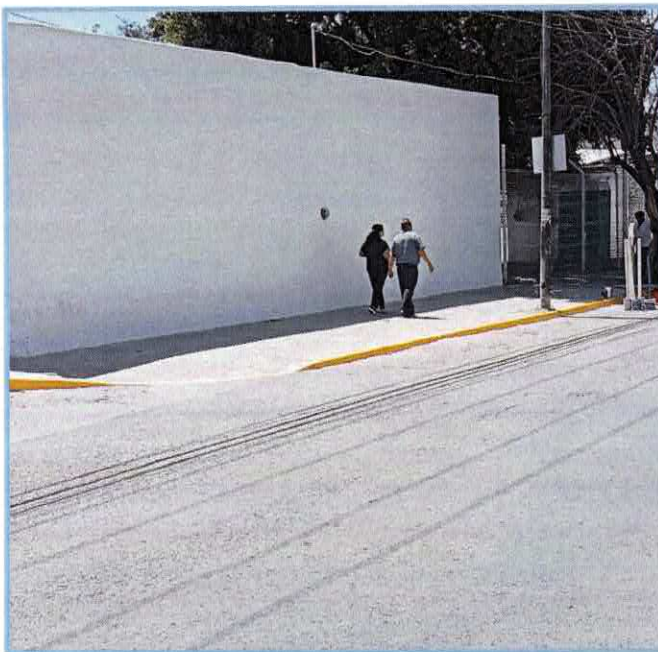

PE58-AE04-. Arte Urbano

Intervención integral de paisajismo urbano en el Blvd. solidaridad de la calle Benito Juárez a puente de autopista.



## PE59. Infraestructura

### PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal

Como parte de la estrategia integral para fortalecer la conectividad y modernizar la infraestructura vial de la ciudad, se ejecutaron diversas acciones enfocadas en la construcción y rehabilitación de la red vial en zonas urbanas y rurales. En este periodo se registran 11 acciones terminadas y 4 en proceso, con una inversión total de **148 millones 949 mil 416 pesos**. Destacan múltiples intervenciones de pavimentación con asfalto y concreto en distintas colonias y comunidades, así como obras estratégicas en proceso como la pavimentación de la calle Guanajuato, estas acciones responden a la necesidad de contar con vialidades más seguras, funcionales y duraderas, que faciliten el tránsito, reduzcan tiempos de traslado y mejoren la accesibilidad. Asimismo, contribuyen al desarrollo económico y social, fortalecen la integración territorial y elevan la calidad de vida de la ciudadanía al brindar infraestructura vial eficiente y acorde a las necesidades actuales de la población.



PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de pavimentación con asfalto, en el municipio de Irapuato, Gto, en la localidad Irapuato, en la <b>calle Fray Juan de Zumárraga (tramo: de calle San Miguel a la Av. Gabriel García Márquez).</b>	\$23,196,883.70	100
2	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Cuchicuato, en la calle Independencia, (tramo: de calle Av. 5 de Mayo a Lázaro Cárdenas).</b>	\$10,104,311.80	100
3	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Tejamanil, en la calle deportiva (Mezquite) tramo: Palma a camino de la carretera.</b>	\$8,709,031.57	100

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
4	Construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, <b>colonia el Vergel, calle Magnolia (tramo: de Mariano Abasolo a calle Uva.)</b>	\$7,713,710.17	100
5	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Lo de Juárez, en la calle Leyes de Reforma, (tramo: de calle Lázaro Cárdenas a calle Guadalupe Victoria).</b>	\$7,462,806.92	100
6	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Santa Elena de la Cruz, en la calle 10 de Mayo (tramo: 18 de agosto a 01 de mayo.)</b>	\$4,408,091.47	100
7	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato Gto., en la <b>colonia San Martín de Porres, calle San Antonio, tramo (San Nicolás a Santa Mónica).</b>	\$1,398,354.09	100
8	Construcción de pavimentación con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., <b>localidad San Roque, calle Emiliano Zapata (tramo: de Manuel Doblado al arroyo).</b>	\$8,659,404.93	100
9	Construcción de pavimentación con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Irapuato, en la colonia Cuarto día, en la calle Río Tíbet (tramo: de Río Jordán a río Nilo).</b>	\$1,000,525.54	100

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
10	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Irapuato, en la colonia Municipio Libre, Privada Poder Legislativo (tramo: Poder Ejecutivo al fondo.)</b>	\$464,404.86	100
11	Construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto, en la <b>localidad Irapuato, calle Guanajuato (tramo: de Gabriel García Márquez a Independencia).</b>	\$56,993,269.72	23
12	Ampliación del <b>puente vehicular cuerpo sur sobre el río Silao en su intersección con el Bulevar Paseo de la Altiplanicie</b> de esta ciudad de Irapuato, Gto.	\$11,994,298.69	79
13	<b>Vialidad alterna</b> de interconexión entre la <b>calle vasco de Quiroga y Calzada de Guadalupe</b> (por la construcción del Paso Superior Ferroviario de Calzada de Guadalupe) en Irapuato, Gto. y <b>construcción de alumbrado público entre la calle Vasco de Quiroga y Calzada de Guadalupe</b> (por construcción del Paso Superior Ferroviario de Calzada de Guadalupe), Irapuato, Gto.	\$5,412,976.70	39
14	Estudios de control de calidad y <b>verificación de procesos constructivos en el diseño y ejecución de pavimentos de obras estratégicas</b> del municipio de Irapuato.	\$204,792.36	100
15	<i>Supervisión externa de la construcción de</i> pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto, en la <b>localidad Irapuato, calle Guanajuato (tramo: de Gabriel García Márquez a Independencia)</b>	\$1,226,554.12	23

**PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal**

Construcción de pavimentación con asfalto en la calle Fray Juan de Zumárraga (tramo: de calle San Miguel a la Av. Gabriel García Márquez)

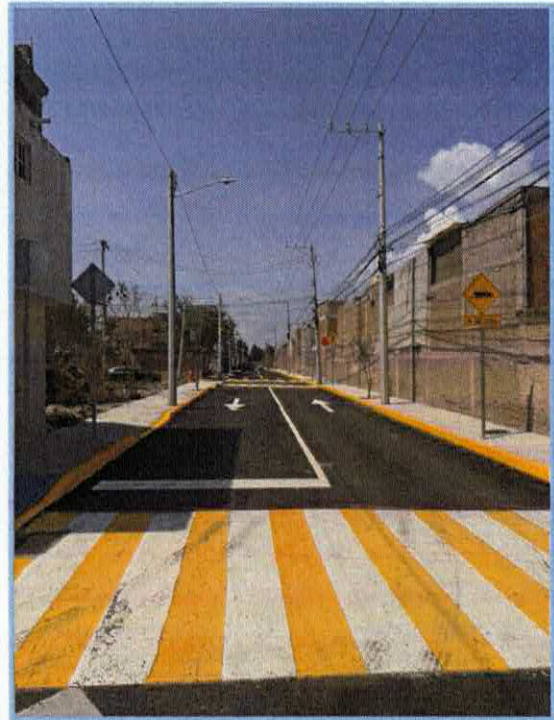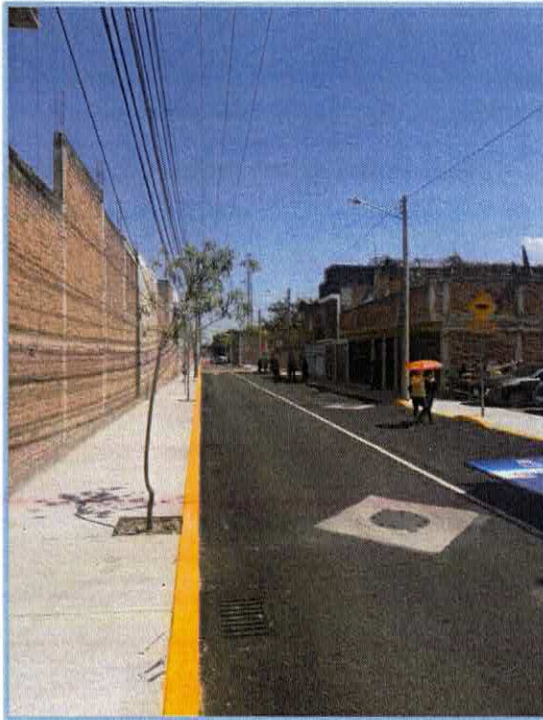

**PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal**

Construcción de pavimentación con asfalto en la localidad Cuchicuato, en la calle Independencia, (tramo: de calle Av. 5 de Mayo a Lázaro Cárdenas).



Construcción de pavimentación con asfalto en la localidad Tejamanil, en la calle deportiva (Mezquite) tramo: Palma a camino de la carretera.



Construcción de pavimento con asfalto localidad Irapuato, colonia el Vergel, calle Magnolia (tramo: de Mariano Abasolo a calle Uva.)



Construcción de pavimentación con asfalto en la localidad Lo de Juárez, en la calle Leyes de Reforma, (tramo: de calle Lázaro Cárdenas a calle Guadalupe Victoria).



**PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal**

Construcción de pavimentación con asfalto en la localidad Santa Elena de la Cruz, en la calle 10 de Mayo (tramo: 18 de agosto a 01 de mayo.)



Construcción de pavimentación con asfalto en la colonia San Martín de Porres, calle San Antonio, tramo (San Nicolás a Santa Mónica).



Construcción de pavimentación con concreto localidad San Roque, calle Emiliano Zapata (tramo: de Manuel Doblado al arroyo).



Construcción de pavimentación con concreto en la colonia Cuarto día, en la calle Río Tíbet (tramo: de Río Jordán a río Nilo).



**PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal**

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Municipio Libre, Privada Poder Legislativo (tramo: Poder Ejecutivo al fondo.)



Vialidad alterna de interconexión entre la calle vasco de Quiroga y Calzada de Guadalupe





Ampliación del puente vehicular cuerpo sur sobre el río Silao en su intersección con el Bulevar Paseo de la Altiplanicie.



**PE59-AE02-. Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal**

Construcción de pavimento con asfalto calle Guanajuato (tramo: de Gabriel García Márquez a Independencia).

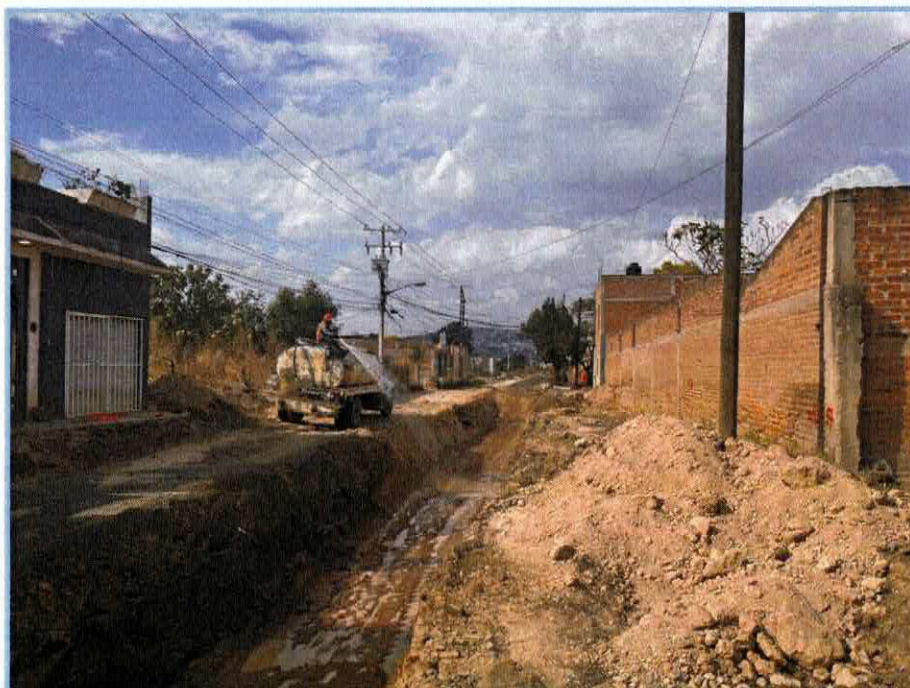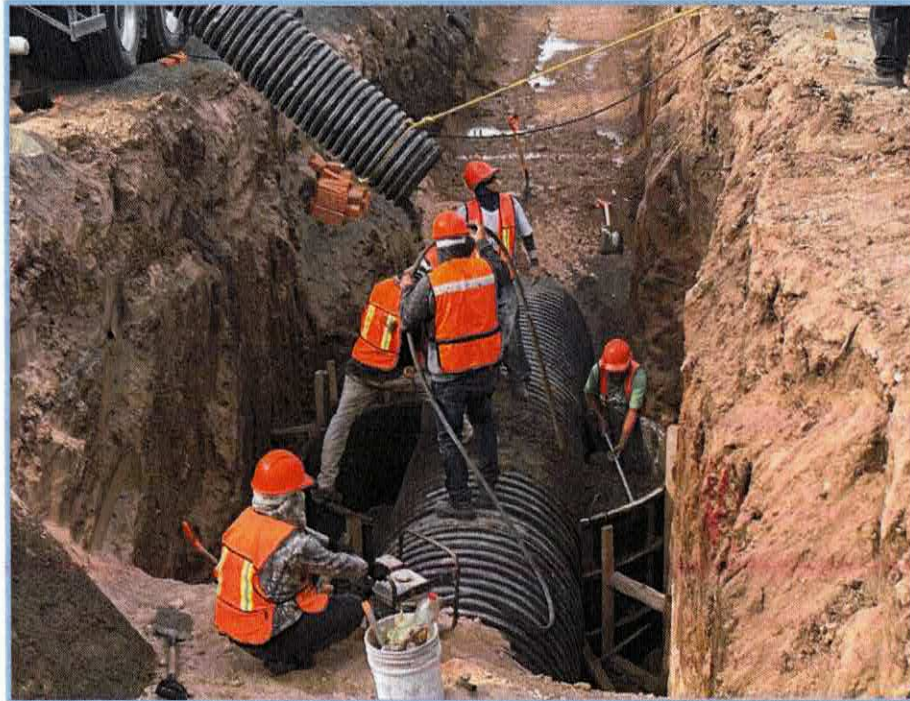

## PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio

En atención a la necesidad de conservar en óptimas condiciones la infraestructura existente y mejorar la movilidad urbana se concluyen 5 obras de rehabilitación vial en distintos puntos de la ciudad, priorizando vialidades con alto uso y zonas habitacionales, con una inversión de **33 millones 509 mil 474 pesos**. Entre las intervenciones realizadas destacan la rehabilitación de la avenida Independencia en su cuerpo sur, así como trabajos en diversas calles de colonias y fraccionamientos, lo que permite mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial, estas acciones contribuyen a prolongar la vida útil de la infraestructura, reducir costos de mantenimiento vehicular y optimizar los tiempos de traslado para la ciudadanía, generando entornos más ordenados y funcionales.

PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Rehabilitación vial de la <b>Av. Independencia (cuerpo sur), tramo: Av. las Águilas a vías del FF.CC.</b> en Irapuato, Gto.	\$29,401,203.97	100
2	Rehabilitación vial de la <b>calle Tabachín, tramo; de la calle Ficus a calle Roble, Fracc. Floresta</b> , en el municipio de Irapuato, Gto.	\$1,618,085.30	100
3	Rehabilitación vial de la <b>calle Culiacán, tramo: de C. Villahermosa a calle Coahuila pte, col Solidaridad</b> en el municipio de Irapuato, Gto.	\$1,099,811.37	100
4	Rehabilitación vial de la <b>calle, Privada Piracanto, col. Residencial del Bosque (tramo: calle Pípila al fondo)</b> en el municipio de Irapuato, Guanajuato.	\$765,481.64	100
5	Rehabilitación vial e imagen urbana de la <b>Calle Durazno, tramo: intersección con Boulevard San Roque</b> , en la ciudad de Irapuato, Gto.	\$624,892.66	100

PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio

Rehabilitación vial de la Av. Independencia (cuerpo sur), tramo: Av. las Águilas a vías del FF.CC.



**PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio**

Rehabilitación vial de la calle Tabachín, tramo; de la calle Ficus a calle Roble, Fracc. Floresta.



Rehabilitación vial de la calle Culiacán, tramo: de C. Villahermosa a calle Coahuila pte, col. Solidaridad.



**PE59-AE03-Rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio**

Rehabilitación vial e imagen urbana de la Calle Durazno, tramo: intersección con Boulevard San Roque.



Rehabilitación vial de la calle, Privada Piracanto, col. Residencial del Bosque (tramo: calle Pípila al fondo).



**PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.**



Con una inversión de **3 millones 969 mil 870 pesos**, concluye 1 obra orientada a mejorar la conectividad en comunidades rurales, facilitando el acceso a servicios; la primera etapa de rehabilitación del camino rural en la colonia de Pedro Arteaga hacia la localidad de Carrizal Grande, mejorando las condiciones de transitabilidad en este tramo, esta acción responde a la necesidad de contar con vías de comunicación más seguras y eficientes en zonas rurales, permitiendo el traslado adecuado de personas, bienes y servicios, favoreciendo el desarrollo económico local, fortaleciendo la integración territorial y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades.

<b>PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.</b>			
<b>No.</b>	<b>Obra</b>	<b>Monto Total</b>	<b>Avance Físico %</b>
1	Primera etapa de rehabilitación de <b>camino rural en la localidad colonia Pedro Arteaga, en el tramo de la carretera federal 45 a la entrada de la localidad de Carrizal Grande</b> (cadenamiento 0+000 al 0+480), en el municipio de Irapuato, Gto., (rehabilitación de camino rural Pedro Arteaga).	\$3,969,870.12	100



**PE59-AE04-Construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura rural municipal.**

Primera etapa de rehabilitación de camino rural en la localidad colonia Pedro Arteaga, en el tramo de la carretera federal 45 a la entrada de la localidad de Carrizal Grande.

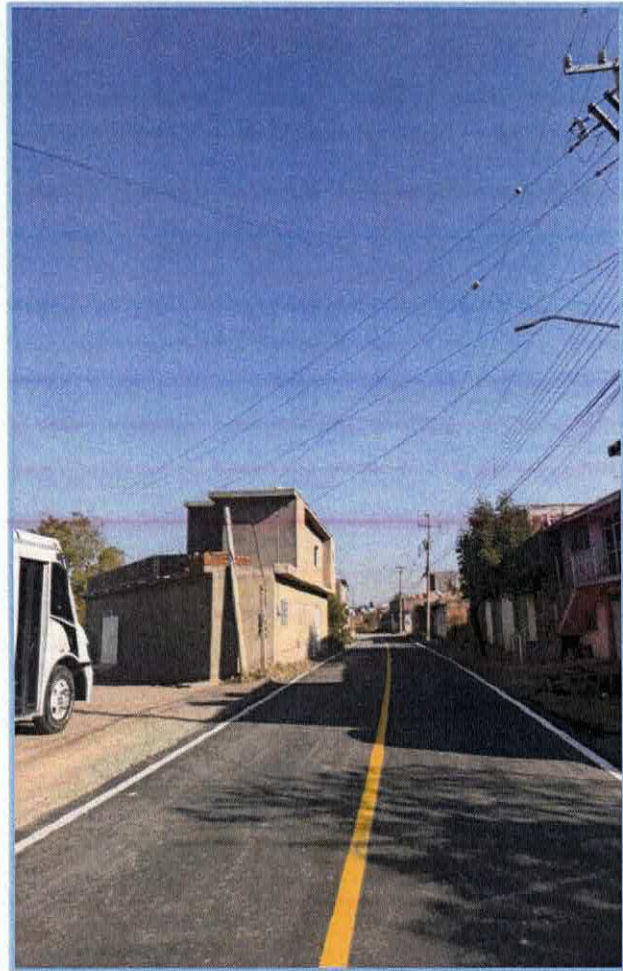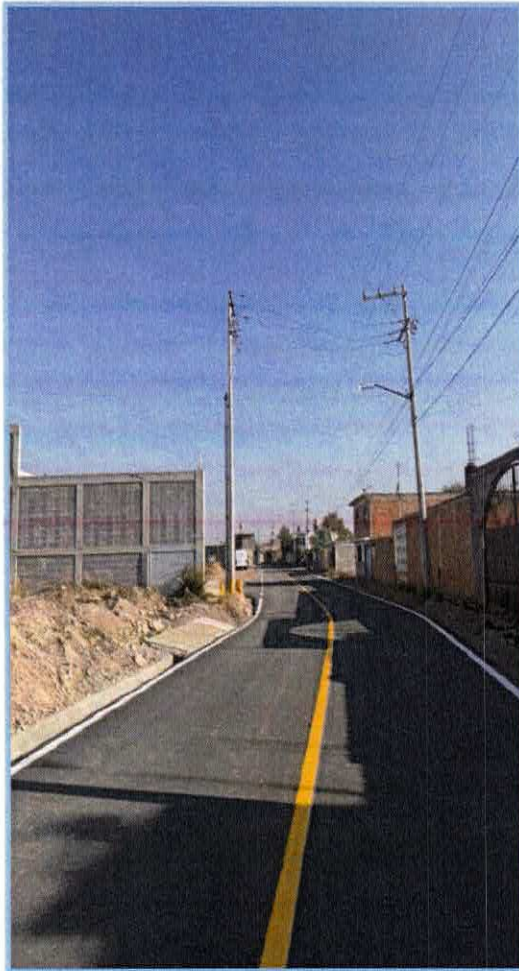

## PE61. Sistema de Parques

### PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales

Como parte de la estrategia de fortalecimiento del espacio público y entornos adecuados para la convivencia social, este trimestre se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a la rehabilitación, ampliación y creación de áreas verdes y parques vecinales, se registran 3 obras terminadas y 1 obra en proceso, con un monto de **30 millones 903 mil 199 pesos**, estas acciones responden a la necesidad de contar con espacios dignos, seguros y accesibles para la recreación, el esparcimiento y la convivencia familiar, fomentando entornos más saludables y cohesionados socialmente, asimismo, contribuyen a mejorar la imagen urbana, fortalecer el tejido social y promover estilos de vida activos, impactando de manera positiva en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Construcción de <b>plaza pública en la comunidad de Valencianita</b> , en Irapuato, Gto.	\$ 13,630,843.91	100
2	Rehabilitación de parque ubicado en la <b>zona posterior del mercado Benito Juárez</b> , en Irapuato, Gto.	\$7,026,960.44	100
3	Ampliación de parque público en el municipio de Irapuato, Gto., en la <b>localidad Irapuato, en la colonia FONHAPO.</b>	\$5,710,354.10	100
4	Rehabilitación de parque público en el municipio de Irapuato, Gto., <b>localidad Irapuato, en la colonia Magisterial, ubicado en la calle Rafael Ramírez.</b>	\$4,535,040.74	100

**PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales**

Construcción de plaza pública en la comunidad de Valencianita.



**PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales**

Rehabilitación de parque ubicado en la zona posterior del mercado Benito Juárez.



**PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales**

Ampliación de parque público en la colonia FONHAPO.



**PE61-AE02-. Programa de reforestación, conservación y fortalecimiento de áreas verdes y parques vecinales**

Rehabilitación de parque público en la colonia Magisterial, ubicado en la calle Rafael Ramírez.




## Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2026

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2026 se consolida como una herramienta estratégica para orientar la planeación, ejecución y evaluación de las acciones gubernamentales bajo un enfoque de resultados. Su implementación permite establecer objetivos claros, definir indicadores medibles y dar seguimiento puntual al desempeño de los programas y obras públicas, facilitando una toma de decisiones informada y oportuna.

ID	Indicador	Nivel	Proyecto Estratégico	Frecuencia	Sentido	Meta	Unidad de medida	Avance al periodo	Variables	Calendarización		
										Enero	Febrero	Marzo
FTI026	Porcentaje de avance de los estudios, así como de los avances físicos con respecto al avance programado.	C2	PE03. Patrimonio Histórico	Semestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI027	Porcentaje de ejecución del programa dignificación de vialidades del Centro Histórico	C2A1	PE03. Patrimonio Histórico	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI028	Porcentaje de ejecución del programa de monitoreo para conservación rutinaria del Centro Histórico.	C2A2	PE03. Patrimonio Histórico	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI075	Porcentaje de acciones programadas para el impulso del INFORUM.	C1	PE08. Polígono del Conocimiento, Investigación y Emprendimiento INFORUM	Semestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		

ID	Indicador	Nivel	Proyecto Estratégico	Frecuencia	Sentido	Meta	Unidad de medida	Avance al periodo	Variables	Calendarización		
										Enero	Febrero	Marzo
FTI076	Porcentaje de acciones contratadas para la mejora del espacio.	C1A1	PE08. Polígono del Conocimiento, Investigación y Emprendimiento INFORUM	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI080	Índice de desarrollo urbano y económico en el polígono de "La Gran Manzana".	Fin	PE09. La Gran Manzana	Anual	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI081	Porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos prioritarios de infraestructura planteados en el Plan Maestro de "La Gran Manzana".	Propósito	PE09. La Gran Manzana	Anual	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI082	Porcentaje de desarrollo del Plan Maestro para el impulso del proyecto de La Gran Manzana.	C1	PE09. La Gran Manzana	Semestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI083	Porcentaje de desarrollo de los proyectos para el impulso del proyecto de La Gran Manzana.	C1A1	PE09. La Gran Manzana	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI087	Porcentaje de avance en la construcción y operatividad del Complejo de Seguridad Ciudadana.	Propósito	PE10. Complejo de Seguridad Ciudadana	Anual	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI088	Porcentaje físico de la de la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana.	C1	PE10. Complejo de Seguridad Ciudadana	Semestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI089	Porcentaje de avance de los trabajos del Complejo de Seguridad Ciudadana.	C1A1	PE10. Complejo de Seguridad Ciudadana	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		



ID	Indicador	Nivel	Proyecto Estratégico	Frecuencia	Sentido	Meta	Unidad de medida	Avance al periodo	Variables	Calendarización		
										Enero	Febrero	Marzo
FTI432	Porcentaje de avance físico contra el avance programado en la construcción del Centro de Atención y Desarrollo Infantil Lo de Juárez.	Propósito	PE41. Fortalecimiento de la Infraestructura Social	Anual	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI433	Porcentaje de avance respecto a lo proyectado del Centro de Atención y Desarrollo Infantil lo de Juárez.	C1	PE41. Fortalecimiento de la Infraestructura Social	Semestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI434	Porcentaje de avance físico de la construcción del Centro de Atención y Desarrollo Infantil lo de	C1A1	PE41. Fortalecimiento de la Infraestructura	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI617	Porcentaje de avance en el programa de O.P. para el mejoramiento	C2	PE56. Servicios Públicos		Ascendente	100		0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI618	Porcentaje ejecutado del avance de la infraestructura de energía eléctrica y alumbrado público.	C2A1	PE56. Servicios Públicos	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI647	Porcentaje de avance en la intervención de espacios públicos y elementos escultóricos.	C4	PE58. Imagen Urbana	Semestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI648	Porcentaje de avance en la intervención elementos escultóricos.	C4A1	PE58. Imagen Urbana	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	100.0%	MOP			1
									MPGM			1
									Avance por periodo	100.0%		
FTI649	Porcentaje de avance en la intervención de espacios públicos.	C4A2	PE58. Imagen Urbana	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	100.0%	MOP			0.2
									MPGM			0.2
									Avance por periodo	100.0%		
FTI652	Índice de desarrollo de infraestructura en el municipio.	Fin	PE59. Infraestructura	Anual	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		

ID	Indicador	Nivel	Proyecto Estratégico	Frecuencia	Sentido	Meta	Unidad de medida	Avance al periodo	Variables	Calendarización		
										Enero	Febrero	Marzo
FTI653	Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones de mejora de infraestructura vial, deportiva y tecnológica.	Propósito	PE59. Infraestructura	Anual	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI654	Porcentaje de recursos gestionados para obras que fortalezcan la infraestructura social.	C1	PE59. Infraestructura	Semestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI655	Porcentaje de avance de las acciones para el Fortalecimiento y Mejoramiento de áreas deportivas.	C1A1	PE59. Infraestructura	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI656	Porcentaje de avance de la Construcción del Centro Acuático de Irapuato.	C1A2	PE59. Infraestructura	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI657	Porcentaje de avance en la Construcción, modernización y rehabilitación de la red vial municipal.	C1A3	PE59. Infraestructura	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI658	Porcentaje de rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas en la zona urbana del municipio.	C1A4	PE59. Infraestructura	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI659	Porcentaje de recursos gestionados para obras que fortalezcan la infraestructura rural municipal.	C1A5	PE59. Infraestructura	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		
FTI688	Porcentaje de avance del programa para llevar a cabo la Construcción y rehabilitación parques vecinales.	C6	PE61. Sistema de Parques	Semestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		



ID	Indicador	Nivel	Proyecto Estratégico	Frecuencia	Sentido	Meta	Unidad de medida	Avance al periodo	Variables	Calendarización		
										Enero	Febrero	Marzo
FTI689	Porcentaje de avance físico de la construcción de parques vecinales respecto a lo programado.	C6A1	PE61. Sistema de Parques	Trimestral	Ascendente	100	Porcentaje	0.0%	MOP			
									MPGM			100%
									Avance por periodo	0.0%		

Nota: Datos validados por la Dirección General de Innovación y Gobernanza Regulatoria.



## Transversalidad

En concordancia con una visión integral del Gobierno Municipal, las acciones desarrolladas durante este periodo incorporan un enfoque transversal que articula distintas dependencias y proyectos estratégicos, permitiendo maximizar el alcance y efectividad de la inversión pública. Este enfoque favorece la coordinación entre dependencias, la optimización de recursos y la generación de beneficios más amplios para la ciudadanía, consolidando proyectos que inciden de manera simultánea en distintos aspectos de bienestar para la ciudadanía.

### EJE A. TU Familia con Valores (Próspera, Unida y Responsable)

#### PE 47. CONVIVE Centros de Fortalecimiento Familiar

#### PE 47-AE02-Adquirir habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo personal

Se termina la rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia 18 de Agosto, con una inversión de **6 millones 934 mil 405 pesos**, intervención que contribuye al fortalecimiento del tejido social al brindar un espacio digno, funcional y adecuado para el desarrollo de actividades comunitarias, culturales y de atención social y que permite mejorar el acceso a servicios y programas dirigidos a la población, fomentando la participación ciudadana, la inclusión y el desarrollo integral de las familias, generando un impacto positivo en los habitantes de la zona.

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
4	Rehabilitación del <b>Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia 18 de Agosto</b> , en Irapuato, Gto.	\$6,934,405.48	100

**Rol:** Colaborador

**Responsable:** Dirección General de Desarrollo Social y Humano/ Secretaría Particular



**PE47-AE02-Adquirir habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo personal**

Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia 18 de Agosto.



## EJE R. TU Entorno Renovado (Funcional, Atractivo y Sostenible)

### PE54. Vivienda

#### PE54-AE09- Implementación de programas para personas en situación de vulnerabilidad.

Como parte de las acciones con enfoque social y de atención a las condiciones de vivienda, se concluyen a cabo 4 obras, con un monto de **12 millones 921 mil 249 pesos**, entre estas se encuentran el equipamiento e instalación de calentadores solares en diversas localidades, así como la construcción de cuartos dormitorios que presentan condiciones de rezago habitacional, acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas al brindar soluciones que fortalecen las condiciones básicas de vivienda y reducen el hacinamiento.

PE54. Vivienda			
PE54-AE09-Implementación de programas para personas en situación de vulnerabilidad			
No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Equipamiento e instalación de <b>calentadores solares</b> en Irapuato Gto, <b>localidades varias.</b>	\$10,948,845.60	100
2	Construcción de <b>cuarto dormitorio</b> en Irapuato Gto, <b>Localidad Carrizalito</b> 110170069	\$988,012.30	100
3	Construcción de <b>cuarto dormitorio</b> en Irapuato Gto, <b>Localidad Cuarta Brigada</b> 110170081	\$547,958.20	100
4	Construcción de <b>cuarto dormitorio</b> en Irapuato Gto, <b>Localidad La Caja</b> 110170061	\$436,433.78	100


**Rol:** Corresponsable

**Responsable:** Dirección General de Desarrollo Social y Humano/ / Secretaria Particular



PE54-AE09-Implementación de programas para personas en situación de vulnerabilidad

Equipamiento e instalación de calentadores solares localidades varias.

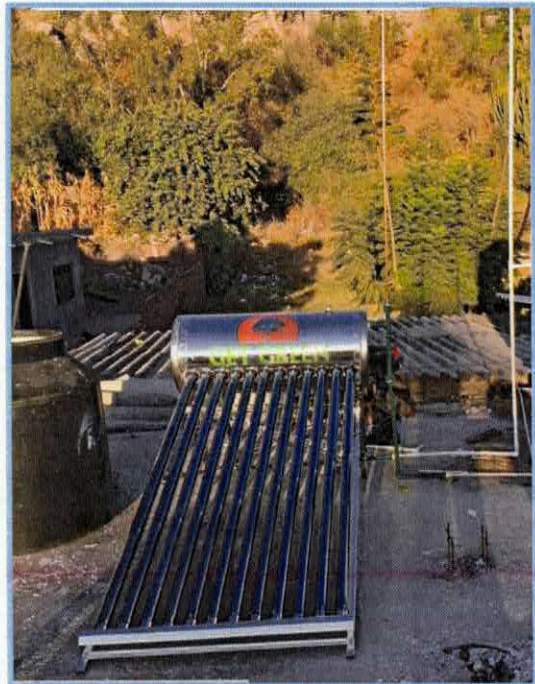

PE54-AE09-Implementación de programas para personas en situación de vulnerabilidad

Construcción de cuarto dormitorio Localidad Carrizalito.



Construcción de cuarto dormitorio en Irapuato Gto, Localidad Cuarta Brigada.



PE54-AE09-Implementación de programas para personas en situación de vulnerabilidad


Construcción de cuarto dormitorio Localidad La Caja



### Acciones no encuadradas en el P.G.M.

Esta acción no se encuentra directamente alineada a un eje del Programa de Gobierno Municipal, pero resulta necesaria para el adecuado funcionamiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública, en este sentido, se registra 1 obra en proceso, con un monto de **1 millón 827 mil 127 pesos**, acción que contribuye a modernizar los espacios incorporando herramientas tecnológicas que favorecen la eficiencia, la comunicación y la transparencia en la gestión pública.

No.	Obra	Monto Total	Avance Físico %
1	Integración de sala audiovisual para <b>sala de cabildos en el edificio de presidencia</b> , en Irapuato, Gto.	\$1,827,127.41	2



## Glosario

MIR	Matriz de Indicadores para Resultados
SENCO	Secretaría del Nuevo Comienzo
FORTAMUN	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
FAISMUN	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
DGOP	Dirección General de Obras Públicas
PGM	Programa de Gobierno Municipal
MOP	Metas Obra Pública
MPGM	Metas Programa de Gobierno Municipal

