

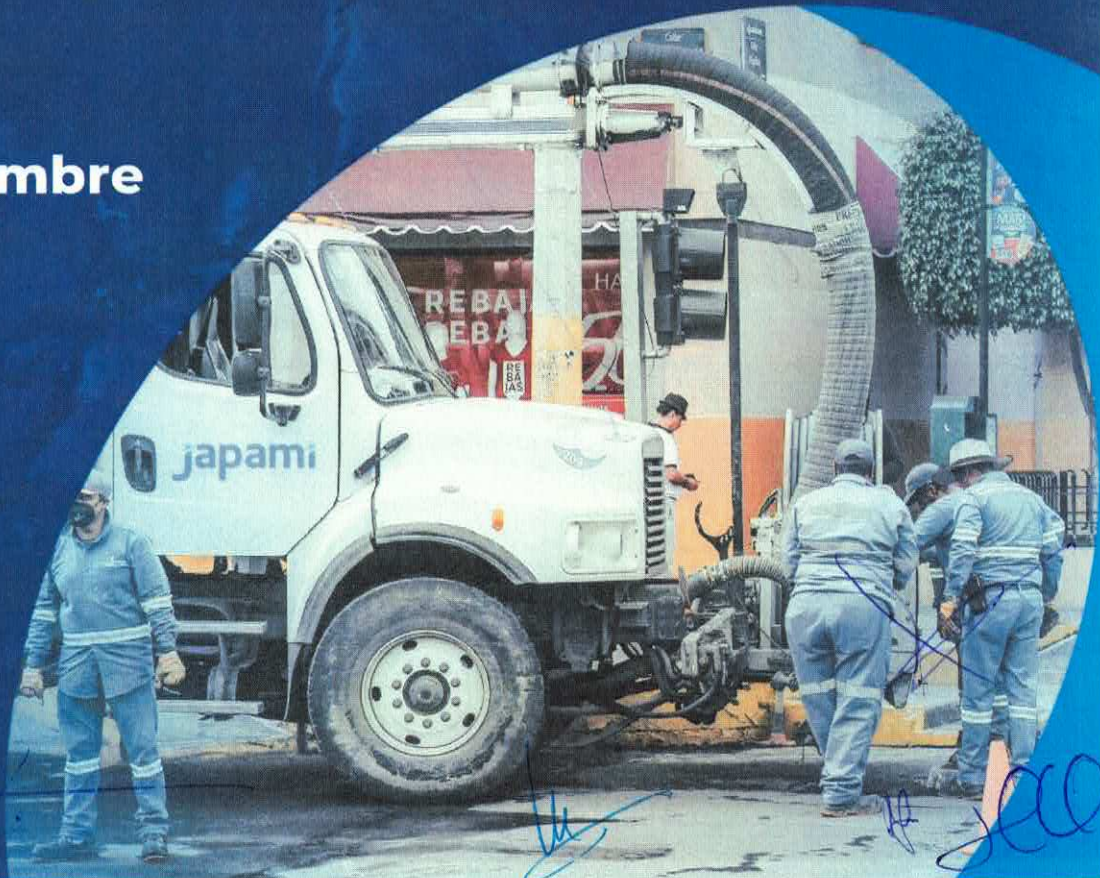


japami

JUNTA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IRAPUATO




INFORME TRIMESTRAL

**Julio- septiembre
2024**





JABALU



Contenido

1	Del estado que guarda la Administración.....	2
1.1	Recursos presupuestales por capítulo de gasto.....	2
1.2	Ejercicio presupuestal. Ramo 33.....	3
2	Avances del programa presupuestario " <i>Dotar de Infraestructura y Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense</i> ".....	5
2.1	Nivel FIN. Indicadores estratégicos de cumplimiento.....	5
2.2	Nivel PROPÓSITO. Indicadores estratégicos de cumplimiento.....	5
2.3	Nivel COMPONENTE. Indicadores de resultados.....	6
2.3.1	Componente 1. Agua Potable.....	6
2.3.2	Componente 2. Drenaje y Alcantarillado.....	7
2.3.3	Componente 3. Saneamiento y calidad del agua.....	8
2.3.4	Componente 4. Atención de los usuarios de los servicios básicos.....	9
2.3.5	Componente 5. Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales.....	11
2.3.6	Componente 6. Administración y gestión del Organismo Operador.....	12
3	Gestión de Programa Obra.....	14
4	Gestión de Adquisiciones.....	15
5	Contratos, convenios, concesiones u otros actos jurídicos.....	16
6	Factibilidades.....	21
7	Comunicación Social.....	22
8	Anexos.....	24



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with horizontal lines underneath.

1 Del estado que guarda la Administración.

1.1 Recursos presupuestales por capítulo de gasto.

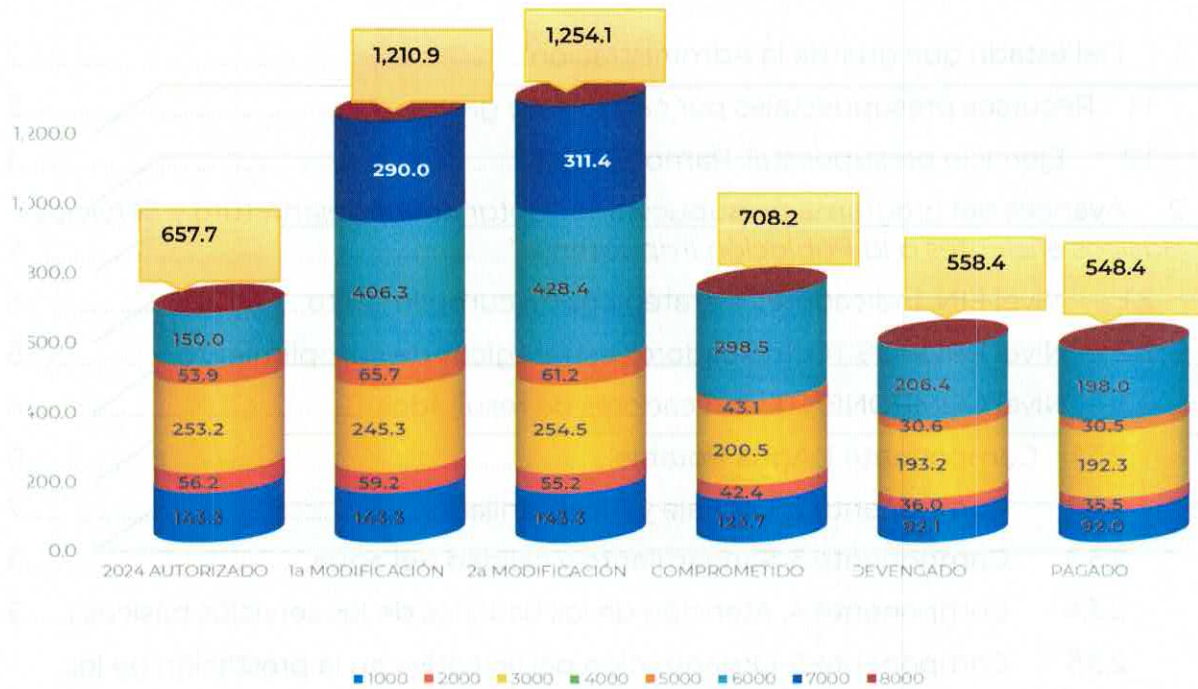


Gráfico 1. Presupuesto de egresos, segunda modificación ejercicio 2024.

En el periodo se informa se adicionan principalmente recursos en el capítulo 6000 referentes a recursos del ramo 33 FAIS municipal, así como la recuperación del PRODDER financiado 2023 que fue recibido durante el periodo que se informa.

Tabla 1. Presupuesto 2024 – Ejercido respecto de modificación.

CAP	DESCRIPCIÓN	1a MOD	2a MOD	%	COMPR	%	PAG	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	143.33	143.33	11.43	123.65	17.46	92.00	16.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59.18	55.17	4.40	42.43	5.99	35.51	6.47
3000	SERVICIOS GENERALES	245.24	254.46	20.29	200.54	28.32	192.27	35.06
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.13	0.14	0.01	0.03	0.00	0.03	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65.74	61.19	4.88	43.13	6.09	30.51	5.56
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	406.30	428.41	34.16	298.45	42.14	198.05	36.12
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	289.99	311.41	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APOTACIONES		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 2024	1,210.9	1,254.1		708.24		548.36	

1.2 Ejercicio presupuestal. Ramo 33



En cuanto al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS, se programadas a la fecha como parte del programa de obra 2024.

Tabla 2. Recursos concurrentes del R33 -Servicios básicos. Programado

	57,478,917	42,929,975	14,548,942
Nombre de la obra/acción	Programado	Municipal contratado (FAISM)	FAIS Estatal
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA	4,397,418	2,198,709	2,198,709
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y LOCALIDAD LA ZAHURDA (2DA ETAPA)	3,259,279	1,629,640	1,629,640
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CALERA, EN LAS CALLES PRIVADA SALAMANCA Y CALLE SALAMANCA Y (TRAMO DE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL A CALLE EMILIANO ZAPATA)	2,422,795	1,211,398	1,211,398
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) (2A. ETAPA)	13,059,459	6,529,730	6,529,730
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PURÍSIMA DE COVARRUBIAS	4,835,342	2,417,671	2,417,671
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA CARRIZAL GRANDE	1,123,591	561,796	561,796
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PARA AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CUARTA BRIGADA.	2,200,000	2,200,000	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PRIVADA LAS ROSAS, DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE.	957,000	957,000	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMELINA, JACARANDAS Y PRIVADA SIEMPRE EN DOMINGO, DE LA LOCALIDAD PURÍSIMA DEL JARDÍN.	1,012,000	1,012,000	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO.	2,412,033	2,412,033	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA 3.	550,000	550,000	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES.	528,000	528,000	

Nombre de la obra/acción	Programado	Municipal contratado (FAISM)	FAIS Estatal
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL.	5,604,112	5,604,112	0
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD NORIA DE CAMARENA	1,317,888	1,317,888	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLA DE CÁRDENAS.	4,000,000	4,000,000	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES.	4,000,000	4,000,000	0
REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN EN LA ZONA RURAL.	5,800,000	5,800,000	0



2 Avances del programa presupuestario “Dotar de Infraestructura y Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense”

2.1 Nivel FIN. Indicadores estratégicos de cumplimiento.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica	
FIN	Procurar el cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica garantizando a la población la cobertura y acceso a servicios sustentables de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.	Dotación de agua por habitante	230.79	220	Litros/habitante/día
		Porcentaje de cumplimiento en el saneamiento de las aguas residuales generadas en la cabecera municipal	95.25%	95%	Aguas saneadas/ Aguas residuales recibidas

2.2 Nivel PROPÓSITO. Indicadores estratégicos de cumplimiento.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica	
PROPÓSITO	La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.	Continuidad del servicio de agua potable en toma	18.73	15	Horas servicio continuo
		Porcentaje de solución en puntos de encharcamiento	33%	95%	Puntos atendidos en programa obra/ Puntos programados en programa obra
		Vigilancia de la calidad de descargas en aguas residuales para usuarios no domésticos	60%	95%	Muestras realizadas/ Muestras programadas






2.3 Nivel COMPONENTE. Indicadores de resultados.

2.3.1 Componente 1. Agua Potable.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicio público de agua potable y promoción de consumo de agua tratada, apegados al aprovechamiento o sustentable de los recursos hídricos.	Porcentaje de colonias con servicios con continuidad mayor o igual a 12hrs y presión mayor o igual a 0.5kg/cm2	77.87%	75%	Colonias o asentamientos con parámetros aceptable de servicio/Totalidad de colonias
	Porcentaje de atención de reportes por fugas	89.38%	95.00%	Eventos reportados/ Eventos solucionados
	Porcentaje de fuentes de abastecimiento con condiciones de operación mejoradas	30.77%	90%	Fuentes de abastecimiento atendidas / Fuentes de abastecimiento programadas
	Número de horas de atención respecto de fallas en fuentes de abastecimiento	63 horas	36 horas	Total de tiempo de atención por reporte de falta de agua, /Total de folios atendidos por falta de agua

Relativo a los reportes ciudadanos de servicio atendidos por el área se reporta lo siguiente en comparación con el mismo periodo del año anterior.



2.3.2 Componente 2. Drenaje y Alcantarillado.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial proporcionado	Número de horas de desalojo en puntos de encharcamiento	3 horas promedio	Máximo 3 horas	Duración máxima del encharcamiento
	Porcentaje de cárcamos en operación	100%	100%	Cárcamos operativos/Totalidad de cárcamos
	Porcentaje de cumplimiento de folios de revisión de drenaje	87%	95%	Fallas atendidas/Fallas reportadas
	Porcentaje de programas de medición de parámetros de servicio implementados	100%	100%	Programas de medición implementados; /Programas de medición programados en la anualidad

Relativo a los reportes ciudadanos de servicio atendidos por el área se reporta lo siguiente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.





2.3.3 Componente 3. Saneamiento y calidad del agua.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Verificación de la calidad del agua y tratamiento de aguas residuales de los servicios proporcionados.	Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia de la correcta calidad de agua	90%	100%	Análisis en PTAR 's, pozos, potabilizadoras y usuarios no domestico realizados/ Análisis en PTAR 's, pozos, potabilizadoras y usuarios no domestico programados
	Porcentaje de cumplimiento a programa de mantenimiento preventivo de equipos, e instalaciones, relacionados con el funcionamiento de las PTAR	78%	100%	Mantenimientos preventivos realizados/ programado
	Porcentaje de acreditaciones, certificaciones y licenciamientos obtenidos	83%	100%	Acreditaciones y licencias obtenidas/ programadas
Entregables operativos de la PTAR		Resultado del periodo	Métrica	
Volumen de agua saneado en plantas		21.43	Millones de metros cúbicos	
Volumen de agua residual generado zonas de cobertura		22.5	Millones de metros cúbicos	

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present at the bottom of the page, including a large 'X' mark and several illegible signatures.



2.3.4 Componente 4. Atención de los usuarios de los servicios básicos.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Atención de los usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera del Organismo como parte del servicio proporcionado o contratado	Eficiencia Comercial	57%	55%	Importes cobrados/ Importes facturados por servicio de agua potable
	Actualización del padrón de usuarios	1,475	1,800	Usuarios actualizados en el padrón
	Porcentaje de incremento en micromedición	3.95%	10%	Medidores instalados respecto de totalidad de cuentas
	Porcentaje de usuarios en el esquema de pago oportuno	72.91%	80%	Usuarios activos que pagan oportunamente; respecto de la totalidad de cuentas activas de servicios básicos
	Porcentaje de micromedidores con vida útil menor a 8 años	94%	95%	Micromedidores con vida útil entre 0 y 8 años respecto de la totalidad de cuentas con micromedidores instalados
Entregables operativos de Comercialización		Resultado del periodo	Métrica	
Facturación por servicio de agua potable		\$336.78	Millones de pesos	
Ingresos por servicio de agua potable		\$192.87	Millones de pesos	
Importes en cartera vencida		\$56.4	Millones de pesos	
Volumen facturado		15.61	Millones de metros cúbicos	
Volumen cobrado		13.18	Millones de metros cúbicos	

Relativo a los reportes ciudadanos de servicio atendidos por el área se reporta lo siguiente en comparación con el mismo periodo del año anterior.





Tabla 3. Registros de cuentas por tipo de usuario y giro del servicio.

Cuentas activas						
Tipo de servicio	Doméstico	Mixto	Comercial	Industrial	Público	Totales
Agua	3,716	134	109	9	124	4,092
Agua y Drenaje	1,902	98	80	31	9	2,120
Agua, Drenaje y Tratamiento	109,874	7,814	7,766	543	283	126,280
Drenaje	91	1	6	4		102
Drenaje y Tratamiento	1,862	74	137	21	5	2,099
Totales	117,445	8,121	8,098	608	421	134,693
Cuentas cortadas y suspendidas						
Agua	633	15	7	1	0	656
Agua y Drenaje	126	8	4	0	0	138
Agua, Drenaje y Tratamiento	7,911	463	818	39	2	9,233
Drenaje y Tratamiento	8		4	1		13
Totales	8,678	486	833	41	2	10,040
TOTAL GENERAL						144,733

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Large rectangular redaction boxes covering text at the bottom of the page.



2.3.5 Componente 5. Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales, promoviendo la incorporación al organismo del sector objetivo identificado	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	95%	95%	Comunidades rurales atendidas/ Comunidades que presentan solicitud de atención
	Porcentaje de actividades de atención en comunidades realizadas	64%	95%	Acciones comunitarias realizadas/ Solicitudes de atención recibidas
	Gestión de infraestructura de servicios en las comunidades rurales	46%	100%	Infraestructura realizada/infraestructura programada sin considerar el periodo de programación de obra

Respecto de los importes de inversión pública en el ámbito rural, programados en 2023 y 2024, se tienen las siguientes cifras.

Estatus	TIPO	#	Importe programado	Importe contratado
En ejecución	Agua	1	3,000,000	2,998,922
	Drenaje	1	9,500,000	9,441,403
	Alcantarillado	3	20,317,596	20,188,040
Programado	Agua	9	28,572,145	
	Drenaje	2	1,502,593	
	Alcantarillado	6	11,605,176	
Total general		22	74,497,510	32,628,365

El detalle de atención a localidades y asentamientos rurales se presenta en el anexo B adjunto que forma parte integral del informe que se rinde.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom.



2.3.6 Componente 6. Administración y gestión del Organismo Operador

Resumen Narrativo	Indicador de componente	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Administración y gestión del servicio proporcionado	Autonomía financiera del Organismo Operador	77%	85%	Ingresos propios/ Ingresos totales
Indicadores operativos por unidad responsable				
U Responsable	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Dirección General	Cumplimiento de metas	5%	90%	Metas logradas/Metas programadas
Órgano Interno de Control	Porcentaje de auditorías realizadas	70%	100%	Auditorías realizadas/ Auditorías programadas
Unidad de Transparencia	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	100%	100%	Solicitudes respondidas en tiempo/ Solicitudes recibidas
Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Porcentaje de expedientes técnicos realizados	59%	100%	Expedientes realizados/Expedientes programados
	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	52%	65%	Obras terminadas/ Acciones programadas obra (sin considerar fecha de inicio de los trabajos)
Gerencia de Finanzas y Administración	Porcentaje de recursos humanos capacitados	100%	90%	Personal capacitado/ Personal considerado en el programa de capacitación
	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras - Cuenta Pública	50%	100%	Obligación financiera cumplida/ Obligaciones requeridas
	Porcentaje de cumplimiento del programa de adquisiciones consolidadas cumplido	94%	100%	Adquisiciones consolidadas realizadas/ Adquisiciones consolidadas programadas
	Porcentaje de atención a unidades operativas del Organismo	67%	100%	Equipos operativos atendidos y funcionales/ Equipos operativos programados para servicio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Indicadores operativos por unidad responsable				
U Responsable	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Coordinación Jurídica	Porcentaje de cumplimiento de los contratos y convenios	81%	100%	Contratos-convenios realizados/ Contratos-convenios susceptibles de ser suscritos
Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Porcentaje de obligaciones de seguimiento cumplidas en tiempo en forma	75%	100%	Seguimiento Integrado/ Seguimiento programado
Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	Fomento a valores entorno al uso del agua	49%	90%	Participantes en eventos relacionados con cultura del agua respecto de la totalidad de participación esperada
Coordinación de Incorporaciones	Porcentaje de atención oportuna proporcionada a desarrolladores respecto de proyectos presentados	78%	90%	Repuestas respecto de la factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, otorgadas en el plazo de 45 días





3 Gestión de Programa Obra.

Al respecto del programa de obra 2024 se informa la segunda modificación al programa

Tabla 4. Estatus programa obra 2ª modificación por estatus de obra.

Estatus	TIPO	#	Importe programado	Importe contratado
En ejecución	Agua	10	71,017,064	70,503,383
	Alcantarillado	8	48,757,160	46,826,410
	Drenaje	4	36,316,492	22,569,354
	Eficiencia	3	10,528,493	10,264,744
Subtotal obra en ejecución		25	166,619,208	150,163,891
Programada	Agua	11	29,106,018	-
	Alcantarillado	5	9,676,358	-
	Drenaje	8	15,657,458	-
	Eficiencia	3	31,246,078	-
Subtotal obra programada		27	85,685,912	-
Total general		52	252,305,120	150,163,891


En el anexo C del este informe se presenta el desglose del programa programado y en ejecución.



4 Gestión de Adquisiciones.

Tabla 5. Adquisiciones (por contrato) en el periodo que se informa.

Nombre de la acción / Adquisición	Alcance	Importe contratado	Fecha de contrato
Unidades vehiculares	Adquisición de 4 unidades vehiculares para el área de agua potable.	2,059,200	01/07/2024
Micromedición	Adquisición de medidores 9,590 de 1/2", solicitados por la Gerencia de Comercialización, para ser instalados a los usuarios nuevos y/o por cambio de medidores dañados.	8,365,549	16/07/2024
Registradores de datos	Adquisición de registradores de datos para el programa de sectorización y monitoreo de presiones y gastos en las fuentes de abastecimiento.	2,308,406	18/07/2024
Cloración	Adquisición de cilindros para el llenado de gas cloro para la aplicación en fuentes de abastecimiento.	1,588,620	18/07/2024
Equipamiento en equipos de bombeo	Adquisición de bombas y motores sumergibles solicitados por el área de agua potable, para ser instaladas en las fuentes de abastecimiento.	2,169,206	08/08/2024
Unidades vehiculares	Adquisición de 2 unidades vehiculares chasis redilas para el área de agua potable.	976,720	09/08/2024
Caudalímetros	Adquisición de caudalímetros para el área de agua potable.	2,301,497	26/08/2024
Equipamiento en equipos de bombeo	Adquisición de una bomba sumergible para la Subgerencia de Calidad de Agua y PTAR.	970,510	09/09/2024
Material de plástico hidráulico	Adquisición de material de plástico hidráulico para la Subgerencia de Calidad de Agua y PTAR.	746,979	13/09/2024
Total general		21,486,686	

5 Contratos, convenios, concesiones u otros actos jurídicos.

Tabla 6. Instrumentos celebrados en el periodo que se reporta.

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATO DE ADQUISICIONES	
JAPAMI/ADQ/2024-18	Adquisición de bomba sumergible.
JAPAMI/ADQ/2024-19	Adquisición de Cloruro Férrico
JAPAMI/ADQ/2024-20	Adquisición de Software
JAPAMI/ADQ/2024-21	Adquisiciones de Equipo de Cómputo
JAPAMI/ADQ/2024-22	Adquisición de bomba sumergible.
JAPAMI/ADQ/2024-23	Adquisición de Vehículos.
JAPAMI/ADQ/2024-24	Adquisición de Artículos Metálicos.
JAPAMI/ADQ/2024-25	Adquisición de Medidores.
JAPAMI/ADQ/2024-26	Adquisición de Medidores.
JAPAMI/ADQ/2024-27	Adquisición de Registradora de Datos.
JAPAMI/ADQ/2024-28	Adquisición de Gas Cloro.
JAPAMI/ADQ/2024-29	Adquisición de bomba sumergible.
JAPAMI/ADQ/2024-30	Adquisición de vehículos
JAPAMI/ADQ/2024-31	Adquisición de caudalímetros
JAPAMI/ADQ/2024-32	Adquisición de equipo de bombeo
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
JAPAMI/PRESTSERV/2024-06	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-07	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-17	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-19	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-20	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-23	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-27	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-28	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-29	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-32	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
JAPAMI/PRESTSERV/2024-35	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-36	Asesoría en comunicación digital.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-38	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, mediante el Programa Arte Urbano por el Agua.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-39	Planeación y Gestión de trámites ante CONAGUA para la redistribución de volúmenes de las fuentes de abastecimiento de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
JAPAMI/PRESTSERV/2024-40	El resguardo del historial médico de los trabajadores de JAPAMI, por medio de la aplicación móvil llamada GEMA CORP la cual será nutrida y administrada por la persona autorizada por JAPAMI.
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-01	Acciones para atender contingencias en el Río Guanajuato (de Blvd. Solidaridad a Calzada de Guadalupe).
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-02	Reparación de Colapsos Pluviales 2024 (Distrito 2).
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-03	Reparación de descargas sanitarias 2024.
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-04	Reparación de Colapsos Pluviales 2024 (Distrito 1).
JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. Localidad Irapuato, en la Colonia Flores Magón Norte (Etapa 2 de 3).
JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-06	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Colonia Las Rosas (Etapa 3 de 3).
JAPAMI/I3/PRODDER/2024-08	Construcción de Colector de Alcantarillado Pluvial en el Municipio de Irapuato, Gto. en Gerardo Murillo (Etapa 5 de 5).
JAPAMI/LS/RP/OP/2024-09	Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/LS/RP/OP/2024-10	Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el Municipio de Irapuato, Gto. (Distrito 1) (Incluye Aforo ((2024)).
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-11	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de Infraestructura en tanque de distribución superficial en zona poniente.
JAPAMI/LPN/PROAGUA/2024-07	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. Localidad Irapuato, en la Colonia Los Príncipes.
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-17	Rehabilitación de infraestructura en tanque de distribución superficial en zona poniente.
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-20	Acciones de mantenimiento en fuentes de abastecimiento en la Ciudad de Irapuato (2024).
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-24	Suministro e instalación de equipo de bombeo en cárcamo 52 (Col. Bernardo Cobos) (Incluye infraestructura eléctrica).
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-26	Rehabilitación de cárcamo en el Municipio de Irapuato, Gto., Localidad Irapuato, en la Colonia Las Liebres (Etapa 2 de 4).
JAPAMI/AD/PRODDER/2024-13	Construcción de red de alcantarillado pluvial en el Municipio de Irapuato, Gto. En el Fracc. La Pradera hacia Blvd. Solidaridad (etapa 2 de 5).
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-12	Estudios de mecánica de suelos, calidad de materiales y control de calidad para las obras y proyectos ejecutivos que realiza JAPAMI en el Municipio de Irapuato, Gto. (2024).

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-15	Proyecto ejecutivo para las líneas de conducción y distribución para tanque elevado de Villas de Irapuato.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-21	Proyecto ejecutivo del diseño eléctrico para equipamiento del pozo profundo en el Fraccionamiento Villas del Sol.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-22	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado en la zona de los Fraccionamientos Pontevedra y Masada.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-23	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la zona de influencia del colector higuera, en el Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-25	Estudio de diagnóstico de plantas de tratamiento en la zona rural del Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-27	Dictamen estructural de tanque elevado del pozo 19 (Fracc. Valle del Sol).
JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2024-16	Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Irapuato, Gto. En la Localidad La Calera, en las calles privada Salamanca y Calle Salamanca (Tramo de Fray Juan de San Miguel a Calle Emiliano Zapata).
JAPAMI/LS/RP/OP/2024-14	Instrumentación de telemetría en pozos (2024).
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2024-18	Ampliación de red de drenaje sanitario en el Municipio de Irapuato, Gto. en la Localidad San Ignacio de Rivera (ojo de agua) (2a. etapa).
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2024-19	Ampliación de drenaje sanitario en el Municipio de Irapuato, Gto. En la Localidad Purfísima de Covarrubias.
PMI-JAPAMI-PSBMC-01/2024	Especificar condiciones para la aplicación y transferencia de recursos, para que <<JAPAMI>> directamente o a través de terceros lleve a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras insertas en los Anexos de ejecución de <<El Programa>>, que se deriven del convenio SEDESHU-GTO-PSBMC-17/2024.
PMI/JAPAMI/001/RAMO33/COMISIÓN RURAL/2024	Establecer las bases para la transferencia de recursos de las obras autorizadas en la Comisión de trabajo de Desarrollo Rural, rubros Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, Agua Potable y Drenaje Alcantarillado y Letrinas del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 33, ejercicio fiscal 2024, operado por "El Municipio" hacia "JAPAMI", para que esté directamente o a través de terceros lleve a cabo las gestiones y actividades necesarias para la ejecución de las obras o acciones insertas en el Programa de inversión del Ramo 33 ejercicio fiscal 2024, considerando las modificaciones que tenga durante su vigencia.
PMI-JAPAMI-PSBGTO-01/2024	Especificar las condiciones para la colaboración, asignación y transferencia de recursos, para que <<JAPAMI>> directamente o a través de terceros lleve a cabo las actividades necesarias para la ejecución en las obras insertas en los Anexos de Ejecución de <<EL PROGRAMA >>, que se deriven del convenio SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2024.
CONTRATOS DE SERVICIOS	
JAPAMI/SERV/2024-08	Servicio de Reparación de Bomba propela, de la marca BNJ, modelo 30PO/2E con número de serie N08Y7447/1.
JAPAMI/ASERV/2024-03	Servicio abierto para maniobras de instalación y/o desinstalación de equipos de bombeo en pozos.
JAPAMI/ASERV/2024-04	Servicio abierto para maniobras de instalación y/o desinstalación de equipos de bombeo en pozos.

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATOS DE SERVICIOS	
JAPAMI/SERV/2024-12	Mantenimiento a Bomba de Propela, de la marca BNJ, Modelo 30PO/2E, con número de serie N14L10585.
JAPAMI/SERV/2024-14	Servicio Técnico Integral a la potabilizadora ubicada en la comunidad Malvas Revolución con número de inventario SIAC 5532
JAPAMI/SERV/2024-15	Servicio técnico integral a la potabilizadora ubicada en la comunidad de Malvas La Argolla con número de inventario SIAC 6419.
JAPAMI/SERV/2024-16	Servicio de distribución con pipas para abastecimiento de agua potable en localidades del Municipio de Irapuato, Guanajuato, afectadas por la sequía.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	
Contrato de arrendamiento	La "Arrendadora" concede a la "Arrendataria" el uso y goce temporal de un espacio de área común, con una superficie aproximada de 1.30 x 1.70 metros cuadrados, para la instalación de un cajero automático, ubicado físicamente dentro del centro comercial denominado Plaza Magna.
JAPAMI/ARREND/2024-03	El ARRENDADOR concede a la ARRENDATARIA el uso y goce temporal de EL INMUEBLE identificado como lote No.1 de la manzana 13 de la zona 1 de la Localidad de Malvas La Argolla de esta Ciudad de Irapuato, Guanajuato.
CONVENIO DE COLABORACIÓN	
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2024-06	Establecer las bases de colaboración para que JAPAMI y el CLUB, lleven a cabo acciones conjuntas para que los trabajadores activos de JAPAMI y sus familiares directos, tengan acceso a un descuento especial en los servicios que proporciona EL CLUB denominado SPORT FIT 360.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN-2024-07	El objeto es establecer las bases de colaboración para que JAPAMI y la ESTANCIA, lleven a cabo acciones conjuntas para que las y los trabajadores activos de JAPAMI, tengan acceso a un descuento especial en los trabajadores activos de JAPAMI, tengan acceso a un descuento especial en los servicios académicos y de guardería que proporciona el Instituto Crisol
JAPAMI/C-COLABORACIÓN-2024-08	Establecer las bases de colaboración para que JAPAMI y el CLUB, lleven a cabo acciones conjuntas para que los trabajadores activos de JAPAMI y sus familiares directos, tengan acceso a un descuento especial en los servicios que proporciona el CLUB denominado SPORT GYM.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN-2024-09	Establece las bases de colaboración para que JAPAMI y el CLUB, lleven a cabo acciones conjuntas para que los trabajadores activos de JAPAMI y sus familiares directos, tengan acceso a un descuento especial en los servicios que proporciona EL CLUB denominado LIFE AND FITNESS.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN-2024-11	Establecer las bases de colaboración para que JAPAMI y LA AGENCIA, lleven a cabo acciones conjuntas para que los trabajadores activos de JAPAMI y sus familiares directos, tengan acceso a un descuento especial en los servicios que proporciona LA AGENCIA denominada VIAJES EL PAY.

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONVENIOS MARCO SIMPLIFICADO SOBRE PAGO DE DERECHOS	
<p>Convenio Marco Simplificado sobre el Pago de Derechos de Incorporación No. JAPAMI/CS/HAB/001/2024-FRACCIÓN "E" MISIÓN III.</p>	<p>Predio identificado como Fracción "E" de Misión III, ubicado en el ejido Lo de Juárez de esta Ciudad, el desarrollador se obliga a cubrir a JAPAMI, el pago de derechos de incorporación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, aportación pluvial, revisión de proyectos, supervisión de obra y recepción de obra, para 12 viviendas de tipo interés social.</p>
<p>Convenio Marco General sobre pago de Derechos de Incorporación No. JAPAMI/CG/OCA/HAB/003/2024-FRACCIÓN "G" DE MISIÓN III</p>	<p>Fracción "G" de Misión III, ubicada en el Ejido Lo de Juárez de esta ciudad, El Desarrollador se obliga a cubrir a JAPAMI el pago de derechos de incorporación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento, Aportación Pluvial, Revisión de Proyectos, Supervisión de Obra y Recepción de Obra de 12 viviendas de tipo interés social.</p>
CONVENIOS MODIFICATORIOS	
<p>JAPAMI/AD/RP/OP/2023-110-01</p>	<p>Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/AD/RP/OP/2023-110.</p>
<p>JAPAMI/AD/RP/OP/2024-01-01</p>	<p>Ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/AD/RP/OP/2024-01</p>
<p>JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-84-02</p>	<p>Modificar la fuente de financiamiento, establecido en las declaraciones citadas por JAPAMI en el punto 1.9. en el Contrato No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-84.</p>
<p>JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-84-01</p>	<p>Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-84.</p>
<p>JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-84-02</p>	<p>Modificar la fuente de financiamiento, establecido en las declaraciones citadas por JAPAMI en el punto 1.9. en el Contrato No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-84.</p>
<p>JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-117-02</p>	<p>Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-117.</p>
<p>JAPAMI/LS/RP/OP/2023-75-01</p>	<p>Modificar la cláusula quinta, para reprogramar la reanudación de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/LS/RP/OP/2023-75.</p>
<p>JAPAMI/AD/RP/OP/2023-106-01</p>	<p>Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/AD/RP/OP/2023-106.</p>
<p>JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-118-02</p>	<p>Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos establecido en el contrato No. JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-118.</p>
<p>JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-117-03</p>	<p>Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/LS/AGTO/2023-117.</p>
<p>JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116-02</p>	<p>Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116.</p>
<p>JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116-03</p>	<p>Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116.</p>
<p>JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116-04</p>	<p>Ampliación al monto establecido en la cláusula segunda, en el contrato No. JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116.</p>
<p>JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-117-04</p>	<p>Modificar la cláusula segunda y quinta para ampliar el monto y plazo de ejecución de los trabajos, establecidos en el Contrato No. JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-117-02.</p>

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONVENIOS MODIFICATORIOS	
JAPAMI/LPN/RP/2023-107-02	Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/LPN/RP/2023-107.
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-84-03	Realizar el pago de volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo de acción denominada "Rehabilitación de red de drenaje en el Municipio de Irapuato, Gto. En la Col. 18 de agosto (Etapa 1 de 4).
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-119-01	Ampliar el plazo de ejecución de los trabajos establecido en el contrato No. JAPAMI/AD/RP/OP/2023-119.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-47-01	Modificar la cláusula quinta, para reprogramar la reanudación de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-47.
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-36-03	Modificar el catálogo de conceptos establecidos en el contrato primigenio de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número JAPAMI/LS/RP/OP/2023-36.
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-36-02	Modificar la cláusula quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. JAPAMI/LS/RP/OP/2023-36.

6 Factibilidades.

Respecto del periodo julio - septiembre se reportan los siguientes datos.

Tabla 7. Solicitud de factibilidades atendidas.

#	Razón social	Nombre comercial del desarrollo	Viviendas	Locales comerciales	Superficie comercial (m ²)	Agua	Descarga	Saneamiento
1	Gabriel Alfonso Padilla Cordero	Villa Asturiana	309	N/A	3,264.40	Sí	Sí	Sí
2	Coalición Ciudadana de Irapuato, A.C.	Real de Rancho Grande	231	N/A	2,512.91	Sí	Sí	No
3	Robsan RZ, S. de R.L. de C.V.	Calestra	132	N/A	295	Sí	Sí	No
4	Abencio Balboa Guerra/Basáltica del Centro; S.A. de C.V	El Cotero	119	N/A	83.7	Sí	Sí	Sí
5	Activivienda, S.A. de C.V.	Sin identificación del nombre comercial	15	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí
6	Martha Gómez Villa	Astoria	948	N/A	862.95	Sí	Sí	Sí

7 Comunicación Social.

En el periodo de septiembre a julio se realizaron las siguientes acciones.

Campaña "Si la tiras la tapas". Objetivo de crear consciencia sobre las consecuencias de tirar basura en las coladeras y en las calles.



Campaña "Reportes de lluvia". Se trabajó en informar por distintos medios de comunicación y redes sociales el estatus de atención de lluvias diarias y resolución de los encharcamientos que se presentaron durante periodos de precipitación atípicos.



JAPAMI Tips: Continuidad de información dirigida a la ciudadanía respecto de métodos de ahorro de agua efectivos.



Atención especial Colapso -calle Altamirano: Derivado del colapso registrado en la zona centro de la ciudad, se realizó cobertura especial y atención de crisis. Luego de un análisis, el tema resultó ser de controversia. Al momento del presente reporte, no se identifica afectación negativa directa hacia la percepción de JAPAMI.

Cultura del agua

- Se realizó visita guiada a la Planta de Tratamiento 1º de mayo a 12 alumnos del Instituto Educativo Japonés de Guanajuato AC.
- Se participó en el mes de julio en los cursos de verano de los siguientes lugares:
 - Parque Irekua
 - Fracc. Los Castillos.
 - Fracc. El Encanto.
 - PEI.

Participación total de 232 niñas y niños

- Se desarrollaron los talleres de reciclaje “Salvemos nuestro hogar” y “Plantemos vida” como apoyo al IMCAR en el evento de conmemoración a los 51 años de la inundación de Irapuato. 30 personas atendidas.

- El en mes de agosto se inició con la campaña “Mi mercadito, sí la cuida” donde se dieron pláticas a los locatarios de los siguientes mercados:
 - Mercado Miguel Hidalgo
 - Mercado Vicente Guerrero
 - Mercado Irapuato
 - Mercado Benito Juárez
 - Mercado Sostenes Rocha


Se brindó información acerca del uso de la red de drenaje y alcantarillado en las descargas de aguas residuales diversas a las de uso doméstico, controlar la contaminación de las aguas y prevenir encharcamientos. Teniendo un total de 120 asistentes.

- Se realizó la entrega del premio al primer, segundo y tercer lugar del concurso infantil “Cuenta Cuentos, Cuenta Gotas” evento que tomó lugar en las siguientes escuelas:
 - Escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz.
 - Escuela primaria Constituyentes de 1857.
 - Escuela secundaria Juan Duns Escoto.

Asistencia de 1116 alumnos.

- Se realizó platica de cultura del agua en colaboración con el área de agua potable, drenaje y alcantarillado a la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato teniendo como asistencia a 300 alumnos. Teniendo un total de **1842 personas atendidas.**

8 Anexos.



ANEXO A

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL A 30 SEPTIEMBRE DE 2024



	PRESUPUESTO 2024 AUTORIZADO		PRESUPUESTO 2024 IRA MODIF		PRESUPUESTO 2024 2DA MODIF		COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,104,415	37,059,215	36,764,215	31,370,205	25,911,901	25,911,901	25,911,901	25,911,503
1132	SUELDO DE CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	62,855,721	62,810,921	61,716,021	54,286,782	43,420,086	43,420,086	43,420,086	43,420,086
1321	PRIMA VACACIONAL	3,292,922	3,226,022	3,228,422	2,159,725	1,559,257	1,559,257	1,559,257	1,533,632
1322	PRIMA DOMINICAL	100,000	100,000	100,000	100,000	99,663	99,663	99,663	99,663
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,525,226	11,538,326	11,594,226	10,879,736	287,303	287,303	287,303	221,624
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	130,000	230,000	430,000	325,855	325,854	325,854	325,854	325,854
1332	DIAS FESTIVOS	130,000	330,000	465,000	231,815	231,815	231,815	231,815	231,815
1341	COMPENSACIONES	100,740	100,740	667,740	293,109	293,108	293,108	293,108	293,108
1413	APORTACIONES IMSS	16,917,278	17,335,678	17,045,978	14,669,488	10,770,525	10,770,525	10,770,525	10,770,525
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,463,876	4,339,276	5,077,876	3,673,851	3,670,298	3,670,298	3,670,298	3,670,298
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,546,541	5,296,541	5,277,241	5,049,056	5,040,481	5,040,481	5,040,481	5,040,481
1522	INDEMNIZACIONES	30,000	30,000	30,000					
1551	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	30,000	30,000	30,000					
1592	PREVISIÓN TOTAL MÚLTIPLE	100,000	900,000	900,000	606,364	480,949	480,949	480,949	480,949
1611	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	5,000	5,000					
1000	SERVICIOS PERSONALES	143,331,719	143,331,719	143,331,719	123,650,985	92,091,240	92,091,240	92,091,240	91,999,538
2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,116	38,116	21,816	21,816	21,816	21,816	21,816	21,816
2112	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	459,771	459,771	339,116	338,514	338,514	338,514	338,514	338,514
2142	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA	14,301	14,301	5,228	731	731	731	731	731
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	779,960	779,960	646,741	551,727	381,573	381,573	381,573	381,573
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	314,223	382,223	374,961	318,859	318,859	318,859	318,859	318,859
2211	PROD. ALIM. PPEPS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	152,000	152,000	172,000	112,632	112,632	112,632	112,632	112,632
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	73,000	97,000	96,334	70,862	68,709	68,709	68,709	68,709
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000	16,000	16,000	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262
2382	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA	0	810,000	1,509,998	809,998	809,998	809,998	809,998	809,998
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	617,179	567,179	546,685	544,826	544,826	544,826	544,826	544,826
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	998,087	998,087	965,001	801,164	801,164	801,164	801,164	801,164
2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,982	3,982	3,367	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,217	8,217	4,180	4,179	4,179	4,179	4,179	4,179
2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,973,404	4,048,392	3,111,102	2,645,150	2,636,683	2,636,683	2,636,683	2,636,683
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,712,626	6,662,626	6,209,058	5,291,667	5,273,571	5,273,571	5,273,571	5,273,571
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,367,068	12,354,933	12,354,174	12,352,948	8,087,303	8,087,303	8,087,303	8,087,303
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	326,477	326,477	91,433	86,604	74,694	74,694	74,694	74,694
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,914,673	1,854,673						
2521	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	10,000	10,000						
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,000	48,000	96,000	47,984	47,984	47,984	47,984	47,984
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	34,867	34,867						
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	676,350	676,350						
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,421,819	5,371,819	4,805,466	2,638,904	1,862,040	1,862,040	1,862,040	1,862,040
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,074,531	2,348,082	2,303,187	1,954,269	1,216,841	1,216,841	1,216,841	1,169,671
2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	9,294,641	9,230,176	8,057,140	5,204,265	5,204,265	5,204,265	5,204,265	5,019,837
2612	COMBUS. LUB Y ADIT.PMAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	4,723,795	4,383,997	4,383,997	2,393,963	2,393,963	2,393,963	2,393,963	2,315,690

	PRESUPUESTO 2024 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2024 1RA MODIF	PRESUPUESTO 2024 2DA MODIF	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	1,602,551	1,113,401	710,115	710,115	710,115
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,600	3,600	0	0	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,665,195	1,350,055	1,029,508	1,007,689	915,140
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,913	18,863	9,448	9,448	9,448
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	4,000	4,000	3,745	3,745	3,745
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	79,223	98,853	39,122	39,122	39,122
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1,427,973	1,427,973	1,232,289	1,147,791	1,147,791
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	671,729	671,729	298,106	298,106	298,106
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,209,076	59,180,017	42,431,316	36,025,165	35,506,055
3112	ENERGIA ELÉCTRICA	105,358,500	95,758,500	86,613,901	86,613,901	86,613,901
3121	CAS	13,200	13,200	10,689	10,689	10,689
3131	AGUA	46,017	96,017	111,017	111,017	111,017
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	325,840	325,840	240,068	240,068	240,068
3152	TELEFONIA CELULAR	564,116	1,010,116	210,008	210,008	210,008
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,650	13,650			
3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y	133,416	152,416	76,994	76,994	76,994
3181	SERVICIO POSTAL	67,760	67,760	3,117	3,117	3,117
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,507,672	1,547,672	1,011,909	992,769	992,769
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIENES	87,672	87,672	56,207	56,207	56,207
3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		70,000			
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	14,640,151	13,449,470	15,029,881	14,527,951	14,527,951
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,372,635	3,112,006	2,004,968	1,996,965	1,996,965
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	6,422,114	6,472,114	4,609,032	4,609,032	4,609,032
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA	716,000	716,000	430,696	384,296	287,436
3313	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	610,000	610,000	58,925	58,925	58,925
3331	SERVICIOS DE PROCESOS TÉCNICA Y EN TECN DE LA	6,343,145	7,395,540	9,293,555	2,304,262	2,304,262
3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	492,000	492,000	298,552	298,552	298,552
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	721,665	874,568	850,532	843,851	843,851
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION	2,200,986	2,200,986	1,517,731	1,415,539	1,403,098
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,834,617	9,834,617	7,375,962	7,375,962	7,375,962
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	17,723,348	18,294,022	8,970,053	7,279,170	7,279,170
3412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,842,000	1,842,000	1,504,824	1,504,824	1,504,824
3421	SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACIÓN CREDITICIA	3,000,000	3,495,990	2,229,984	2,229,984	2,229,984
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA	1,101,982	1,101,982	817,005	817,005	817,005
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,440,883	3,040,883	2,571,937	2,567,413	2,567,413
3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,310,000	2,460,000	2,712,362	2,682,202	2,682,202
3511	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	11,189,403	11,189,403	8,303,593	6,148,798	6,140,098
3521	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	15,000	15,000	10,672	10,672	10,672
3531	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	414,797	414,797	427,676	376,000	376,000
3541	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	1,100,000	1,100,000	1,218,492	920,301	920,301
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3,469,832	3,269,832	1,962,869	1,946,677	1,946,677
3571	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	15,510,830	15,518,014	11,792,360	10,719,617	10,707,855
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,595,000	1,334,919	1,272,420	1,242,935	1,242,935
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	135,000	135,000	77,987	77,987	77,987
3621	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	3,196,808	3,196,808	3,272,050	2,585,660	2,585,660
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y	100,000	100,000	50,552	50,552	50,552
3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO	100,000	100,000	60,662	60,662	60,662
3711	PASAJES AÉREOS INTERNAC PSERV PUB EN COMISION	79,100	79,100	28,013	28,013	28,013
3721	PASAJES TERR INTERNAC PSERV EN COMISION	140,200	140,200	8,593	4,893	4,893
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	453,852	453,852	64,757	58,057	58,057

	PRESUPUESTO 2024 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2024 IRA MODIF	PRESUPUESTO 2024, 2DA MODIF	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PUB EN	31,200	77,527	62,730	62,730	62,730
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	769,697	769,697	576,322	576,322	530,391
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	108,160	108,160			
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	85,000	85,000	44,109	44,109	44,109
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,818,348	29,818,348	22,828,191	22,828,191	22,826,273
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	2,849,511	2,849,511	3,659,941	3,659,941	2,910,306
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	28,000	28,000	27,961	27,961	27,961
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	31,565	31,565	5,477	5,477	5,477
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	45,000	45,000	2,550,482	2,550,482	2,550,482
3000	SERVICIOS GENERALES	253,155,671	245,281,659	200,544,542	193,201,264	192,269,492
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	102,000	102,000			
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	26,435	26,435	25,418	25,418	25,418
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000	1,000,000			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,128,435	1,128,435	25,418	25,418	25,418
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	233,000	303,000	112,014	112,014	112,014
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	3,290,572	3,698,572	3,354,081	3,276,953	3,276,953
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	47,500	838,896	809,840	809,840	809,840
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	946,655	946,655	816,993	446,292	356,981
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,500,000	11,000,000	10,490,256	10,490,256	10,490,256
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	500,000	500,000			
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	200,000	200,000	191,527	191,527	191,527
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,842,926	23,442,926	11,887,692	7,593,489	7,593,489
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	458,251	458,251	449,373	161,665	161,665
5663	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y	1,059,393	1,059,393	435,880	414,115	414,115
	ACCESORIOS ELÉCTRICOS					
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,207,217	2,207,217	2,275,258	1,952,778	1,952,778
5691	OTROS EQUIPOS	11,703,112	12,667,304	5,879,544	1,269,641	1,269,641
5811	TERRENOS	4,640,000	4,640,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000
5911	SOFTWARE	1,229,910	3,729,910	2,768,428	222,293	222,293
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,858,536	65,692,124	43,130,885	30,600,863	30,511,552
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	95,238,555	274,306,145	214,932,153	157,232,969	154,511,982
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,475,652	34,591,796	22,221,203	11,754,648	6,109,654
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	32,381,310	56,692,865	29,082,897	19,074,633	19,074,633
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN	13,904,483	40,704,537	32,217,125	18,352,697	18,352,697
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	150,000,000	406,295,342	298,453,378	206,414,948	198,048,966
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		289,987,505			
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES		289,987,505			
8531	OTROS CONVENIOS			3,737	3,737	3,737
8000	PARTICIPACIONES Y APOTACIONES	657,683,436	1,210,896,801	708,240,261	558,362,634	548,364,758
TOTAL						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'MS'.

Handwritten initials 'K' and 'T' in blue ink.



ANEXO B
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO.
ATENCIÓN A LOCALIDADES RURALES

INEGI 2020		Atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
166	San Vicente de Malvas	01/07/2024	Revisión planta de tratamiento	Se revisaron las instalaciones de la planta de tratamiento por parte del personal de JAPAMI rural y departamentos de plantas de tratamiento de la JAPAMI, dando indicaciones al comité de agua local, sobre las acciones a realizar para su rehabilitación y funcionamiento.
58	Adjuntas	01/07/2024	Revisión del sistema de cloración	Se dio apoyo técnico en la revisión del sistema de cloración y sus componentes, encontrando un funcionamiento adecuado
68	El Carrizal Grande	01/07/2024	Revisión del sistema de cloración	Se revisó el sistema de cloración y sus componentes, encontrando un funcionamiento adecuado, se tomo muestra de cloro residual libre en la red de agua potable dando como resultado 0.84 ppm
173	Tejamanil	02/07/2024	Revisión de planta de aguas residuales	Se revisó la obra de planta tratadora de aguas residuales, donde se observo que aun no está realizada la conexión del ultimo pozo al cárcamo.
143	San Ignacio de Rivera	02/07/2024	Reporte de desperdicio de agua potable en campo de futbol	Se llevó a cabo reunión con el delegado, informándole que no se debe regar el campo de futbol con agua potable, de lo contrario se instalaran medidores en los predios.
111	Paso Blanco	07/07/2024	Asistencias a la asamblea para el permiso de conexión de la Sra. Camarena.	Asamblea comunitaria para solicitar el permiso de la introducción de tubería y así poder ofrecer el servicio de agua potable.
143	San Ignacio de Rivera	09/07/2024	Revisión de PTAR	Supervisión de avance de obra de PTAR
95	Aldama	10/07/2024	Revisión de predio para PTAR	Revisión de predio para proyecto de PTAR, en donde se determinó que era necesario un predio aguas abajo del río para abarcar a toda la comunidad.
62	La Calera	15/07/2024	Revisión de calle Conín	Revisión de calle Conín para atender solicitud de calle en malas condiciones.
184	Guadalupe Villa Cárdenas	19/07/2024	Revisión de predio para PTAR	Se revisaron 3 predios en donde se determinó que 2 no tenían las características necesarias para el proyecto y construcción de tanque elevado y el tercer predio le faltaba superficie la cual el comité y delegación propondrán a la comunidad la compra de la superficie faltante o propondrán un predio con las características que se solicitan.
82	Cuchicuato	19/07/2024	Revisión del sistema de cloración	Se dio apoyo técnico en la revisión del sistema de cloración y sus componentes, encontrando un funcionamiento adecuado; realizando una muestra de cloro residual libre en la red de agua potable de la comunidad dando como resultado 0.0 ppm comentando el comité del agua, esta inyectando cloro al 3% y el que debe llevar es hipoclorito al 13%.
113	Peñuelas	19/07/2024	Revisión del sistema de cloración	Se revisó sistema de cloración y sus componentes encontrando el equipo desconectado y fuera de función por falta de hipoclorito de sodio, se reagendará visita una vez que la comunidad cuente con el hipoclorito de sodio

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

INEGI 2020		Atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
169	La Soledad	20/07/2024	Desazolve de línea general de agua residual	Se atendió la calle Av. Deportiva sondeando 760 m de línea general de agua residual y se limpiaron 2 pozos de visita y 3 bocas de tormenta
107	Noria de Camarena	22/07/2024	Levantamiento topográfico y toma de presiones	Se hizo levantamiento topográfico en calles 14 de febrero y Av. del Trabajo, así como se tomó muestra de presiones en puntos de conexión en mismas calles por proyecto de ampliación de red de agua potable
101	Ejido Malvas la Argolla	23/07/2024	Entrega de obra de drenaje sanitario primera etapa	Se realizó reunión con comité de agua local, delegación y JAPAMI rural para la entrega-recepción de la obra de drenaje sanitario en su primera etapa que se llevó a cabo en la comunidad, firmando el acta operativa correspondiente.
176	Tomelópez	24/07/2024	Desazolve en calle Santa Cecilia	Se sondearon 200 m de línea de drenaje, se inspeccionaron 5 pozos de visita y se limpiaron 3 de ellos, dejando la línea trabajando y sin brote de agua residual.
81	Cuarta Brigada	25/07/2024	Brote de agua residual en pozos de visita, provocando que se estanque el agua sobre la calle Emiliano Zapata	Se sondearon 280 m de línea general, se revisaron 12 pozos de visita y se limpiaron 6 de ellos, así como 4 bocas de tormenta, dejando la línea trabajando y sin encharcamiento de agua residual
203	Nueva Colonia El Copalillo	11/08/2024	Asamblea General para información de Proyecto de Obra y PTAR	Se llevó a cabo reunión con delegación, comité de agua local, ejidatarios y habitantes de la comunidad, para informar sobre el proyecto, para donación de predio y aceptación de obra.
184	Guadalupe Villa Cárdenas	16/08/2024	Donación de predio para tanque elevado	Reunión con Delegación, Comité de Agua, Comisionado Ejidal para revisar las opciones de terreno para proyecto de tanque elevado.
164	Santa Rosa Temascatio (Santa Rosa de la Cruz)	16/08/2024	Donación de tubería de reúso	Se realizó recorrido en los pozos de servidumbre donde piden apoyo con tubería de reúso para evitar su deslave.
162	Santa Barbara	16/08/2024	Revisión de parámetros técnicos	Se tomó presión de tren de válvulas, se revisó los litros por segundo con el flujómetro y se checkaron corrientes del arrancador y de la bomba.
177	Tomelopitos	19/08/2024	Brote de agua residual cuando llueve en calle Benito Juárez	Se revisaron 2 registros sanitarios y 7 pozos de visita determinando que la descarga este baja respecto a la línea de drenaje, así como no existe tapón en la calle Morelos.
62	La Calera	20/08/2024	Línea de drenaje tapado con salida de agua residual en pozo de visita	Sondeo de 80m de línea general y se limpiaron 3 pozos de visita en calle Fray Juan de San Miguel dejando la línea con nivel optimo y trabajando.
169	La Soledad	21/08/2024	Desazolve de línea general de Agua Residual	Se atendió la calle Priv. Flores Magón, se sondearon 200 metros de línea general de Agua Residual y limpiaron 6 pozos de visita, dejando niveles óptimos y la línea trabajando, terminando trabajo a las 13:00 hrs.
N/A	Purísima del Jardín	25/08/2024	Sondeo de línea general y limpieza caimán	Se sondearon 70 m de línea general y se limpiaron 2 caimanes en calle Geranio y Cirasol dejándolos trabajando y limpios.
111	Paso Blanco	27/08/2024	Desazolve en calle Miguel Hidalgo	Se sondearon 60 m de línea general dejando la línea trabajando y sin salida de agua residual.

INEGI 2020		Atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
N/A	Colonia Malvas (Revolución)	28/08/2024	Revisión de contaminación	Se revisaron domicilios en la calle Benito Juárez realizando una muestra de cloro residual en la red de agua potable dando como resultado 0.0 ppm por lo que se revisó el sistema de cloro y sus componentes dando un mantenimiento correctivo y dejándolo trabajando y clorando, se programa nueva visita para el día 29/08/2024
N/A	Colonia Malvas (Revolución)	29/08/2024	Revisión de contaminación	Se atendió la calle Benito Juárez, en donde se tomaron muestras de Cloro Residual libre dando como resultado 0.47 ppm en la casa #51, casa #72 resultado 0.48 ppm, casa #48 resultado 0.40 ppm, casa #512 resultado 0.62 ppm
N/A	Purísima del Jardín	29/08/2024	Revisión de contaminación	Se revisaron domicilios en la calle Amapola observando que el agua se encuentra turbia y olor a drenaje por lo que se programa con personal de operación una revisión en el tubo para insertar la cámara de inspección
N/A	Purísima del Jardín	30/08/2024	Contaminación de agua	Se realizó un sondeo en la calle Amapola #401 para ingresar en el tubo de la red de agua potable la cámara de inspección, sin apreciar la contaminación, el agua se ve cristalina clara y sin dar por lo que se tomó una muestra de cloro residual libre dando como resultado 0.74 ppm
N/A	Purísima del Jardín	31/08/2024	Contaminación de agua	Se realizó la revisión de la calle Amapola realizando muestras del agua potable sin aparecer contaminación el agua se parecía cristalina clara y sin olor
835	Loma Bonita	02/09/2024	Socialización de recibos de pago	Socialización de recibos de pago y despedida de operación del pocero.
69	El Carrizalito	02/09/2024	Revisión de drenaje y calles para acción programa de obra 2024	Se revisó drenaje y calles para acción de obra 2024 de la comunidad.
126	Rivera de Guadalupe	03/09/2024	Sistema de Cloración	Se dio apoyo técnico en la revisión del sistema de cloro y sus componentes, observando que la válvula de inyección no funciona por lo que se realizó mantenimiento correctivo, dejando en funcionamiento el sistema de cloración.
118	Purísima de Covarrubias	03/09/2024	Revisión de observaciones en oficio de jurisdicción sanitaria en materia de agua potable	Reunión con el comité de agua potable de la comunidad para revisar las observaciones del oficio 500517823. Encontrando que ya tienen solventadas algunas observaciones solo les falta el programa de limpieza del tanque de almacenamiento.
96	Laguna Larga	03/09/2024	Revisión de observaciones en oficio de jurisdicción sanitaria en materia de agua potable	Reunión con la presidente del comité de agua potable de la comunidad argumentando que por el momento no puede atendernos y programarnos nueva visita
176	Tomelópez	03/09/2024	Desazolve	Se sondearon 360 m de línea general en Av. Guanajuato, así como se limpió 1 pozo de visita de dejando la línea de nivel trabajando y los registros sanitarios sin agua residual.
N/A	Purísima del Jardín	04/09/2024	Revisión de contaminación de agua calle Amapola de la comunidad Purísima del Jardín	Se revisó los domicilios afectados por la contaminación, apreciando la calidad de agua es clara, cristalina y sin olor por lo que se realizó una muestra de cloro residual libre en la red de agua potable. Dando como resultado 0.77ppm.

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'JACO' and several other illegible marks.

INEGI 2020		Atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
N/A	Purísima del Jardín	04/09/2024	Desazolve de línea general	Se atendió la calle Jazmín para tratar de bajar la calle Geranio, se dejó trabajando la línea y se regresará con el segundo turno de operadores del camión hidroneumático.
N/A	Purísima del Jardín	04/09/2024	Desazolve de línea general	Se atendió la calle Jazmín con la calle Geranio, con el segundo turno de operadores del camión hidroneumático, se dejó trabajando la línea general.
138	San Cristóbal	04/09/2024	Socialización obra de distribución de agua	Socialización de la línea de distribución de agua, para programa de obra 2024
143	San Ignacio de Rivera	05/09/2024	Reunión con comisariado para trámite de donación de predio	Se realizó reunión con comisariado ejidal para revisar lo del reconocimiento de la Asamblea, a lo que argumenta que en la semana del 09 al 13 de septiembre informan los avances.
93	Guadalupe de Rivera	05/09/2024	Revisión y desazolve de drenaje en calle Av. Revolución	Se sondearon 200m de línea general y se limpiaron 1 pozo de visita y 2 registros sanitarios dejando la línea con nivel óptimo y trabajando.
138	San Cristóbal	05/09/2024	Gestión de permisos para pasos de servidumbre	Firmas de permisos de pasos de servidumbre en predios con afectación por proyecto de línea de distribución.
138	San Cristóbal	06/09/2024	Reunión para atender reporte de Protección Civil por inundación	Se atendió el reporte de Protección Civil por inundación debido a modificaciones de la línea de drenaje pluvial.
148	San José de Bernalejo (El Guayabo)	06/09/2024	Apoyo técnico escuela Emiliano Zapata	Se atendió al reporte hecho por la directora de la escuela Emiliano Zapata, argumentando la misma directora que el Comité de padres de familia ya repararon la fuga de agua potable que se encontraba al exterior de la institución.
96	Laguna larga	10/09/2024	Reunión con comité de agua potable, para solventaciones de observaciones hechas por jurisdicción sanitaria	Se realizó reunión con la presidenta del comité de agua potable de la comunidad, argumentando que para el día 27 de septiembre del 2024 solventaba la mayoría de las observaciones de jurisdicción sanitaria.
139	San Diego del Rosal (El zorrillo)	10/09/2024	Gestión de donación de predio	Se buscó al comisariado para señalar predio para solicitud de tanque elevado.
60	Buenos Aires	10/09/2024	Recorrido de calles para proyecto propuestos para programa de obra 2024 del ramo 33	Se realizó el recorrido de las calles para generar proyecto ejecutivo.
61	La Caja	10/09/2024	Revisar conexión del centro de salud	Se revisó la conexión del centro de salud, en atención a solicitud mediante oficio.
81	Cuarta Brigada	11/09/2024	Apoyo técnico de revisión de drenaje en las calles Deportiva, Benito Juárez y Álamo	Se revisaron las calles mencionadas estableciendo que la calle la deportiva cuenta con una obstrucción en la línea general siendo necesario el camión hidroneumático para liberarlo.
116	Providencia de Pérez (El guantón)	13/09/2024	Desazolve en Calle Camino Real	Se sondearon 170 m de línea de drenaje y se limpiaron un pozo de visita y dos registros sanitarios dejando la línea trabajando y los registros sanitarios limpios.
90	Gabino Vázquez (Las Víboras)	17/09/2024	Revisión de predios factibles para donación y proyección de PTAR	Se revisaron los predios señalados.
759	San José de Marañón	18/09/2024	Revisión del cárcamo de la comunidad	Se revisó el cárcamo de la comunidad observando los niveles altos y azolve. Se propuso limpiar.
N/A	Camino real de lo de Juárez	18/09/2024	Revisión del sistema de cloración	Se acudió a la comunidad para la revisión pero no fue posible que nos atendieran, por lo cual se reagenda la visita.

INEGI 2020		Atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
138	San Cristóbal	18/09/2024	Levantamiento topográfico para generación de proyecto ejecutivo.	Se realizó el acompañamiento con personal de topografía para realizar el levantamiento topográfico de la línea de agua potable en colonia Rodríguez.
169	La soledad	18/09/2024	Revisión de inundación en bachillerato SABES y bombeo de agua a canal	Se revisó afectaciones y el personal de operación y mantenimiento de JAPAMI estuvo realizando el bombeo del agua estancada derivado a las fuertes lluvias.
107	Noria de Camarena	19/09/2024	Recorrido para ubicación de calles sin red de agua potable	Se realizó recorrido en las calles Priv. Av. del Trabajo, Primavera, y el Cubo, para proyecto de ampliación de red de agua potable.
62	La Calera	19/09/2024	Revisión de la línea de drenaje de la calle Felipe Ángeles	Se realizó la inspección de pozos de visita en la calle Felipe Ángeles para determinar cuales tienen conexión de tubería hacia las calles perpendiculares (sin drenaje)
N/A	Camino real de lo de Juárez	19/09/2024	Apoyo en el mantenimiento correctivo del sistema de cloración	Se realizó un apoyo técnico en mantenimiento correctivo dejando el sistema funcionando adecuadamente.
161	San Roque	20/09/2024	Revisión y dictamen de la línea de drenaje en la comunidad San Roque	Se detectaron 2 taponamientos en calles Justo Sierra y Emiliano Zapata el cual esta provocando salida de agua residual hacia la calle.
169	La soledad	20/09/2024	Apoyo en bombeo de desagüe de encharcamiento del campo de futbol	Se bombeo el agua estancando del campo de futbol a canal de la comunidad de La Soledad.
116	Providencia de Pérez (El guantón)	20/09/2024	Socialización de apoyo de la Gerencia Rural	Se realizó reunión con el comité local y delegación para que nos permitan asesorarlos y apoyarlos en materia de servicios básicos, ya que a la fecha no nos habían recibido.
N/A	Arandas	20/09/2024	Reunión con ejido, comité de agua y delegación	Se abordó la solicitud de pago de afectaciones en brechas del ejido y la solicitud de tanque elevado
118	Purísima de Covarrubias	24/09/2024	Socialización en proyecto de drenaje	Se socializó con el supervisor de obra y contratista sobre el proyecto de drenaje.
138	San Cristóbal	25/09/2024	Desazolve de línea general de agua residual en la comunidad	Se sondearon 500 m de línea general de agua residual, y se limpiaron 5 pozos de visita.
N/A	Purísima del jardín	26/09/2024	Desazolve Calle Geranio	Se realizó un sondeo y la limpieza de la línea general en la calle Geranio liberando 2 taponamientos, dejando la línea trabajando.
N/A	Ex Hacienda Márquez	26/09/2024	Revisión del sistema de cloración	Se realizó apoyo técnico en la instalación de válvula de intención (Tobera), el cual se dejo trabajando el equipo de cloración.
167	Serrano	27/09/2024	Revisión del sistema de cloración	Se dio apoyo técnico en el mantenimiento correctivo de la válvula de inyección, para lo que se dejo el equipo trabajando y clorando.
121	Rancho Nuevo de Dolores (El cuero)	27/09/2024	Apoyo técnico revisión de drenaje sanitario.	Apoyo técnico para pago de desazolve en la calle Abasolo en la comunidad.
184	Guadalupe Villa Cárdenas	28/09/2024	Revisión de sistema de cloración y dictamen de fuente de abastecimiento	Se realizó revisión completa de fuente de abastecimiento como: sistema de cloración, sistemas eléctricos, niveles estáticos y dinámico, presión.
82	Cuchicuato	29/09/2024	Socialización de incorporación al Organismo Operador JAPAMI	Se socializó con la comunidad la incorporación al Organismo Operador.



**ANEXO C
 JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 PROGRAMA OBRA - 2a Modificación
 Obra en ejecución**

Programa	Objetivo Especifico	Localidad	Nombre de la obra/Acción	Importe contratado	Recurso propio contratado	Municipal (FAISM-R33)	FAIS Estatal-PSBGTO (R33)	ESTATAL CEAG	ESTATAL SEDESU	PROAGUA	PRODDER		
POA-2023	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	Cabecera Municipal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	14,614,694					14,614,694				
			SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (2023)	4,980,052	4,980,052								
			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA TIER ETAPA	9,441,403		9,441,403		9,441,403					
			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS	2,998,922		2,998,922							
			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II (ETAPA 2 DE 2).	3,662,383		3,662,383					3,662,383		
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE: COL. EL GUAYABO Y EL COECILLO.	7,828,163		7,828,163					7,828,163		
			REHABILITACION DE CARCAMO NO. 30 EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA PLAN VIVIPA (INDEPENDENCIA)	7,999,773		7,999,773							
Total POA-2023				51,525,389	15,978,746	9,441,403			26,105,239				
POA-2024	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	Cabecera Municipal	ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO. (2024)	2,293,503									
			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE VILLAS DE IRAPUATO	23,717,932									
			INSTRUMENTACIÓN DE TELEMETRIA EN POZOS (2024)	4,736,657		4,736,657							
			REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE	3,082,627		3,082,627							
			REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 1) (INCLUYE AFORO) (2024)	4,379,000		4,379,000							
			REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (INCLUYE AFORO) (2024)	4,461,068		4,461,068							
			REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA LAS ROSAS (ETAPA 3 DE 3)	3,962,120		3,962,120							
Total POA-2024				39,622,837	1,981,060			396,212		1,584,848			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa	Objetivo Especifico	Localidad	Nombre de la obra/acción	Importe contratado	Recurso propio contratado	Municipal (FAMSM-R33)	FMS Estatal (RS3)	ESTATAL CEAG	Estatal SEDESHU	PROAGUA	PRODDER	
POA 2024	1 Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	Rural	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MACON NORTE (ETAPA 2 DE 3)	2,998,640	1,499,320	2,359,846	2,359,846	299,864	1,199,456			
			REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LOS PRINCIPES	7,994,878	3,997,439	2,359,846	2,359,846	799,488	3,197,951			
			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO., EN LA LOCALIDAD PUEBLINA DE COVARRUBIAS	4,719,691		2,359,846	2,359,846					
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO. EN LA LOCALIDAD SANGNACIO DE RIVERA (CDO DE AGUA) (2A ETAPA)	13,045,563		6,522,781	6,522,781					
3 Mejorar el servicio a los usuarios de agua potable y saneamiento	Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	TRABAJOS DE ADECUACION PARA OFICINA DE RECAUDACION Y ATENCION A USUARIOS EN ZONA PONIENTE	548,036	548,036							
			CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 5 DE 5)	3,673,972						3,673,972		
			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD SOLIDARIDAD (ETAPA 2 DE 5)	9,546,510						9,546,510		
			REHABILITACION DE CARGAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 2 DE 4)	2,993,792	2,993,792							
4 Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	REPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS 2024	2,381,314	2,381,314							
			SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARGAMO 52 (COL. BERNARDO COBOS) (INCLUYE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA)	1,680,415	1,680,415							
Total POA 2024				98,638,502	57,752,161	10,094,020	10,094,020	1,495,564	5,982,255	13,220,481		
Total general				150,163,891	73,730,907	19,535,423	10,094,020	1,495,564	26,105,239	5,982,255	13,220,481	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several initials and smaller signatures throughout the page.

Programa #	Objetivo Especifico	Localidad	Nombre de la obra/Acción	Importe programado	Recursos propios (FAISM-R33)	Municipal (FAISM-R33)	Estatal (FAIS-R33)	Estatal (SEDESHU)	PRODDER	
POA 2024	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	Cabecera Municipal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	417,873				417,873		
			DESMANTELAMIENTO DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 19 (FRACC. VALLE DEL SOL)	116,000	116,000					
			OBRAS DE SECTORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO (SECTORES 49/50, 47, 46, 23, 61, 39, 10, 16, 42, 59, 37, 62, 52, 57, 08, 63). INCLUYE: MONITOREO DE PRESIONES EN RED (no incluye sensores de presión ni dataloggers), MONITOREO DE CONSUMOS EN RED (si incluye macromedidores, no incluye dataloggers) Y DELIMITACIÓN FÍSICA DE SECTORES (incluye obra civil, piezas especiales y válvulas de seccionamiento).	7,260,757	7,260,757					
			AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA	4,397,418		2,198,709	2,198,709			
			AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA CARRIZAL GRANDE	1,123,591		561,796	561,796			
			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES.	528,000		528,000				
			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO.	2,412,033		2,412,033				
			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL.	5,604,112		5,604,112				
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD NORIA DE CAMARENA	1,317,888		1,317,888				
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA 3.	550,000		550,000				
			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA TER ETAPA	1,190,478		1,190,478				
			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PARA AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CUARTA BRIGADA	2,200,000		2,200,000				
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMELINA, JACARANDAS Y PRIVADA SIEMPRE EN DOMINGO, DE LA LOCALIDAD PURÍSIMA DEL JARDÍN.	1,012,000		1,012,000				

Programa #	Objetivo Especifico	Localidad	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Recursos propios	Municipal (FAISM-R33)	Estatal (FAIS-R33)	Estatal (SEDESHU)	PRODDER		
POA 2024	1 Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	Rural	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO., EN LAS LOCALIDADES DE: COL. EL CUAYABO Y EL COECILLO	312,115				312,115			
			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PRIVADA LAS ROSAS, DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE	957,000		957,000					
			CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES.	4,000,000		4,000,000					
			CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLA DE CARDENAS.	4,000,000		4,000,000					
			GESTION DE INCORPORACION DE VOLUMENES ADICIONALES DEL ACUIFERO SILOO - ROMITA	3,016,000	3,016,000						
			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO., EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y LOCALIDAD LA ZAHURDA (PDA ETAPA)	3,259,279		1,629,640	1,629,640				
			REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION EN LA ZONA RURAL	5,800,000		5,800,000					
			Total <<Atender las demandas de agua de todos los habitantes.>>	49,474,544	11,583,234	32,771,177	4,390,144	729,988			
			3 Mejorar el servicio a los usuarios de agua potable y saneamiento	Cabecera Municipal	SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (ERA ETAPA)	7,986,426	7,986,426				
					SUMINISTRO E INSTALACION DE 11,749 MICROMEDIDORES TIPO CHORRO MULTIPLE CLASE C PARA SUSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO (2024)	15,998,895					15,998,895
Total <<Mejorar el servicio a los usuarios de agua potable y saneamiento>>	23,985,321	7,986,426						15,998,895			
4 Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	Cabecera Municipal	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA, HIDRAULICA SANITARIA Y PLUVIAL COL. 18 DE AGOSTO			630,060	630,060					
		ACCIONES DE INTERCONEXION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA AL CARCAMO NO. 30			1,182,121	1,182,121					
		COLECTOR VICTORINO DE LAS FUENTES			6,704,137	6,704,137					
		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO., EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II (ETAPA 2 DE 2)			287,508				287,508		
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, CTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4)			3,422,222	3,422,222					
		Total <<Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio>>			12,226,047	11,938,539	32,771,177	4,390,144	287,508		
		Total POA 2024			85,685,912	31,508,199	32,771,177	4,390,144	1,017,496	15,998,895	
		Total general	85,685,912	31,508,199	32,771,177	4,390,144	1,017,496	15,998,895			





